

ETAPA 1 (PLANEACIÓN)



Etapa 1 (Planeación)

25. Acta de constitución del proyecto

	Plantilla No. 5 ET.1 Acta de constitución del proyecto Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E5 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de marzo del 2026
--	---

Enunciado del Trabajo del Proyecto

El proyecto es una plataforma de automatización impulsada por Inteligencia Artificial que transforma datos técnicos en reportes ejecutivos. Este se desea realizar en un año con el fin de detectar una problemática crítica en las empresas de TI en de la CDMX por la excesiva carga de trabajo manual y la falta de estandarización en la documentación de pruebas de software, esto genera retrasos en las entregas y posibles errores humanos. Es fundamental para la dirección por que representa una oportunidad estratégica de ser líderes en el sector tecnológico con un presupuesto de \$13,236,817 pesos mexicanos.

Caso del Negocio

El proyecto es rentable debido a que el 73.33% de los clientes potenciales encuestados muestran disposición de compra. En la proyección de ventas nos indica que anualmente tenemos una venta de más de 22 millones de pesos el primer año, lo que representa un margen de utilidad significativo frente al costo de desarrollo. Estratégicamente, posiciona a la organización como líder en el uso de IA aplicada a la documentación de QA en el mercado local.

Acuerdos

- 1 perfil del proyecto
- 1 título del proyecto
- 1 objetivo general
- 1 sector económico
- 1 giro empresarial
- 1 reporte de contribución al PIB
- 1 perfil del cliente
- 1 análisis de mercado TI



- 1 estudio de factibilidad
- 1 tabla de proyecciones financieras
- 1 tabla del análisis comparativo de la competencia
- 1 tabla del plan operativo
- 1 tabla del plan general de trabajo
- 3 diagramas de entrada, proceso y salida
- 3 listas de los recursos de entrada, proceso y salida
- 4 tablas de los recursos enlistados de entrada, proceso y salida
- 1 diagrama CPM
- 1 acta de constitución firmada
- 1 matriz de interesados
- 1 documento de alcance del software
- 1 diagrama EDT/WBS
- 1 plan de dirección integral
- 1 set de plantillas para usuarios
- 1 software único de pruebas (Testify)
- 1 módulo de IA para conclusiones
- 5 reportes de avance metodológico
- 1 proyecto de inversión técnica
- 1 prototipo funcional validado
- 1 plano operativo técnico
- 1 servidor PostgreSQL configurado
- 1 interfaz de usuario programada
- 3 módulos de seguridad configurados
- 1 diseño estructural completo
- 1 manual de estándares de proceso
- 1 reporte de integridad de datos
- 1 set de módulos desarrollados
- 1 reporte de validación de IA
- 5 protocolos de mantenimiento
- 1 documento de errores (QA)
- 15 reportes de pruebas unitarias
- 11 reportes de actualización
- 2 convenios de asociación
- 1 presupuesto de innovación
- 1 reporte de retorno de inversión
- 1 plan de adquisición de activos
- 1 tarifario oficial de Testify
- 4 reportes presupuestales
- 1 bitácora de administración
- 11 comprobantes de dispersión
- 11 balances generales



- 5 contratos laborales firmados
- 1 programa de capacitación integral
- 1 sistema de evaluación
- 5 perfiles de puesto validados
- 3 módulos formativos diseñados
- 1 manual de indicadores (KPIs)
- 15 reportes de entrevista
- 5 bitácoras de inducción
- 11 reportes de evaluación mensual
- 6 contratos de licencia firmados
- 1 reporte de posicionamiento
- 1 plan de post venta detallado
- 1 cartera de 20 prospectos
- 1 presentación ejecutiva (Pitch Deck)
- 1 manual de niveles de servicio
- 6 expedientes de contrato cerrados
- 10 bitácoras de demostración
- 6 reportes de satisfacción
- 1 tabla de checklist de verificación
- 1 bitácora de control de cambios
- 1 reporte de seguimiento de hitos
- 1 matriz de resultados finales
- 1 reporte de costos reales vs planeados
- 1 análisis de valor ganado
- 1 acta de cierre del proyecto firmada

Objetivos del Producto

- Automatización de reportes en formatos Word y ODF a partir de archivos CSV.
- Integración de un asistente de contenido basado en IA para resúmenes narrativos.
- Interfaz de usuario intuitiva con dashboards de trazabilidad.
- Compatibilidad con estándares de seguridad AES-256 y PostgreSQL.
- Disponibilidad de la plataforma del 99.5%

Objetivos del Proyecto

- Finalizar el desarrollo y pruebas en un periodo de 12 meses.
- Entregar el sistema funcional a las empresas.
- Entregar documentación técnica y manuales de usuario.



- Entregar certificados de cumplimiento de seguridad y accesibilidad.
- Mantener el costo de desarrollo dentro del presupuesto de 13.2 millones de pesos.
- Lograr la constitución legal y operativa de la empresa encargada del software.

Ámbito de aplicación

Empresas de TI ubicadas en la CDMX.

Actores clave (MERCADO META)

Cliente	<i>Empresas de servicios de software y departamentos de QA en la alcaldía Cuauhtémoc</i>
Patrocinador	<i>(SIGUIENTE CLASE)</i>
Gerente de proyecto	<i>Alexis Daniel Romero Razo</i>
Miembros del equipo de proyecto	<i>Lorena Sarahí Zepeda Carmona Eduardo Carbajal Mendoza Angela Cassandra Martínez Medina Estephany Muñoz Hernández</i>

Hitos del Proyecto

- Tema
- Título
- Objetivo
- Sector
- Giro
- PIB
- Cliente
- Mercado
- Aceptación del mercado
- Proyección de ventas
- Benchmarking
- Plan operativo
- Plan general de trabajo
- Plan de comercialización
- Cronograma de Actividades
- Red CPM
- Acta de constitución del proyecto
- Gestión de interesados
- Gestión del alcance
- EDT
- Gestión de dirección del proyecto



- Plantillas de requisitos
- Diseñar y desarrollar un software único
- Gestionar una innovación de IA
- Gestionar una innovación técnica de IA
- Gestionar el proyecto integral
- Realizar el proyecto de inversión técnica
- Desarrollar el prototipo funcional
- Realizar el plan operativo técnico
- Instalar la infraestructura de red
- Programar la interfaz de usuario
- Configurar los módulos de seguridad
- Diseñar la estructura funcional y técnica del software
- Gestionar la estandarización de procesos de reportes
- Supervisar la integridad de la base de datos y flujo
- Desarrollar los módulos de software
- Validar los algoritmos de IA para el mapeo de datos
- Estructurar los protocolos de mantenimiento y actualización
- Documentar las pruebas de errores y rendimiento
- Ejecutar las pruebas unitarias de los módulos
- Realizar las actualizaciones de seguridad en la BD
- Obtener afiliaciones con socios capitalistas
- Gestionar el presupuesto de innovación
- Realizar la proyección de recuperación financiera
- Determinar el capital para activos y equipo
- Definir el tarifario de licencias anuales
- Obtener el presupuesto trimestral de nómina
- Administrar el fondo de infraestructura física
- Ejecutar el pago mensual de salarios
- Realizar el balance de caja mensual
- Contratar personal especializado
- Capacitar al personal en metodologías y BD
- Establecer el sistema de evaluación del desempeño
- Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas
- Diseñar los talleres formativos de la arquitectura
- Estructurar los KPIs de productividad del equipo
- Realizar las entrevistas y pruebas técnicas
- Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal
- Aplicar las encuestas de desempeño mensuales
- Vender el licenciamiento anual a las empresas de TI
- Posicionar a Testify en el mercado de la CDMX
- Diseñar el plan de post venta y mantenimiento
- Realizar la prospección de clientes



- Desarrollar el pitch deck comercial de Testify
- Definir los niveles de soporte y acuerdos
- Cerrar los contratos legales con los clientes
- Ejecutar las demos técnicas para jefes de área gestionar encuestas de satisfacción y eficiencia
- Cheecklist de verificación
- Control de cambios
- Control de seguimiento
- Plantilla de resultados
- Plantilla de costos
- Plantilla de valor ganado
- Plantilla de acta de cierre

Exclusiones

- No incluye la provisión de hardware físico para los clientes
- No incluye el pago de servicios en la nube por parte de los clientes finales
- No incluye cambios en el sistema

Presupuesto del Proyecto

\$14,462,590,xn

Limitaciones, supuestos, riesgos y dependencias


Limitaciones	• <i>Tiempo de desarrollo estrictamente vinculado al calendario empresarial de 12 meses</i> • <i>El proyecto debe ejecutarse estrictamente con el presupuesto del proyecto que es de \$13,236,817 mxn</i>
Supuestos	• <i>Se contará con acceso ininterrumpido a las API de IA y servicios de AWS</i> • <i>Las empresas de TI encuestadas brindarán facilidades para el periodo de pruebas.</i> • <i>Se cuenta con la participación de los 5 integrantes de cada área</i>
Riesgos y dependencias	• <i>Inestabilidad en la integración de la IA con el formato de archivos CSV durante el desarrollo</i> • <i>Cambios imprevistos en las leyes de protección de datos personales en la CDMX que afecten el almacenamiento en la nube.</i> • <i>No se puede iniciar la comercialización sin el acta constitutiva de la empresa y los registros de marca.</i>

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto



*Angela Cassandra
Martínez Medina*



*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*



Eduardo Carbajal Mendoza



*Estephany Muñoz
Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No.5 ET.1 Acta de Constitución del Proyecto

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM5


Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 25 de marzo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto, definiendo el alcance general, objetivos, stakeholders principales, presupuesto estimado y la autorización formal del proyecto Testify.	La integrante Angela Martínez fue responsable de redactar el Acta de Constitución del Proyecto, integrando la información proporcionada por el equipo. Se acordó que el documento incluiría los objetivos, justificación, alcance, entregables principales, presupuesto estimado y roles del equipo. Asimismo, todos los integrantes revisaron el contenido y aprobaron el documento final.	3 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza

26. Registro de interesados

		Plantilla No.6 ET.1 Registro de interesados Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E6 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de marzo del 2026						
Interesado	Compromiso					Poder/ Influencia	Interés	Estrategia
	Desconoce	Se resiste	Neutral	Apoya	Líder			
Director tecnológico					X,D	A	A	Gestionar de cerca
Jefe Tecnológico				X,D		B	A	Informar
Gerente tecnológico				X,D		B	B	Monitorear
Directora Operativa				X	D	A	A	Gestionar de cerca
Jefe Operativo				X,D		B	A	Informar
Gerente Operativo				X,D		B	B	Monitorear
Director de Finanzas				X	D	A	A	Gestionar de cerca
Jefe de Finanzas				X,D		B	A	Monitorear
Gerente de Finanzas				X,D		B	B	Informar
Directora de Recursos humanos				X	D	A	A	Gestionar de cerca
Jefe de Recursos humanos				X,D		B	A	Informar
Gerente de Recursos humanos				X,D		B	B	Monitorear
Directora Comercial				X	D	A	A	Gestionar de cerca
Jefe Comercial				X,D		B	A	Informar
Gerente Comercial				X,D		B	B	Monitorear
Socios capitalistas			X	D		A	B	Mantener satisfecho
Clientes Meta	X			D		A	A	Gestionar de cerca

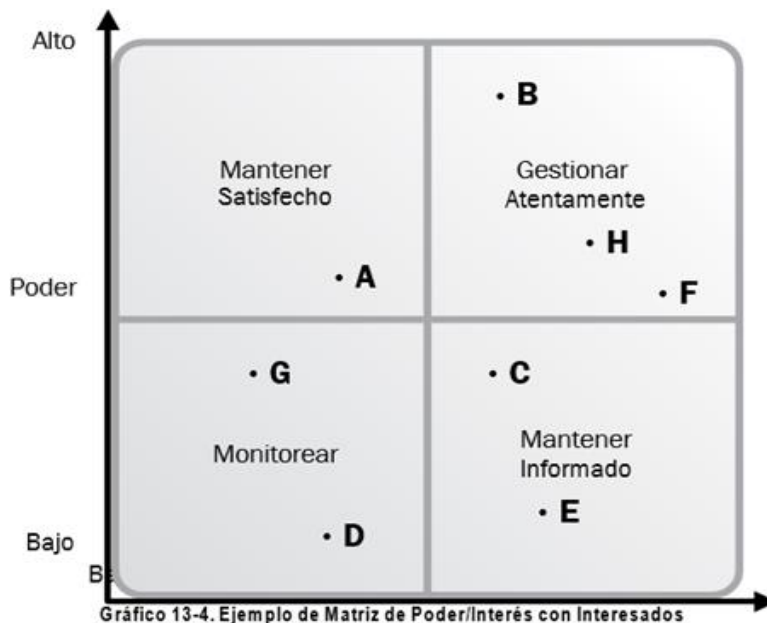


Gráfico 13-4. Ejemplo de Matriz de Poder/Interés con Interesados

Matriz de interesados compromiso / estrategia


Interesado	Compromiso					Poder / Influencia	Interés	Estrategia
	Desconoce	Se resiste	Neutral	Apoya	Líder			
Ejemplo de Interesado 1		X		D		A	B	Mantener satisfecho
X: Actual ; D: deseado ; A: Alto ; B: Bajo Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B)								

Firmas de aprobación

Patrocinador del proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina




Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Eduardo Carbajal Mendoza



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No.6 ET.1 Gestión de Interesados**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM6

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 10 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Identificación, análisis y clasificación de los interesados del proyecto, así como la elaboración de la matriz de interesados para determinar su nivel de influencia, interés y estrategias de gestión.	La integrante Estephany Muñoz fue responsable de desarrollar la plantilla de gestión de interesados, identificando a los actores clave del proyecto (clientes, equipo de desarrollo, inversionistas y usuarios finales). Se acordó clasificar a cada interesado según su nivel de poder. El equipo validó la información y aprobó la matriz.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

27. Gestión del Alcance del Proyecto

	Plantilla No. 7 ET.1 Gestión del Alcance del Proyecto Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E7 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026
---	--

1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en una plataforma web con inteligencia artificial para la generación automatizada de documentación de pruebas de software en empresas de TI. El mercado meta son las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez en la CDMX, con un presupuesto de \$14,462,590 MXN.

ATRIBUTO DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO
Nombre del proyecto	Testify
Acrónimo	TFY
Sector / giro	Tecnologías de la información / servicios
Mercado Meta	6 empresas de TI en la alcaldía Cuauhtémoc
Duración total	12 meses
Presupuesto	\$14,462,590 MXN
Stack Tecnológico	AWS, PostgreSQL, APIs de IA, Python y Frameworks web
Metodología	Scrum

2. Entregables principales del Proyecto

NO.	ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	ÁREA RESPONSABLE
1	Software Testify	Plataforma funcional en la nube	Tecnológico
2	Módulo de IA	Generación automática de reportes	Tecnológico
3	MVP	Prototipos funcional validado	Tecnológico
4	Base de Datos	Sistema PostgreSQL configurado	Tecnológico



5	Manual Técnico	Documentación del Sistema	Operativo
6	Reportes QA	Resultado de pruebas	Operativo
7	Plan Comercial	Estrategia de mercado	Comercial
8	Contratos de venta	Licencias vendidas	Comercial
9	Plan de soporte	Servicio post-venta	Comercial

3. Criterios de Aceptación

ENTREGABLE	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESPONSABLE
Software Testify	Funciona al 100% sin errores críticos	Cliente
Módulo de IA	Genera reportes en un 95% y que sean correctos	QA
MVP	Validado al 100% por usuarios piloto	Cliente
Base de Datos	Almacenamiento al 100%	DevOps
Manual Técnico	Completo al 100% y entendible ante los usuarios	Operativo
UI	Fácil navegación y uso al 95%.	Usuario Final

4. Inclusiones (Lo que si incluye en el proyecto)

ÁREA	TRABAJO INCLUIDO
Tecnológica	• Desarrollo de Software • Plan operativo • Plan general de trabajo • Plan de comercialización • Estudio y estratificación de mercado • El código fuente esta registrado como inautor
Operativa	• Diseño de Software • Documentación de pruebas y validación • Manual técnico
Fianciera	• Gestión de presupuesto • Afiliaciones con patrocinadores • Proyección financiera • Esquema de pagos • Balances generales
Recursos Humanos	• Contratación de personal • Capacitación al personal



	• Diseño de talleres formativos • Encuestas
Comercial	• Ventas del software • Marketing • Posicionamiento en el mercado

5. Exclusiones (lo que no incluye en el proyecto)

EXCLUSIÓN	JUSTIFICACIÓN
Desarrollo de hardware	No es objetivo del proyecto
Soporte limitado	Solo soporte definido por SLA
Implementación fuera de CDMX	Alcance geográfico limitado
Personalización Total del Software	Solo plantillas definidas
Solo en empresas de TI	Solo se venderá el software a empresas de TI por el objetivo del proyecto

6. Restricciones del Proyecto

NO.	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	IMPACTO
1	Presupuesto	Solo tenemos un límite de presupuesto de \$14,462,590 MXN	Económico	Alto
2	Tiempo	Lo tenemos que realizar en un periodo de 12 meses.	Temporal	Alto
3	Recursos humanos	Tenemos un equipo limitado que se compro y se contrato	Organizacional	Medio
4	Tecnología	Se tiene una dependencia solamente con AWS	Técnica	Alto
5	Mercado	Solo esta enfocado en la CDMX como mercado meta, objetivo y potencial	Comercial	Medio

7. Supuestos del Proyecto

SUPUESTO	DESCRIPCIÓN
Disponibilidad de equipo	Personal contratado a tiempo
Infraestructura	AWS disponible sin fallos
Clientes	Aceptación del 73% del mercado
Tecnología	APIs de IA funcionales
Financiamiento	Recursos disponibles y disponibilidad de financiamiento antes de la Etapa 2.

8. Supuestos del Proyecto

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Solicitud	El cliente solicita un cambio oportuno en el software
2	Evaluación	Se analiza el impacto que puede tener
3	Aprobación	El comité decide el cambio adecuado
4	Implementación	Se ejecuta el cambio a realizar
5	Validación	Se verifica el resultado por el cliente y funcionamiento correcto del mismo
6	Documentación	Se actualiza el proyecto

9. Validación y alcance

ACTIVIDAD DE VALIDACIÓN	DESCRIPCIÓN
Revisión de entregables	Validación con cliente
Pruebas funcionales	QA verifica el funcionamiento del software
Aprobación formal de los líderes	Firma de actas por parte del líder, el patrocinador y los directores para avalar que todo se entregó correctamente
Aprobación formal	Cliente acepta los entregables en tiempo y forma

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto



*Angela Cassandra
Martínez Medina*



*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*



Eduardo Carbajal Mendoza



*Estephany Muñoz
Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No. 7 ET.1 Gestión del Alcance del Proyecto**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM7

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 27 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración de la plantilla de gestión de alcance del proyecto, incluyendo definición de entregables, criterios de aceptación, inclusiones, exclusiones, restricciones, supuestos y control de cambios.	La integrante Cassandra Martínez fue responsable de desarrollar la plantilla de gestión del alcance, tomando como vbase la información del proyecto Testify y el plan general de trabajo. Se acordó estructurar el documento conforme a los lineamientos de gestión de proyectos, asegurando la correcta delimitación del alcance. El equipo validó que la información fuera coherente con los objetivos, entregables y restricciones previamente definidos.	5 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández


Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

28. EDT

	Plantilla No. 8 ET.1 EDT Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E8 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026
---	---

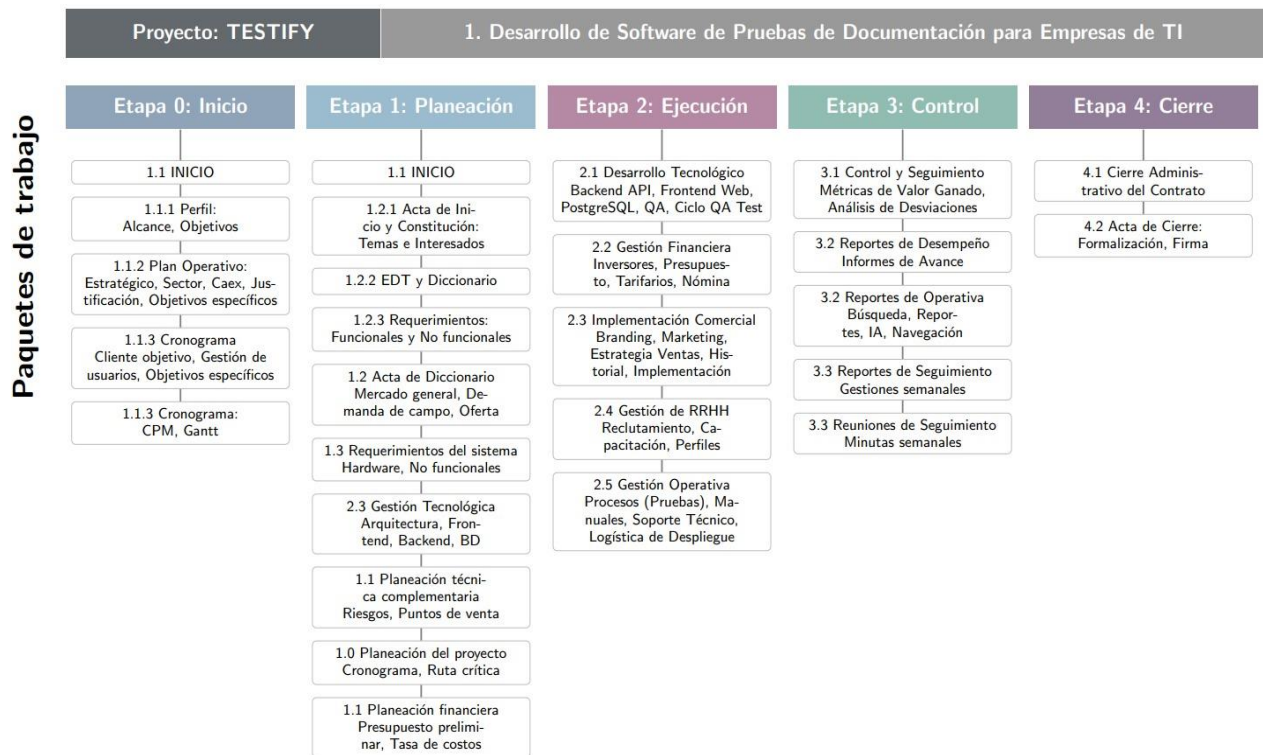

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal Mendoza

Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No. 8 ET.1 EDT**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM8

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 27 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición y descomposición jerárquica del alcance total del proyecto Testify para la creación de la EDT.	Eduardo Carbajal Mendoza realizó de manera individual la sesión técnica para desglosar el proyecto en componentes manejables. Se acordó aplicar la Regla del 100%, validando que los entregables técnicos (IA y base de datos) quedaran correctamente estructurados sin intervención de otros miembros del equipo.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



29. Plan Dirección de Proyectos

	Plantilla No. 9 ET.1 Plan Dirección de Proyectos Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E9 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 25 de abril del 2026
--	---

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha
1.0	Alexis Daniel Romero Razo	Equipo de proyecto		25 de abril de 2026

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Tetify	TFY

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO		ENFOQUE MULTIFASE	
Fase del Proyecto (1er Nivel EDT)	Entregable Principal de la Fase	Consideraciones para la Iniciación	Consideraciones para el Cierre
1. Gestión del Proyecto	✓ Acta de Constitución del Proyecto ✓ Enunciado del Alcance del Proyecto ✓ EDT/WBS ✓ Diccionario EDT ✓ Cronograma ✓ Presupuesto	El inicio depende de la aprobación del acta de constitución del proyecto y la definición de objetivos y alcance	Validación de todos los documentos de planeación del proyecto y autorización para continuar con la ejecución
2. Contratos	✓ Contratos con proveedores tecnológicos como AWS y herramientas de desarrollo ✓ Contrato de posibles clientes	El inicio depende de la identificación de proveedores y acuerdos comerciales necesarios para el	Firma y validación de contratos necesarios para asegurar recursos y continuidad del proyecto

		desarrollo del proyecto	
3. Curso de Gestión de Proyectos	✓ Informes de las sesiones ✓ Asignación de recursos humanos ✓ Asignación de roles y responsabilidades ✓ Estructura organizacional	El inicio depende de la disponibilidad del equipo de trabajo y la definición de roles dentro del proyecto	Confirmación de que todos los recursos están asignados correctamente y preparados para la ejecución
4. Curso de Gestión de Proyectos usando MS Project	✓ Cronograma detallado del proyecto elaborado en MS Project	El inicio depende de la definición de la EDT y actividades del proyecto	Validación del cronograma final y su alineación con los objetivos del proyecto
5. Informes	✓ Informe Final del proyecto y reportes de desempeño	El inicio depende de la recopilación de información durante la ejecución y control del proyecto	Entrega del informe final y aprobación del cliente, permitiendo el cierre formal del proyecto

PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PROCESO	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN	HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS	INPUTS	MODO DE TRABAJO (Mediante)	OUTPUTS
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	Una sola vez, al inicio del proyecto	Plantillas de gestión de proyectos	Idea del proyecto, necesidades del cliente	Reuniones entre el patrocinador y el equipo	Acta de constitución del proyecto
Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto	Una sola vez, al inicio del proyecto	Plantillas, análisis de requisitos	Acta de constitución, requerimientos	Reuniones del equipo de proyecto	Documento de alcance del proyecto
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	Al inicio del proyecto, actualizable	Plantillas, metodologías ágiles (Scrum)	Acta de constitución, alcance preliminar	Reuniones del equipo	Plan de dirección del proyecto
Planificación del Alcance	Inicio del proyecto	Plantillas, análisis de requisitos	Alcance preliminar, plan del proyecto	Trabajo colaborativo	Plan de gestión del alcance
Crear EDT (WBS)	Inicio del proyecto	Técnica de descomposición, diagramas	Alcance del proyecto	Reuniones del equipo	EDT y diccionario EDT
Desarrollo del Cronograma	Inicio del proyecto	MS Project, diagramas de red	EDT, actividades del proyecto	Planeación del equipo	Cronograma del proyecto
Preparación del Presupuesto de Costos	Inicio del proyecto	Estimación de costos, hojas de cálculo	Cronograma, recursos	Análisis financiero	Presupuesto del proyecto
Planificación de la Calidad	Inicio del proyecto	Estándares de calidad, métricas	Plan del proyecto	Definición de estándares	Plan de calidad



Planificación de los Recursos	Inicio del proyecto	Organigramas, descripciones de puesto	Plan del proyecto	Asignación de roles	Roles y responsabilidades
Planificación de las Comunicaciones	Durante todo el proyecto	Herramientas de comunicación, reuniones	Plan del proyecto	Reuniones periódicas	Plan de comunicaciones
Planificación de la Gestión de Riesgos	Durante el proyecto	Análisis de riesgos	Plan del proyecto	Identificación y evaluación de riesgos	Plan de gestión de riesgos
Planificar Compras y Adquisiciones	Durante el proyecto	Análisis make or buy, cotizaciones	Alcance, recursos	Negociación con proveedores	Plan de adquisiciones
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto	Durante todo el proyecto	Metodología Scrum	Plan del proyecto	Sprints y reuniones de seguimiento	Entregables del proyecto
Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto	Durante todo el proyecto	Valor ganado, indicadores (CPI, SPI)	Datos de desempeño	Monitoreo continuo	Reportes de avance
Informar el Rendimiento	Durante la ejecución	Reportes, reuniones	Datos del proyecto	Presentación de avances	Informes de rendimiento



ENFOQUE DE TRABAJO

El proyecto Testify se desarrollará bajo un enfoque estructurado con apoyo de metodologías ágiles (Cascada), permitiendo una ejecución organizada, iterativa y con mejora continua. El equipo de proyecto trabajará de manera colaborativa, asegurando el cumplimiento de los objetivos en términos de alcance, tiempo, costo y calidad.

1. Inicialmente en equipo se establecen objetivos, entregables, restricciones y supuestos para delimitar el proyecto.
2. Se elaboran los documentos clave como plan del proyecto, cronograma, presupuesto y riesgos.
3. Se definen responsabilidades del equipo para cada entregable.
4. El proyecto se desarrolla mediante sprints, generando entregables parciales.
5. Se realizan reuniones periódicas para evaluar avances y tomar acciones correctivas.
6. Se identifican riesgos y se controlan los cambios mediante un proceso formal.
7. Se revisa que cada entregable cumpla con los criterios establecidos.
8. Se entrega el producto final y se realiza el cierre formal.

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE

La gestión de líneas base del proyecto Testify permitirá mantener el control del desempeño en términos de alcance, tiempo y costo. Estas líneas base serán utilizadas como referencia para medir el avance real del proyecto y detectar desviaciones.

El informe de desempeño del proyecto será presentado de forma semanal en reuniones de seguimiento y contendrá la siguiente información:

- **Estado actual del proyecto**

1. Situación del alcance: comparación entre avance real y planificado.
2. Eficiencia del cronograma: SV (Variación del Cronograma) y SPI (Índice de Desempeño del Cronograma).
3. Eficiencia del costo: CV (Variación del Costo) y CPI (Índice de Desempeño del Costo).
4. Cumplimiento de objetivos de calidad.

- **Reporte de progreso**

1. Avance del periodo: porcentaje planificado vs real.
2. Valor ganado del periodo: valor planificado y real.
3. Costos del periodo: costo planificado vs real.



4. Indicadores del cronograma: SV y SPI del periodo.

5. Indicadores de costo: CV y CPI del periodo.

- **Pronósticos:**

1. Pronóstico de costos: EAC, ETC y VAC.

2. Pronóstico de tiempo: fecha planificada vs estimada de finalización.

- **Otros:**

1. Problemas y pendientes del proyecto.

2. Acciones correctivas.

3. Curva S del proyecto.

REVISIÓN DE GESTIÓN

TIPO DE REVISIÓN	CONTENIDO	EXTENSIÓN O ALCANCE	OPORTUNIDAD
Reuniones de coordinación del equipo	Revisión de acuerdos previos y avances	Participa todo el equipo, se asignan nuevas tareas	Semanal (lunes)
Reunión de seguimiento del proyecto	Informe de desempeño (alcance, tiempo, costo)	Evaluación del avance general del proyecto	Semanal
Reuniones extraordinarias	Análisis de problemas o riesgos específicos	Solo equipo involucrado en la situación	Cuando se requiera
Reuniones con el cliente	Presentación de avances y validación	Revisión de entregables y retroalimentación	Según solicitud
Comunicaciones informales	Intercambio de información rápida	Facilita coordinación diaria	En cualquier momento

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PLAN	ADJUNTO (SÍ/NO)
1. Plan de Gestión del Alcance	Sí
2. Plan de Gestión de Requisitos	Sí
3. Plan de Gestión del Cronograma	Sí
4. Plan de Gestión de Costos	Sí
5. Plan de Gestión de la Calidad	No



6. Plan de Gestión de los Recursos	Sí
7. Plan de Gestión de las Comunicaciones	No
8. Plan de Gestión de las Adquisiciones	No
9. Plan de Gestión de los Riesgos	No
10. Plan de Involucramiento de los Interesados	Sí
11. Plan de Gestión de Cambios	No
12. Plan de Gestión de la Configuración	No
13. Línea Base del Alcance	Sí
14. Línea Base del Cronograma	No
15. Línea Base de Costo	Sí
16. Línea Base para la Medición del Desempeño	No
17. Descripción del Ciclo de Vida del Proyecto	Sí
18. Enfoque de Desarrollo	Sí

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

Eduardo Carbajal Mendoza

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No. 9 ET.1 Plan Dirección de Proyectos**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM9

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 27 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto, incluyendo ciclo de vida, procesos de gestión, enfoque de trabajo, gestión de líneas base, revisiones de gestión y planes adjuntos.	El líder de proyecto Daniel Romero fue responsable de desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. Se acordó estructurar el documento conforme a los lineamientos de gestión de proyectos, integrando todos los componentes necesarios todas las etapas correctas. El equipo validó que el contenido estuviera alineado con los objetivos, alcance, cronograma y presupuesto establecidos.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



30. Gestión de Requerimientos

	Plantilla No. 10 ET.1 Gestión de Requerimientos Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E10 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026
---	---

1. Información general del proyecto

CAMPO	INFORMACIÓN
Nombre del proyecto:	Diseño y desarrollo de un software único de pruebas de documentación para las empresas de TI en la CDMX.
Responsable del proyecto:	Alexis Daniel Romero Razo.
Fecha de inicio:	3/Febrero/2026
Versión del documento:	V1.0.
Descripción general:	Sistema basado en Inteligencia Artificial diseñado para optimizar los flujos de trabajo de documentación de pruebas en empresas de tecnología. El software automatiza la creación de reportes ejecutivos y técnicos, transformando datos de pruebas (CSV) en documentos narrativos (Word/PDF), aumentando la eficiencia operativa y reduciendo errores manuales.



2. Tabla de Requerimientos

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PRIORIDAD	RESPONSABLE	ESTADO
RQ-01	Registro y Autenticación	Permitir el acceso mediante credenciales seguras.	Funcional	Alta	Daniel	Terminado
RQ-02	Gestión de Perfiles	Roles de administradores, testers y desarrolladores.	Funcional	Media	Estephany	En proceso
RQ-03	Panel de Control	Interfaz centralizada para visualizar resultados.	Funcional	Alta	Estephany	En proceso
RQ-04	Generación con IA	Automatización de reportes desde archivos CSV.	Funcional	Alta	Daniel	En proceso
RQ-05	Clasificación de Errores	Categorización de hallazgos por severidad.	Funcional	Media	Estephany	Pendiente
RQ-06	Exportación de Reportes	Generación de archivos en Word y PDF.	Funcional	Alta	Estephany	Pendiente
RQ-07	Integración de Herramientas	Conexión con GitHub y Jira Enterprise.	Funcional	Media	Daniel	Terminado
RQ-08	Base de Datos Central	Persistencia de datos en servidor PostgreSQL.	Funcional	Alta	Estephany	Terminado
RQ-09	Actualización Real-Time	Sincronización inmediata del panel de control.	Funcional	Media	Estephany	En proceso
RQ-10	Historial de Versiones	Acceso a reportes y	Funcional	Media	Estephany	Pendiente

		versiones anteriores.				
RQ-11	Edición Colaborativa	Consulta y edición simultánea por el equipo.	Funcional	Alta	Estephany	Pendiente
RQ-12	Notificaciones Críticas	Alertas automáticas sobre fallas o terminación.	Funcional	Media	Estephany	En proceso
RQ-13	Disponibilidad (Uptime)	Garantizar el 99.5% de tiempo de actividad.	No Funcional	Alta	Daniel	En proceso
RQ-14	Compatibilidad Web	Soporte para Chrome, Edge, Firefox y Safari.	No Funcional	Media	Estephany	En proceso
RQ-15	Tiempo de Respuesta	Máximo de 3 segundos por acción.	No Funcional	Media	Estephany	En proceso
RQ-16	Seguridad Cloud	Autenticación multifactor y encriptación.	No Funcional	Alta	Daniel	En proceso
RQ-17	Escalabilidad	Ajuste automático de recursos según demanda.	No Funcional	Alta	Daniel	Pendiente
RQ-18	Accesibilidad	Cumplimiento con pautas WCAG 2.1.	No Funcional	Bajo	Estephany	Pendiente
RQ-19	Cifrado de Información	Protocolos HTTPS/TLS y AES-256.	No Funcional	Alta	Daniel	Terminado
RQ-20	Logs de Auditoría	Registro inalterable de acciones críticas.	No Funcional	Media	Estephany	Pendiente
RQ-21	Portabilidad Cloud	Flexibilidad entre AWS, Azure y GCP.	No Funcional	Baja	Daniel	Pendiente
RQ-22	Metodología Scrum	Entregas funcionales cada 15 días.	No Funcional	Media	Daniel	En proceso



RQ-23	Respaldo de Datos	Backups automáticos diarios en la nube.	No Funcional	Alta	Daniel	Terminado
RQ-24	Gobierno de TI	Alineación con normas ISO/IEC 27001.	No Funcional	Media	Daniel	En proceso

3. Definición de Campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN
ID:	Código único del requerimiento
Nombre:	Título breve del requerimiento
Descripción:	Explicación clara del requerimiento
Tipo:	Funcional / No funcional
Prioridad:	Alta / Media / Baja
Responsable:	Encargado del requerimiento
Estado:	Pendiente / En proceso / Terminado

4. Control de Cambios

Fecha	ID Req.	Cambio realizado	Impacto (Tiempo/Costo)	Aprobado por
13/04/2026	RQ-03	Ajuste en el algoritmo de extracción de texto de la IA.	Tiempo: +2 días de desarrollo. Costo: Sin impacto.	Daniel Romero
18/04/2026	RQ-04	Rediseño de la interfaz del Panel de Control para móviles.	Tiempo: +3 días. Costo: \$12,450 MXN (pago de horas extra al equipo operativo).	Estephany Muñoz

22/04/2026	RQ-08	Cambio de servidor de base de datos local a instancia AWS RDS.	Tiempo: -1 día. Costo: \$4,500 MXN mensuales adicionales de consumo cloud.	Daniel Romero
25/04/2026	RQ-01	Implementación de validación de correo por token.	Tiempo: +1 día. Costo: Sin impacto.	Estephany Muñoz

5. Observaciones

- **Priorización de la Ruta Crítica:** Se ha dado prioridad absoluta a los requerimientos **RQ-03 (IA)** y **RQ-08** (Base de Datos), ya que cualquier retraso en estos módulos compromete el cronograma de 12 meses planeado para el desarrollo.
- **Ajustes de Infraestructura:** La migración a **AWS RDS** (Control de Cambio V1.2) asegura el cumplimiento del requerimiento no funcional de disponibilidad del **99.5%**, aunque represente un incremento operativo mensual de **\$4,500 MXN**.
- **Gestión de Talento Operativo:** La carga de trabajo detectada en el rediseño de la interfaz móvil sugiere que el equipo operativo deberá optimizar los sprints de **Scrum** para no exceder el presupuesto de horas hombre previsto.
- **Seguridad y Cumplimiento:** Con la implementación del cifrado **AES-256** y la validación por token, el proyecto se alinea preventivamente con las normas ISO/IEC 27001 antes de pasar a la fase de pruebas con clientes piloto.

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

	Minuta No. 10 ET.1 Gestión de Requerimientos Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM10 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición y arquitectura para guardar la información en la nube	Daniel y Estephany acordaron migrar la base de datos de un entorno local a una instancia de AWS RDS para asegurar la disponibilidad del 99.5%.	2 días
Revisión de Algoritmos de IA	Daniel presentó el ajuste en el motor de mapeo para evitar errores de lectura en archivos CSV con formatos variables. Estephany estuvo de acuerdo con el mapeo por lo cual se aplicara.	3 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza
