



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA
DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS



**“Diseño y desarrollo de un software único de
pruebas de documentación para las empresas de TI en la
CDMX”**

Gestión de Proyectos

Licenciatura en Ciencias de la Informática

Maestro titular de la UAp: Goycochea Pineda Yenely Eloisa

P R E S E N T A N:

- Carbajal Mendoza Eduardo
- Martínez Medina Angela Cassandra
- Muñoz Hernández Estephany
- Romero Razo Alexis Daniel
- Zepeda Carmona Lorena Sarahí

Ciudad de México, D.F.

25 de junio de 2026



ÍNDICE

Perfil del Proyecto	6
1. Tema	6
2. Título	6
3. Sector	6
4. Giro	6
5. PIB	6
6. Cliente	6
7. PIB del cliente	6
8. Objetivo	6
9. Descripción General.....	7
10. Benchmarking	10
Mercado	11
11. Estratificación del mercado	11
12. Aceptación del mercado	11
Demanda	12
13. Determinación de la demanda	12
14. Proyección de venta	12
15. Porcentaje de aceptación al cliente	12
16. Porcentaje de incremento	12
Etapas 0 (Inicio).....	14
17. Plan Operativo	14
18. Plan General de Trabajo	19
19. Plan de Comercialización	30
19.1. Diagrama de Entrada / Proceso / Salida	30
19.2. Recursos de Entrada	31
19.3. Recursos de Proceso	34
19.4. Recursos de Salida	37
20. Presupuestos	42
21. Cronograma de Actividades	43
22. Red CPM.....	48
22.1. Tabla de Actividades Críticas	49



22.2.	Tabla de Actividades de Holgura	50
23.	Gráfica de Gantt	52
24.	Análisis de los presupuestos	53
Etapas 1 (Planeación)		55
25.	Acta de constitución del proyecto	55
26.	Registro de interesados	63
27.	Gestión del Alcance del Proyecto	66
28.	EDT.....	71
29.	Plan Dirección de Proyectos	73
30.	Gestión de Requerimientos.....	81
Etapas 2 (Ejecución)		88
31.	Programa Idea del negocio.....	88
32.	Programa Mercado	91
33.	Programa Planes	94
34.	Programa Planeaciones	97
35.	Programas del Área Tecnológica	102
36.	Programas del Área Operativa.....	111
37.	Programas del Área Financiera.....	121
38.	Programas del Área de Recursos Humanos	130
39.	Programas del Área Comercial.....	139
Etapas 3 (Verificación y Control)		151
40.	Cheklis de verificación Etapa 0 (Inicio) Actividad Crítica Programa Idea del Negocio	151
41.	Cheklis de verificación Etapa 0 (Inicio) Actividades críticas y de holgura Programa Mercado	161
42.	Cheklis de verificación Etapa 0 (Inicio) Actividad Crítica Programa Planes	165
43.	Cheklis de verificación Etapa 1 (Planeación) Actividades Críticas y de Holgura Programa Planeaciones	175
44.	Cheklis de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica - Nivel Estratégico	186
45.	Cheklis de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica - Nivel Operativo.....	195
46.	Cheklis de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica – Nivel Táctico	202



47. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Operativa - Nivel Estratégico	211
48. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Operativa - Nivel Operativo	216
49. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad Programa Área Operativa – Nivel Táctico	224
50. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Financiera - Nivel Estratégico.....	232
51. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades de holgura Programa Área Financiera - Nivel Operativo.....	235
52. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad Programa Área Financiera – Nivel Táctico	244
53. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área de Recursos Humanos - Nivel Estratégico.....	247
54. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área Recursos Humanos - Nivel Operativo	254
55. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área Recursos Humanos – Nivel Táctico	260
56. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Comercial - Nivel Estratégico	266
50. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Comercial - Nivel Operativo	273
51. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades de holgura Programa Área Comercial – Nivel Táctico	280
52. Cheklist de verificación Etapa 3 (Control y Verificación) Actividad Crítica Programa Control y Verificación	287
53. Cheklist de verificación Etapa 4 (Cierre) Actividad Programa Control y Verificación	290

PERFIL DEL PROYECTO



Perfil del Proyecto

1. Tema

Diseño y desarrollo de un software.

2. Título

“Diseño y desarrollo de un software único de pruebas de documentación para las empresas de TI en la CDMX. “

3. Sector

Tecnología de la información.

4. Giro

Servicios.

5. PIB

4%

6. Cliente

Empresas del sector de la tecnología de la información.

7. PIB del cliente

15%

8. Objetivo

Diseñar y desarrollar un software único de gestión de pruebas de software con integración de Inteligencia Artificial en empresas de TI ubicadas en las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, CDMX, con base en la necesidad de optimizar la generación de documentación y reportes de calidad, para aumentar la eficiencia operativa y agilizar los tiempos de entrega en los ciclos de desarrollo de dichas empresas.



9. Descripción General

La plataforma es una solución integral en la nube diseñada para que empresas y equipos de TI automaticen la generación, gestión y trazabilidad de la documentación de pruebas de software. Combina una interfaz intuitiva con herramientas de IA para transformar datos estructurados en documentos completos y personalizados, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

Acceso y Onboarding

Al ingresar por primera vez, el usuario podrá crear una cuenta mediante un sencillo proceso de registro (correo y contraseña) o autenticarse si ya posee una. Una vez dentro, accederá a un panel centralizado desde donde podrá organizar proyectos, consultar resultados previos y gestionar todas las funciones principales.

Funcionamiento Paso a Paso para la Generación de Documentos

1. **Inicio:** Desde el panel principal, el usuario selecciona la opción “Generar Documento de Prueba”.
2. **Carga de Archivos:** Sube un archivo CSV con los datos de las pruebas y elige una plantilla personalizada (nueva o una guardada previamente).
3. **Validación:** El sistema verifica automáticamente el formato y la estructura del archivo CSV.
4. **Mapeo Automático con IA:** El motor de IA básica sugiere una correspondencia entre las columnas del CSV y los campos de la plantilla.
5. **Confirmación y Ajuste:** El usuario revisa las coincidencias propuestas en una interfaz clara y puede aceptarlas o ajustarlas manualmente según sea necesario.
6. **Generación del Documento:** Tras la confirmación, el sistema genera automáticamente el documento final, poblando la plantilla con los datos.

Funciones Premium (Opcional)

1. **Validación de Coherencia:** La IA avanzada analiza el contenido para asegurar consistencia y puede sugerir correcciones.
2. **Resúmenes Narrativos:** Genera automáticamente secciones de conclusiones o estadísticas de pruebas.
3. **Descarga y Almacenamiento:** El usuario puede descargar el documento en formatos editables como Word o PDF, o guardarlo en su cuenta dentro de la plataforma para su futuro acceso y consulta.



Características Clave y Entorno de Trabajo

4. **Interfaz Centralizada e Intuitiva:** Un único panel permite gestionar proyectos, consultar historiales y acceder a las herramientas de IA.
5. **Gestión de Plantillas:** Capacidad de subir, crear y gestionar plantillas personalizadas para distintos tipos de informes.
6. **Colaboración y Control de Accesos:** La plataforma permite la creación de entornos de trabajo para equipos u organizaciones, asignando diferentes niveles de acceso a los usuarios.
7. **Integraciones:** El sistema se integra con repositorios y herramientas de gestión de proyectos, evitando la duplicación de información y facilitando un flujo de trabajo continuo.
8. **Acceso y Seguridad:** Al ser un servicio en la nube, es accesible desde cualquier dispositivo con internet, garantizando la seguridad de los datos mediante protocolos de autenticación y encriptación.

En el uso cotidiano, el beneficio principal es que la plataforma permite a las empresas de TI optimizar significativamente su tiempo al automatizar los procesos de documentación. Esto asegura la trazabilidad de las pruebas, reduce la carga operativa y aumenta la eficiencia en la gestión de proyectos de software, todo dentro de un entorno colaborativo y seguro.

Requerimientos Funcionales

- RF1: Permitir el registro y autenticación de usuarios mediante credenciales seguras.
- RF2: Gestionar múltiples perfiles de usuario (administradores, testers, desarrolladores).
- RF3: Proporcionar un panel de control centralizado para visualizar resultados de pruebas.
- RF4: Generar documentación automática de pruebas utilizando módulos de IA.
- RF5: Clasificar errores y hallazgos detectados en las pruebas de software.
- RF6: Exportar reportes en formatos Word y PDF.
- RF7: Integrar la plataforma con repositorios de código y sistemas de gestión de proyectos.
- RF8: Almacenar resultados de pruebas, usuarios y documentación en la base de datos.
- RF9: Actualizar en tiempo real la información de pruebas dentro del panel de control.
- RF10: Proveer un historial de pruebas ejecutadas con acceso a versiones anteriores de reportes.
- RF11: Facilitar la colaboración multiusuario con edición y consulta simultánea de resultados.



- RF12: Enviar notificaciones automáticas sobre finalización de pruebas o hallazgos críticos.

Requerimientos No Funcionales

- RNF1: Garantizar la disponibilidad del sistema al menos en un 99.5% anual.
- RNF2: Asegurar la compatibilidad con navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- RNF3: Optimizar el tiempo de respuesta de la plataforma a un máximo de 3 segundos por acción.
- RNF4: Cumplir con medidas de seguridad en la nube (encriptación de datos, autenticación multifactor).
- RNF5: Escalar los recursos de infraestructura en función de la demanda de usuarios concurrentes.
- RNF6: Implementar prácticas de accesibilidad para usuarios con distintas capacidades (WCAG 2.1).
- RNF7: Proteger la información sensible mediante cifrado en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo (AES-256).
- RNF8: Registrar logs de auditoría para todas las acciones críticas realizadas por los usuarios.
- RNF9: Facilitar la portabilidad de la aplicación hacia diferentes entornos en la nube (AWS, Azure, GCP).
- RNF10: Aplicar metodologías ágiles (Scrum) para asegurar entregas incrementales y funcionales.
- RNF11: Minimizar la pérdida de datos asegurando respaldos automáticos diarios de la base de datos.
- RNF12: Cumplir con normas y buenas prácticas de gobierno de TI (ej. COBIT, ISO/IEC 27001)

10. Benchmarking

Factor	Testify	Aqua	Katalon Studio	Mabl
Costo	Licencia Anual: \$5,136,040 pesos	Licencia Anual: \$4,402,320 pesos	Licencia Anual: \$5,508,460.50 pesos	Licencia Anual: \$6,603,480 pesos
Enfoque principal	Documentación Ejecutiva (Automatización del reporte final con IA).	Gestión de Requisitos, Trazabilidad y Test Cases.	Plataforma de Automatización de QA Completa (Low-Code).	Automatización de Pruebas con IA (Autocuración).
Proceso base	Importación de Datos (CSV) y Mapeo de Plantilla (IA).	Creación de Entidades (Requisitos) y Ejecución de Tests.	Creación de scrips y pruebas de extremo a extremo (E2E).	Grabación, Ejecución y Autocuración de Tests.
Fuente de datos	CSV o Archivos de Datos (suministrados por el usuario).	Base de Datos Interna de la Plataforma.	Código, grabaciones de UI y Test Data internos.	Interfaz de Usuario (UI) y su propio framework.
Tipo de resultados	Documentación Ejecutiva/Narrativa (Reporte final para stakeholders)	Métricas de Trazabilidad y Cumplimiento de Requisitos.	Logs de Ejecución, Reportes JUnit/XML (datos técnicos).	Reportes Visuales de UI, Logs de Errores.
Generación de reportes	Asistente de contenido de IA (Generación de resúmenes y conclusiones narrativas)	Reportes estructurados basados en templates internos.	Deportes detallados para CVCD y Debugging.	Reportes de autocuración, dashboards de analytics
Almacenamiento	Plantillas personalizadas y datos de usuario en la nube (PostgreSQL)	Requisitos Test Cases y Links de trazabilidad	Scrips de pruebas (Repositorio de código, GitHub)	Datos de ejecución, capturas de pantalla de fallas
Factor Diferenciador	Nicho único: Transformación de datos técnicos a valor ejecutivo con IA	Trazabilidad del requisito a la prueba	Costo de licencia Cero (Código abierto)	Pruebas de autocuración y mantenimiento de scrips

Mercado

11. Estratificación del mercado

Mercado Meta: 6 Empresas	Incluye a 6 empresas de TI ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc.
Mercado Objetivo: 15 Empresas	Incluye a 9 empresas de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Mercado Potencial: 19 Empresas	Incluye a 4 empresas de TI en la alcaldía Benito Juárez

Tipo de mercado	Empresas (Cantidad de empresas acumulada)	Ingresos estimados (Pesos MXN)	Consumo Promedio Anual	Participación	Crecimiento
Meta (Cuauhtémoc)	6	\$41,088,320	\$5,136,040 MXN	42.1%	100% (Foco inicial)
Objetivo (Miguel Hidalgo)	15	\$35,952,280	\$5,136,040 MXN	36.9%	83.3% (Expansión)
Potencial (Benito Juárez)	19	\$20,544,160	\$5,136,040 MXN	21%	20.0% (Exploración futura)
Total	33	\$97,584,760	\$5,136,040 MXN	100%	

12. Aceptación del mercado

Demanda	Resultado
Año 1	$6 \times 0.733 = 4.398$
Año 2	$15 \times 0.733 = 10.995$
Año 3	$19 \times 0.733 = 13.927$



Demanda

13. Determinación de la demanda

Año	Empresas acumuladas	Empresas estimadas
Año 1	14 empresas	6 empresas
Año 2	27 empresas	15 empresas
Año 3	33 empresas	19 mpresas

14. Proyección de venta

	Año 1	Año 2	Año 3
Demanda	4.398	10.995	13.927
Costo de venta	\$5,136,040	\$5,136,040	\$5,136,040
Venta	\$22,588,303.92	\$56,470,759.8	\$71,529,629.08

15. Porcentaje de aceptación al cliente

Los resultados de las encuestas muestran que el **73.33%** de los encuestados estarían dispuestos a adquirir el servicio de Testify, lo que refleja una alta aceptación y validación de nuestro software.

16. Porcentaje de incremento

Porcentaje de incremento de ventas del año 1 al año 2

1. Sus ventas (Costo de la plataforma: \$5,136,040 mxn/anual)

- **Ventas año 1:** $4 \times \$5,136,040 = \$22,588,303.92$
- **Ventas año 2:** $11 \times \$5,136,040 = \$56,470,759.8$

2. Su incremento (Del año 1 al año 2)

- **Ganancia extra:** $\$56,470,759.8 - \$22,588,303.92 = \$33,882,455.88$
- **Porcentaje de incremento:** $(\$33,882,455.88 / \$22,588,303.92) \times 100 = 39.99\%$

Para mayores practicidades, hemos redondeado el porcentaje a un **40%**

ETAPA 0 (INICIO)



Etapa 0 (Inicio)

17. Plan Operativo

	Plantilla No.1 ET.0 Plan Operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E1 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 5 de marzo del 2026
---	--

	Tecnológico (Líder Daniel) 8%	Operativo (Directora Estephany) 8%	Finanzas (Eduardo) 8%	Recursos Humanos (Cassandra) 8%	Comercial (Sarahí) 8%
Estratégica 2.6%	Estrategia 1 (0.88%) Diseñar y desarrollar un software único de pruebas de documentación para 6 empresas de TI en la CDMX en 12 meses. Estrategia 2 (0.88%) Gestionar el diseño y desarrollo de 1 innovación tecnológica en 1 mes. Estrategia 3	Estrategia 1 (0.88%) Fabricar un diseño de la estructura funcional del software en 11 meses. Estrategia 2 (0.88%) Gestionar una estandarización de procesos para la generación de reportes en 8 meses. Estrategia 3 (0.88%) Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos y el flujo	Estrategia 1 (0.88%) Obtener afiliaciones con 2 socios capitalistas para cubrir la inversión inicial de \$5,136,040 mxn en 6 meses. Estrategia 2 (0.88%) Gestionar un presupuesto destinado a la innovación y desarrollo del motor	Estrategia 1 (0.88%) Contratar personal especializado: 1 director de proyecto, 3 Programadores y 1 ingeniero en soporte en 6 meses. Estrategia 2 (0.88%) Realizar una capacitación del equipo, en el uso de metodologías de desarrollo e innovación de base	Estrategia 1 (0.88%) Vender 6 licencias del software de pruebas en 11 meses. Estrategia 2 (0.88%) Posicionar la base de datos centralizada de testify como la solución única de documentación en 3 alcaldías en el mercado meta en 10 meses. Estrategia 3 (0.88%)

	(0.88%) Gestionar 1 innovación tecnológica documentando y protegiendo el código fuente ante el indautor en 3 meses.	de información en 10 meses.	de búsqueda de reportes en 10 meses.	de datos en 11 meses.	Diseñar un plan de post-venta para el mantenimiento técnico en las cuentas corporativas de las empresas en 11 meses.
			Estrategia 3 (0.88%) Realizar una proyección financiera que asegure la recuperación de la inversión del segundo año de operación en 11 meses.	Estrategia 3 (0.88%) Establecer un sistema de evaluación por desempeño basado en entregables de software en 10 meses.	
Táctica 2.6%	Estrategia 1 (0.88%) Formular un proyecto que sea rentable y factible en 1 mes. Estrategia 2 (0.88%) Realizar un plan operativo, un plan general de trabajo y un plan de comercialización en 2 semanas. Estrategia 3 (0.88%)	Estrategia 1 (0.88%) Desarrollar un módulo de software basado en el diseño estructural en 6 meses. Estrategia 2 (0.88%) Realizar una validación de los algoritmos de IA para el mapeo automático de datos técnicos en 5 meses. Estrategia 3 (0.88%) Estructurar 5 protocolos de mantenimiento y	Estrategia 1 (0.88%) Determinar un monto de inversión específico para el equipo de oficina y mobiliario en 3 meses. Estrategia 2 (0.88%) Definir un esquema de pagos por licencia anual para las 6 empresas de TI en 5 meses.	Estrategia 1 (0.88%) Definir 3 perfiles profesionales y las competencias técnicas para los programadores de backend en 3 meses. Estrategia 2 (0.88%) Diseñar 2 talleres formativos sobre el manejo de PostgreSQL y arquitectura de software en 4 meses.	Estrategia 1 (0.88%) Realizar 20 prospectos de clientes potenciales enfocándose en empresas de software en 3 meses. Estrategia 2 (0.88%) Desarrollar un set de Pitch Deck comercial que resalte la eficiencia del software frente al llenado manual en 4 meses.

	Crear un código fuente de la innovación en 2 meses.	actualización del sistema en 5 meses.	Estrategia 3 (0.88%) Obtener 4 presupuestos por área para el pago de salarios de los empleados en 4 meses.	Estrategia 3 (0.88%) Estructurar un manual de las métricas del cumplimiento de las etapas de desarrollo en 4 meses.	Estrategia 3 (0.88%) Definir un manual de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para el soporte técnico post-implementación en 3 meses.
Operativa 2.6%	Estrategia 1 (0.88%) Realizar un estudio de mercado y estratificación en 2 semanas. Estrategia 2 (0.88%) Estrategia 2 Definir 45 estrategias para las 5 áreas del proyecto en 1 semana. Estrategia 3 (0.88%) Realizar 3 pruebas de implementación y de usuario en 4 meses.	Estrategia 1 (0.88%) Realizar un documento de pruebas de errores para el rendimiento final del software en 6 meses. Estrategia 2 (0.88%) Ejecutar 15 pruebas unitarias de los módulos desarrollados en 6 meses. Estrategia 3 (0.88%) Realizar 11 actualizaciones de seguridad en la base de datos en 11 meses.	Estrategia 1 (0.88%) Administrar un fondo de caja para la adquisición del equipo y las licencias de software en 3 meses. Estrategia 2 (0.88%) Ejecutar 11 pagos mensuales de los salarios para los trabajadores en 11 meses. Estrategia 3 (0.88%) Realizar 11 reportes de balance general	Estrategia 1 (0.88%) Realizar 15 entrevistas de trabajo en 4 meses. Estrategia 2 (0.88%) Ejecutar 5 inducciones en sesiones técnicas para el personal recién contratado en 2 meses. Estrategia 3 (0.88%) Aplicar 11 encuestas de desempeño para medir el avance del equipo de desarrollo en 11 meses.	Estrategia 1 (0.88%) Cerrar 6 contratos de venta con los tomadores de decisión de las empresas meta en 10 meses. Estrategia 2 (0.88%) Ejecutar 6 demostraciones técnicas del software para los jefes de soporte de las empresas interesadas en 6 meses. Estrategia 3 (0.88%) Gestionar 6 encuestas de



			de egresos para el control del gasto operativo en 11 meses.		satisfacción para medir la reducción de tiempos en documentación en 11 meses.
--	--	--	---	--	---

Firmas de aprobación

Patrocinador del
proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

**Minuta 1. ET.0 Plan Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM1

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 22 de marzo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición y alineación de las 45 estrategias de gestión para las 5 áreas del proyecto.	El equipo completo (Eduardo, Cassandra, Estephany, Daniel y Sarahí) se reunió en el salón de clases para asegurar la relación de los planes (Estratégico, Táctico y Operativo) de cada área. Se acordó que cada integrante redactaría sus 9 estrategias en un documento de Word compartido para mantener la concordancia del proyecto.	14 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



18. Plan General de Trabajo



Plantilla No.2 ET.0 Plan General de Trabajo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E2

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 5 de marzo del 2026

Etapas	Actividad	Tiempo	Recursos	Costo	Entregable	Responsable
Etapas 0 INICIO	Tema	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Perfil del proyecto (lleno y firmado)	Tecnológico
	Título	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Título del proyecto definido	Tecnológico
	Objetivo	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Objetivo general establecido	Tecnológico
	Sector	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Sector económico definido	Tecnológico
	Giro	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Giro empresarial identificado	Tecnológico
	PIB	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	1 Reporte de contribución al PIB	Tecnológico
	Cliente	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Perfil del cliente ideal	Tecnológico
	Mercado	5 días	Laptop, Internet, Viáticos	\$4,600	1 Análisis de mercado TI	Tecnológico
	Aceptación del mercado	5 días	Laptop Viáticos	\$4,600	1 Estudio de factibilidad	Tecnológico

	Proyección de ventas	10 días	Laptop Viáticos	\$9,200	1 Tabla de proyecciones financieras	Finanzas
	Benchmarking	2 días	Laptop, Internet, Viáticos	\$1,840	1 Análisis comparativo de competencia	Tecnológico
	Plan operativo	14 días	Laptop Viáticos	\$12,880	1 Tabla de plan operativo (45 Estrategias (E-T-O))	Operativo RH Tecnológico Fianzas Comercial
	Plan general de trabajo	14 días	Laptop Viáticos	\$12,880	1 Documento de plan general de trabajo	Tecnológico
	Plan de comercialización	7 días	Laptop Viáticos	\$6,440	3 Diagramas, 1 de entrada, 1 de proceso y 1 de salida, 3 listas de recursos y 3 tablas de costos	Comercial
	Cronograma CPM	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Diagrama de ruta crítica	Tecnológico
Etapa 1 PLANEACIÓN	Acta de constitución del proyecto	3 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$4,110	1 Acta de constitución firmada	Tecnológico
	Gestión de Interesados	4 días	Laptop Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$5,480	1 Matriz de interesados (Tabla)	Tecnológico
	Gestión del Alcance	5 días	Laptop, Oficina,	\$6,850	1 Documento de alcance del software	Tecnológico



			Servicios, Viáticos			
	EDT	4 días	Laptop, Software de diagramación, Oficina	\$5,480	1 Diagrama EDT / WBS	Tecnológico
	Gestión de Dirección del Proyecto	6 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$8,220	1 Plan de dirección integral	Tecnológico
	Plantillas de requisitos	3 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$4,110	1 Set de plantillas para usuarios	Tecnológico
Etapa 2 EJECUCIÓN	ÁREA TECNOLÓGICA					
	Diseñar y desarrollar un software único.	12 meses (330 días)	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$452,100	1 Software único de pruebas (Testify)	Tecnológico
	Gestionar una innovación técnica de IA.	10 meses (270 días)	Laptop, APIs de IA, Servicios, Oficina	\$369,900	1 Módulo de IA para conclusiones	Tecnológico
	Gestionar el proyecto integral.	10 meses (270 días)	Laptop, Software de gestión, Servicios	\$369,900	5 Reportes de avance metodológico	Tecnológico
	Realizar el proyecto de inversión técnica.	3 meses (90 días)	Laptop, Internet, Cotizaciones, Viáticos	\$123,300	1 Proyecto de inversión técnica	Tecnológico
	Desarrollar el prototipo funcional (MVP).	6 meses (180 días)	Laptop, Internet,	\$246,600	1 Prototipo funcional validado	Tecnológico

			Cotizaciones, Viáticos			
	Realizar el plano operativo técnico	4 meses (120 días)	Laptop, Servicios, Entorno de desarrollo\$	\$164,400	1 Plano operativo técnico	Tecnológico
	Instalar la infraestructura de red.	3 meses (90 días)	Laptop, Servidores, Cableado, Servicios	\$123,300	1 Servidor PostgreSQL configurado	Tecnológico
	Programar la interfaz de usuario (UI).	5 meses (150 días)	Laptop, Frameworks, Servicios, Oficina	\$205,500	1 Interfaz de usuario programada	Tecnológico
	Configurar los módulos de seguridad.	6 meses (180 días)	Laptop, PostgreSQL, Servicios, Oficina	\$246,600	3 Módulos de seguridad configurados	Tecnológico
	ÁREA OPERATIVA					
	Diseñar la estructura funcional y técnica del software	11 meses (330 días)	Laptop Viáticos	\$452,100	1 Diseño estructural completo	Operativo
	Gestionar la estandarización de procesos de reportes	8 meses (240 días)	Laptop Viáticos	\$328,800	1 Manual de estándares de proceso	Operativo
	Supervisar la integridad de la base de datos y flujos	10 meses (300 días)	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$411,000	1 Reporte de integridad de datos	Operativo
	Desarrollar los módulos de software (Diseño estructural)	6 meses (180 días)	Laptop, Servicios,	\$246,600	1 Set de módulos desarrollados	Operativo

			Oficina, Viáticos			
	Validar los algoritmos de IA para el mapeo de datos	5 meses (150 días)	Laptop, PostgreSQL, Servicios, Oficina	\$205,500	1 Reporte de validación de IA	Operativo
	Estructurar los protocolos de mantenimiento y actualización	4 meses (120 días)	Laptop, Entorno de desarrollo, Servicios	\$164,400	5 Protocolos de mantenimiento	Operativo
	Documentar las pruebas de errores y rendimiento	6 meses (180 días)	Laptop, APIs, Servicios, Oficina	\$246,600	1 Documentación de errores (QA)	Operativo
	Ejecutar las pruebas unitarias de los módulos	6 meses (180 días)	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$246,600	15 Reportes de pruebas unitarias	Operativo
	Realizar las actualizaciones de seguridad en la BD	11 meses (330 días)	Laptop, PostgreSQL, Servicios, Oficina	\$452,100	11 Reportes de actualización	Operativo
	ÁREA FINANCIERA					
	Obtener afiliaciones con socios capitalistas	6 meses (180 días)	Laptop Viáticos	\$246,600	2 Convenios de asociación	Finanzas
	Gestionar el presupuesto de innovación (IA)	10 meses (300 días)	Laptop, Software financiero, Servicios	\$411,000	1 Presupuesto de innovación	Finanzas
	Realizar la proyección de recuperación financiera	11 meses (330 días)	Laptop, Excel avanzado, Servicios	\$452,100	1 Reporte de retorno de inversión	Finanzas



	Determinar el capital para activos y equipo	3 meses (90 días)	Laptop, Cotizaciones, Oficina, Servicios	\$123,300	1 Plan de adquisición de activos	Finanzas
	Definir el tarifario de licencias anuales	5 meses (150 días)	Laptop, Análisis de costos, Servicios	\$205,500	1 Tarifario oficial de Testify	Finanzas
	Obtener el presupuesto trimestral de nómina	4 meses (120 días)	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$164,400	4 Reportes presupuestales	Finanzas
	Administrar el fondo de infraestructura física	11 meses (330 días)	Laptop, Servicios, Cuenta bancaria	\$452,100	1 Bitácora de administración	Finanzas
	Ejecutar el pago mensual de salarios	11 meses (330 días)	Laptop, Token bancario, Servicios	\$452,100	11 Comprobantes de dispersión	Finanzas
	Realizar el balance de caja mensual	11 meses (330 días)	Laptop, Software contable, Servicios	\$452,100	11 Balances mensuales	Finanzas
	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS					
	Contratar personal especializado	6 meses (180 días)	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$246,600	5 Contratos laborales firmados	RH
	Capacitar al personal en metodologías y bases de datos	11 meses (330 días)	Laptop, Material didáctico, Servicios	\$452,100	1 Programa de capacitación integral	RH



	Establecer el sistema de evaluación del desempeño	10 meses (300 días)	Laptop, Formatos, Servicios, Oficina	\$411,000	1 Sistema de evaluación	RH
	Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas	3 meses (90 días)	Laptop, Internet, Oficina, Servicios	\$123,300	5 Perfiles de puesto validados	RH
	Diseñar los talleres formativos de la arquitectura	4 meses (120 días)	Laptop, Guías técnicas, Servicios	\$164,400	3 Módulos formativos diseñados	RH
	Estructurar los KPIs de productividad del equipo	4 meses (120 días)	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$164,400	1 Manual de indicadores (KPIs)	RH
	Realizar las entrevistas y pruebas técnicas	4 meses (120 días)	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$164,400	15 Reportes de entrevista	RH
	Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal	2 meses (60 días)	Laptop, Servicios, Material de bienvenida	\$82,200	5 Bitácoras de inducción	RH
	Aplicar las encuestas de desempeño mensuales	11 meses (330 días)	Laptop, Formularios, Servicios, Oficina	\$452,100	11 Reportes de evaluación mensual	RH
	ÁREA COMERCIAL					
	Vender el licenciamiento anual a las empresas de TI	11 meses (330 días)	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$452,100	6 Contratos de licencia firmados	Comercial



	Posicionar a Testify en el mercado de la CDMX	10 meses (300 días)	Laptop, Campaña Digital, Servicios	\$411,000	1 Reporte de posicionamiento	Comercial
	Diseñar el plan de post-venta y mantenimiento	11 meses (330 días)	Laptop, Formatos, Servicios, Oficina	\$452,100	1 Plan de post-venta detallado	Comercial
	Realizar la prospección de clientes (Directores TI)	3 meses (90 días)	Laptop, CRM, Teléfono, Servicios	\$123,300	1 Cartera de 20 prospectos	Comercial
	Desarrollar el Pitch Deck comercial de Testify	4 meses (120 días)	Laptop, Software de diseño, Servicios	\$164,400	1 Presentación ejecutiva (Pitch Deck)	Comercial
	Definir los niveles de soporte y acuerdos (SLA)	3 meses (90 días)	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$123,300	1 Manual de niveles de servicio	Comercial
	Cerrar los contratos legales con clientes	10 meses (300 días)	Laptop, Papelería legal, Viáticos	\$411,000	6 Expedientes de contrato cerrados	Comercial
	Ejecutar las demos técnicas para jefes de área	6 meses (180 días)	Laptop, Prototipo, Viáticos, Servicios	\$246,600	10 Bitácoras de demostración	Comercial
	Gestionar encuestas de satisfacción y eficiencia	11 meses (330 días)	Laptop, Formularios, Servicios, Oficina	\$452,100	6 Reportes de satisfacción	Comercial
Etapas 3	Cheeklist de Verificación	3 días	Laptop, Oficina,	\$4,110	1 Checklist de verificación (Tabla)	Tecnológico

CONTROL Y VERIFICACIÓN			Servicios, Viáticos			
	Control de cambios	4 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$5,480	1 Bitácora de control de cambios	Tecnológico
	Control de Seguimiento	5 días	Laptop, Oficina, Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$6,850	1 Reporte de seguimiento de hitos	Tecnológico
Etapa 4 CIERRE	Plantilla de Resultados	3 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$4,110	1 Matriz de resultados finales	Tecnológico
	Plantilla de costos	2 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$2,740	1 Reporte de costos reales vs planeados	Finanzas
	Plantilla de valor Ganado	3 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$4,110	1 Análisis de Valor Ganado (EVA)	Finanzas
	Plantilla de Acta de Cierre	2 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$2,740	1 Acta de cierre del proyecto firmada	Tecnológico
TOTAL				\$13,235,090		



Firmas de aprobación

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Daniel Romero Razo'.

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estephany Muñoz Hernández'.

Estephany Muñoz Hernández

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorena Sarahí Zepeda Carmona'.

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela Cassandra Martínez Medina'.

Angela Cassandra Martínez
Medina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Carbajal Mendoza'.

Eduardo Carbajal Mendoza

**Minuta No.2 ET.0 Plan General de Trabajo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC2EM2

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 23 de marzo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del cronograma detallado de actividades, costos y entregables por etapa del proyecto.	El líder del área tecnológica, Daniel, coordinó la integración del Plan General de Trabajo mediante una sesión colaborativa. Se acordó estructurar todas las actividades del proyecto por etapas (inicio, planeación, ejecución, control y cierre), detallando sus tiempos, recursos y costos. Asimismo, el equipo validó que los entregables fueran claros y medibles, aprobando el documento.	14 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

19. Plan de Comercialización



Plantilla No.3 ET.0 Plan de Comercialización

Título del Proyecto: Testify


ID: ES0DC1E3

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 10 de marzo del 2026

19.1. Diagrama de Entrada / Proceso / Salida

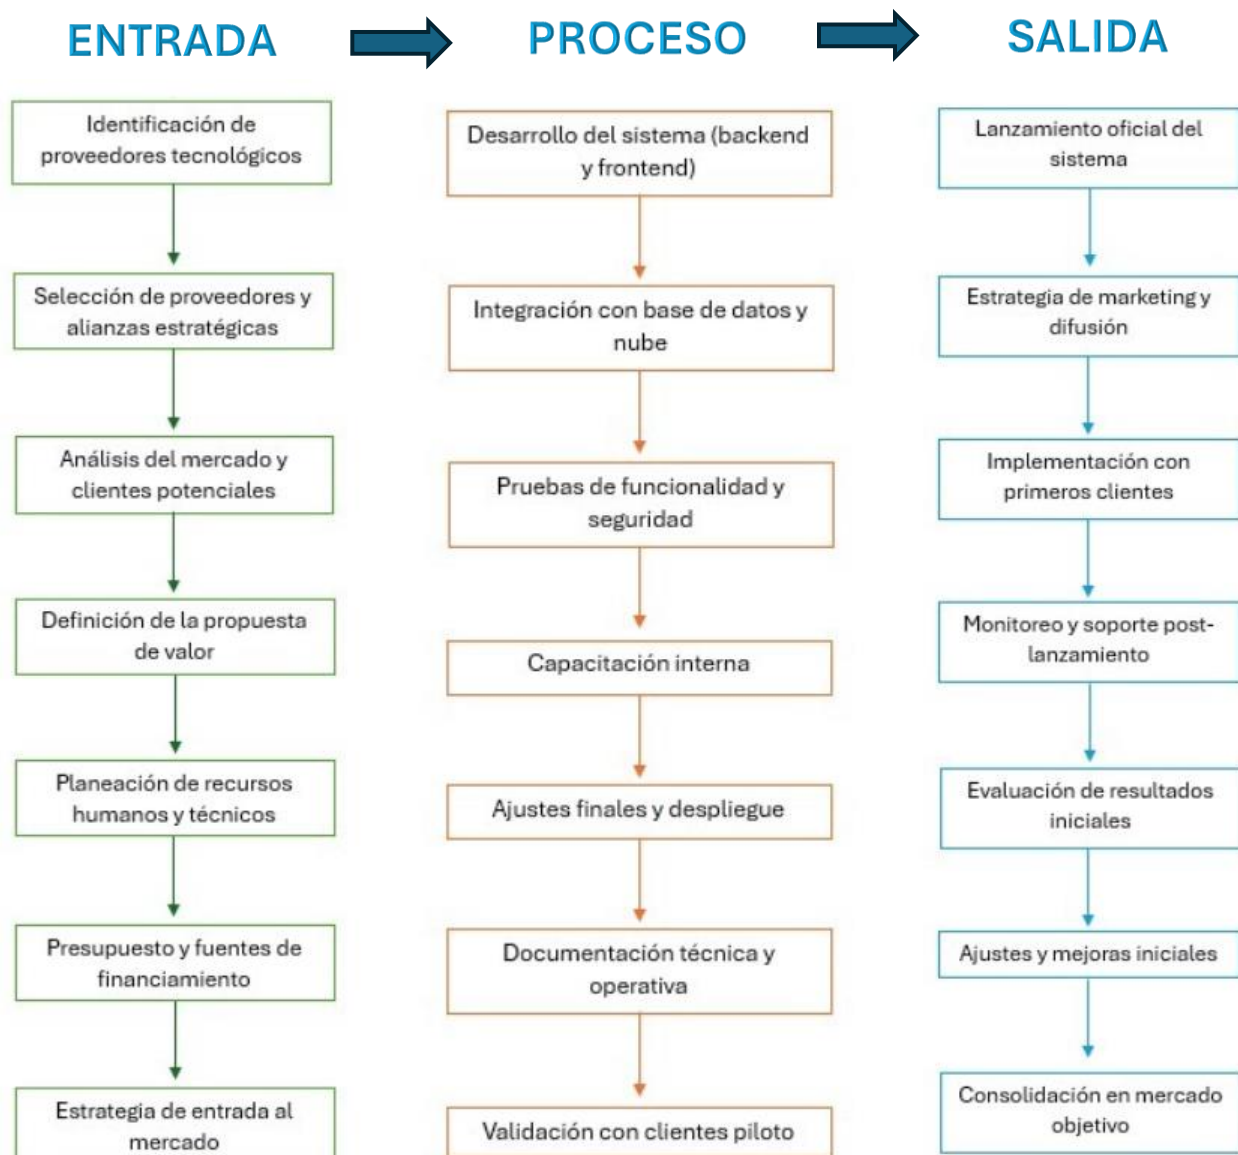



19.2. Recursos de Entrada

1. Identificación de proveedores tecnológicos

1. Laptops con acceso a Internet para investigación técnica.
2. Suscripciones temporales a documentación técnica de AWS y OpenAI.
3. Herramientas de búsqueda y análisis de mercado (Navegadores, motores de búsqueda).

2. Selección de proveedores

1. 5 Laptops Dell Latitude 5440 (Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD).
2. Servidor AWS EC2 y base de datos RDS PostgreSQL (Instancias iniciales).
3. Router Cisco RV345 Dual WAN.
4. 5 Licencias de PyCharm Professional.
5. Certificado SSL DigiCert (1 año).
6. Suscripción a Jira Enterprise (5 usuarios).
7. Internet de fibra óptica empresarial (200 Mbps).

3. Análisis de mercado y clientes potenciales

1. Bases de datos de empresas de servicios TI en CDMX (41 registros).
2. Mapas digitales de ubicación (Google Maps/INEGI).
3. Viáticos para levantamiento de campo en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

4. Definición de la propuesta de valor

1. Laptops, servicios de energía eléctrica e internet.
2. Viáticos para reuniones de planeación estratégica y definición de objetivos.
3. Software de diseño (PowerPoint, Lucidchart, Adobe Suite).
4. Equipo de grabación (Smartphone o Cámara) para el video demo corto.

5. Planeación de recursos humanos y técnicos



1. 1 Director de proyecto, 3 Programadores y 1 Ingeniero en soporte (Equipo inicial).
2. Licencia de software de diagramación (Lucidchart) para el organigrama y planos operativos.
3. Suscripción empresarial a GitHub para el repositorio de código fuente.
4. Servidor de pruebas (Staging) configurado en la nube AWS.

6. Presupuesto y fuentes de financiamiento

1. Software de hojas de cálculo (Excel avanzado) para proyecciones financieras.
2. Documentación legal y convenios para afiliación con 2 socios capitalistas.
3. Cotizaciones formales de proveedores cloud y hardware.

7. Estrategia de entrada al mercado

1. Prototipo funcional (MVP) de Testify instalado en servidor de pruebas.
2. 500 Folletos técnicos impresos con el tarifario de licencias anuales.
3. Presupuesto para pauta publicitaria en Facebook Ads y Google Ads.
4. Agenda física/digital de visitas comerciales y viáticos de traslado.

Tabla de costos de Entrada

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo Total (MXN)
1.- Identificación de proveedores tecnológicos	5 días	1. Listado preliminar de AWS (Infraestructura) , 2. OpenAI/Hugging Face (APIs de IA) 3. PyCharm (IDE Python) 4. UX/UI y frameworks 5. Django/Next.js.	\$0 Solo investigación
2.- Selección de proveedores	1 día	1. 5 Laptops de alto rendimiento (i7, 16GB RAM, SSD) para desarrollo Python y modelos de IA.	\$135,000
	1 día	2. AWS EC2 + RDS PostgreSQL (Instancias para backend modular y base de datos relacional).	\$60,000
	Medio día	3. Router empresarial y Firewall para seguridad de red local en oficina de desarrollo.	\$15,000

	1 día	4. 5 Licencias de PyCharm Professional para optimización de código y despliegue.	\$20,000
	4 horas	5. Certificado SSL/TLS para encriptación de datos de pruebas sensibles (HTTPS).	\$8,000
	4 horas	6. Suscripción Jira (5 usuarios, 1 año)	\$24,000
	2 días	7. Internet de fibra óptica simétrica para comunicación constante con servicios cloud.	\$24,000
3.- Análisis de mercado y clientes potenciales	3 días	1. Base de datos de 41 empresas de TI en CDMX (Enfoque en sector servicios).	\$5,000
	3 días	2. Listado de 14 clientes meta en la Alcaldía Cuauhtémoc (Foco inicial).	\$2,000
	2 días	3. Mapeo de agencias de TI en Miguel Hidalgo (Mercado objetivo fase 2).	\$1,000
4.- Definición de la propuesta de valor	2 días	1. Documento PDF enfocado en la reducción del 70% en tiempos de documentación.	\$2,000
	2 días	2. Presentación ejecutiva sobre automatización de archivos CSV a reportes Word/PDF con IA.	\$3,000
	2 días	3. Infografías del motor de mapeo inteligente y gestión de plantillas personalizadas.	\$2,000
	1 día	4. Video demo de 2 min: Carga de datos crudos y generación de conclusiones narrativas.	\$5,000
5.- Planeación de recursos humanos y técnicos	2 días	1. Organigrama (Lucidchart): Devs Python, Ing. IA, Especialista QA y Marketing.	\$1,000
	2 días	2. Repositorio en GitHub Enterprise para control de versiones y seguridad de propiedad intelectual.	\$2,000
	2 días	3. Servidor de pruebas (Staging) en AWS para validación de sprints.	\$2,000
6.- Presupuesto y fuentes de financiamiento	2 días	1. Documento Excel con presupuesto detallado de inversión	\$0
	2 días	2. Estimación de sueldos mensuales del equipo	\$0



	1 día	3. Cotizaciones AWS y proveedores	\$0
	Medio día	4. Plan de marketing digital B2B (Google Ads y LinkedIn Ads).	\$0
7.- Estrategia de entrada al mercado	3 días	1. Demo funcional del sistema para validación con clientes piloto.	\$10,000
	3 días	2. Folletos impresos (500 piezas) para promoción en zonas empresariales de CDMX.	\$5,000
	3 días	3. Campaña inicial de anuncios para reclutamiento de testers y usuarios premium.	\$8,000
	3 días	4. Agenda de visitas comerciales a corporativos de las alcaldías meta.	\$2,000
Total	54 días		\$364,000

19.3. Recursos de Proceso

1. Desarrollo del sistema (backend y frontend)

1. 2 desarrolladores Backend
2. 2 desarrolladores Frontend
3. 1 Diseñador UI/UX
4. 1 Scrum Master
5. Laptops de alto rendimiento y monitores adicionales.

2. Integración con base de datos y nube

1. 1 DevOps Engineer para automatización de CI/CD y despliegue.
2. Router Cisco RV345 Dual WAN (previamente adquirido).
3. Servidores en la nube AWS (instancias EC2) y almacenamiento S3.
4. Base de datos PostgreSQL o MySQL configurada.

3. Pruebas de funcionalidad y seguridad

1. 1 QA Tester (especializado en control de calidad y pruebas de rendimiento).
2. Licencia anual de Postman para pruebas de API.
3. Software Selenium para automatización de pruebas funcionales.
4. Certificado SSL DigiCert (ya instalado en servidores).



4. Capacitación interna

1. Manual de usuario en formato PDF con guías de uso de la IA.
2. Videos tutoriales internos sobre el flujo de generación de reportes.
3. Material didáctico impreso (30 copias físicas para el equipo).

5. Ajustes finales y despliegue

1. Equipo de desarrollo para corrección de errores (Backend y Frontend).
2. Infraestructura de producción final en la nube AWS con balanceo de carga.

6. Documentación técnica y operativa

1. Manual técnico de 100 páginas (PDF detallando arquitectura y mapeo).
2. Guía de mantenimiento de sistemas y bases de datos.
3. Documentación interactiva de la API (Swagger).

7. Validación con clientes piloto

1. Entornos de implementación en 3 agencias de TI piloto.
2. Equipo de soporte técnico (desarrolladores y QA) para atención inicial.
3. Formularios y licencias para encuestas de satisfacción digital.

Tabla de costos del Proceso

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo Total (MXN)
1.- Desarrollo del sistema (backend y frontend)	45 días	1. 2 desarrolladores Backend	\$160,000
		2. 2 desarrolladores Frontend	\$150,000
		3. 1 Diseñador UI/UX	\$55,000
		4. 1 Scrum Máster	\$65,000

2.- Integración con base de datos y nube	15 días	5. 1 DevOps Engineer para integración de CI y automatización de pruebas	\$30,000
		6. Configuración inicial Router Cisco (ya comprado)	\$5,000
		7. Configuración de servicios en la nube (AWS EC2, S3 y base de datos PostgreSQL).	\$15,000
3.- Pruebas de funcionalidad y seguridad	20 días	1. QA Tester (Pruebas unitarias, funcionales y de precisión de la IA).	\$60,000
	7 días	2. Licencia Postman (1 año)	\$5,000
	5 días	3. Herramienta Selenium con su configuración inicial	\$9,000
	2 días	4. Certificado SSL DigiCert (ya adquirido en Entrada, instalación)	\$0
4.- Capacitación interna	10 días	1. Manual de usuario (PDF + videos internos)	\$12,000
	5 días	2. Sesiones de capacitación presencial para el equipo técnico y de ventas.	\$10,000
	3 días	3. Material didáctico impreso sobre el motor de mapeo inteligente (30 copias).	\$3,000
5.- Ajustes finales y despliegue	15 días	1. Ajustes de código y corrección de hallazgos críticos (Equipo de desarrollo incluido en actividad 1).	\$0
	5 días	2. Configuración final de servidores en producción y escalabilidad cloud (Ya pagado).	\$0
6.- Documentación técnica y operativa	12 días	1. Manual técnico (PDF, 100 páginas)	\$15,000
	5 días	2. Guía de mantenimiento	\$8,000
	5 días	3. Documentación API (Swagger)	\$6,000



7.- Validación con clientes piloto	30 días	1. Implementación y monitoreo en 3 agencias piloto de la Alcaldía Cuauhtémoc.	\$45,000
	30 días	2. Soporte técnico inicial y refinamiento de prompts para el motor de IA.	\$25,000
	10 días	3. Encuestas de satisfacción	\$4,000
TOTAL	184 días		\$682,000

19.4. Recursos de Salida

1. Lanzamiento oficial del sistema

1. Renta de sala ejecutiva (Alcaldía Cuauhtémoc).
2. Servicio de Coffee break para prospectos.
3. Video promocional profesional de 1–2 minutos.
4. Community Manager (1 mes).
5. Laptops y acceso a Internet para la demostración.
6. Viáticos para el equipo de presentación.

2. Estrategia de marketing y difusión

1. Presupuesto para campañas en Facebook Ads y Google Ads.
2. 500 Folletos técnicos impresos.
3. 5 Lonas publicitarias de gran formato.
4. Material de branding (identidad visual de Testify).

3. Implementación con primeros clientes

1. 2 Desarrolladores de software (Soporte en sitio).
2. 1 Analista QA (Validación en producción).
3. Laptops de trabajo y dispositivos móviles de prueba.
4. Viáticos de transporte para visitas técnicas.

4. Monitoreo y soporte post-lanzamiento

1. Suscripción a Datadog o Grafana (Plan anual).
2. 2 Agentes de soporte técnico (Help Desk).
3. Línea telefónica empresarial y WhatsApp Business API.
4. Sistema de tickets (Jira Service Management).

5. Evaluación de resultados iniciales

1. Licencia de software para encuestas digitales.
2. Acceso a Google Analytics y Dashboards de AWS.



3. Plantillas de reporte en PowerPoint.

6. Ajustes y mejoras iniciales

1. Equipo de desarrollo (Backend, Frontend e IA).
2. Licencias de Figma (Ajustes de UI/UX).
3. Repositorio de GitHub Enterprise (Documentación de cambios).

7. Consolidación en mercado objetivo


1. CRM básico para fidelización (HubSpot o Zoho).
2. Equipo de producción audiovisual (Casos de éxito).
3. Relaciones Públicas y asesores legales (Contratos corporativos).

Tabla de costos de la Salida

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo Total (MXN)
1.- Lanzamiento oficial del sistema	5 días	1. Evento de lanzamiento (renta de sala + coffee break)	\$20,000
	5 días	2. Diseño de video promocional (1–2 min profesional)	\$8,000
	5 días	3. Publicación en redes sociales (community manager 1 mes)	\$10,000
2.- Estrategia de marketing y difusión	10 días	1. Campaña digital en LinkedIn Ads / Google Ads (dirigido a líderes de TI)	\$20,000
	10 días	2. 500 folletos impresos adicionales	\$5,000
	10 días	3. 5 lonas publicitarias de gran formato para agencias piloto en Cuauhtémoc.	\$7,500
3.- Implementación con primeros clientes	15 días	1. 2 Desarrolladores de software (Soporte en sitio) y Viáticos.	\$20,000
		2. Analista QA para acompañamiento en producción y validación de reportes.	\$6,000

4.- Monitoreo y soporte post-lanzamiento	15 días	1. Suscripción a Datadog o Grafana (Plan anual).	\$12,000
		2. Agentes de soporte técnico (Help Desk).	\$15,000
		3. Línea telefónica, WhatsApp API y Jira Service Management.	\$6,000
5.- Evaluación de resultados iniciales	7 días	1. Licencia de software para encuestas digitales y llamadas.	\$3,000
		2. Acceso a Google Analytics y Dashboards de AWS.	\$2,000
		3. Plantillas de reporte en PowerPoint.	\$3,000
6.- Ajustes y mejoras iniciales	10 días	4. Equipo de desarrollo (Backend, Frontend e IA).	\$12,000
	10 días	5. Licencias para ajustes de UI/UX.	\$5,000
	10 días	6. Repositorio de GitHub Enterprise (Documentación de cambios).	\$2,000
7.- Consolidación en mercado objetivo	20 días	7. CRM básico (HubSpot o Zoho) y fidelización.	\$10,000
	20 días	8. Equipo de producción audiovisual	\$8,000
	20 días	9. Relaciones públicas (medios locales y blogs automotrices)	\$7,000
TOTAL	172 días		\$181, 500
COSTOS TOTALES ANUALES			\$1,227,500

Firmas de aprobación




Patrocinador del proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela', written over a horizontal line.

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexis', written over a horizontal line.

Eduardo Carbajal Mendoza

*Estephany Muñoz
Hernández*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estephany', written over a horizontal line.

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No.3 ET.0 Plan de Comercialización

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC3EM3

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 24 de marzo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Diseño del diagrama de Entrada, Proceso y Salida y determinación de recursos necesarios para la estrategia de mercado.	La líder comercial, Sarahí, organizó una reunión en línea para definir la estructura del plan. Estephany apoyó en la identificación de los recursos necesarios en cada fase (entrada, proceso y salida), mientras que Eduardo elaboró las tablas de costos correspondientes.	7 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza

20. Presupuestos

1. Costo Total del Plan General de Trabajo (P.G.T.) = % Venta \$

Etapas	Descripción	Monto (MXN)	% Venta \$ (Peso Relativo)
Etapas 0	Inicio	\$65,320	0.65%
Etapas 1	Planeación	\$34,250	0.34%
Etapas 2	Ejecución	\$9,864,000	98.72%
Etapas 3	Control y Verificación	\$16,440	0.17%
Etapas 4	Cierre	\$12,330	0.12%
TOTAL	P.G.T.	\$9,992,340	100.00%

2. Cálculo del Presupuesto del Proyecto (P.P.)

Fórmula: P.G.T + P.C

Datos:

- P.G.T. (Plan General de Trabajo): \$13,235,090 mxn
- P.C. (Plan de Comercialización): \$1,227,500 mxn

Resultado: \$14,462,590 mxn

3. Cálculo del Presupuesto del Patrocinador (Utilidad Proyectada)

Fórmula: P.N – P.P

Datos:

- P.N. (Presupuesto del Negocio / Ventas): \$22,588,304 mxn
- P.P. (Presupuesto del Proyecto): \$14,462,590 mxn

Resultado: 8,125,714 mxn



21. Cronograma de Actividades



Plantilla No.4 ET.0 Cronograma de Actividades

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E4

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 15 de marzo del 2026

Actividades	Precedencia	Tiempo	Costo (MXN)
A	-	1 día	\$920
B	A	1 día	\$920
C	B	1 día	\$920
D	C	1 día	\$920
E	D	1 día	\$920
F	E	1 día	\$920
G	F	1 día	\$920
H	G	5 días	\$4,600
I	H	5 días	\$4,600
J	I	10 días	\$9,200
K	H	2 días	\$1,840
L	J,K	14 días	\$12,880
M	L	14 días	\$12,880
N	M	7 días	\$6,440
Ñ	N	1 día	\$920
O	Ñ	3 días	\$4,110
P	O	4 días	\$5,480
Q	P	5 días	\$6,850
R	Q	4 días	\$5,480
S	R	6 días	\$8,220
T	S	3 días	\$4,110
U	T	12 meses (330 días)	\$452,100
V	U	10 meses (270 días)	\$369,900
W	U	10 meses (270 días)	\$369,900
X	O	3 meses (90 días)	\$123,300
Y	U	6 meses (180 días)	\$246,600
Z	Y	4 meses (120 días)	\$164,400

AA	X	3 meses (90 días)	\$123,300
AB	Z	5 meses (150 días)	\$205,500
AC	AA	6 meses (180 días)	\$246,600
AD	T	11 meses (330 días)	\$452,100
AE	AD	8 meses (240 días)	\$328,800
AF	AD	10 meses (300 días)	\$411,000
AG	AD	6 meses (180 días)	\$246,600
AH	AG	5 meses (150 días)	\$205,500
AI	AG	4 meses (120 días)	\$164,400
AJ	AG	6 meses (180 días)	\$246,600
AK	AG	6 meses (180 días)	\$246,600
AL	AF	11 meses (330 días)	\$452,100
AM	O	6 meses (180 días)	\$246,600
AN	AM	10 meses (300 días)	\$411,000
AÑ	AN	11 meses (330 días)	\$452,100
AO	AM	3 meses (90 días)	\$123,300
AP	AO	5 meses (150 días)	\$205,500
AQ	AM	4 meses (120 días)	\$164,400
AR	AN	11 meses (330 días)	\$452,100
AS	AQ	11 meses (330 días)	\$452,100
AT	AQ	11 meses (330 días)	\$452,100
AU	O	6 meses (180 días)	\$246,600
AV	AU	11 meses (330 días)	\$452,100

AW	AV	10 meses (300 días)	\$411,000
AX	AU	3 meses (90 días)	\$123,300
AY	AX	4 meses (120 días)	\$164,400
AZ	AX	4 meses (120 días)	\$164,400
BA	AU	4 meses (120 días)	\$164,400
BB	BA	2 meses (60 días)	\$82,200
BC	AW	11 meses (330 días)	\$452,100
BD	N	11 meses (330 días)	\$452,100
BE	BD	10 meses (300 días)	\$411,000
BF	BD	11 meses (330 días)	\$452,100
BG	N	3 meses (90 días)	\$123,300
BH	BG	4 meses (120 días)	\$164,400
BI	BG	3 meses (90 días)	\$123,300
BJ	BD	10 meses (300 días)	\$411,000
BK	Y	6 meses (180 días)	\$246,600
BL	BD	11 meses (330 días)	\$452,100
BM	U	3 días	\$4,110
BN	BM	4 días	\$5,480
BÑ	BN	5 días	\$6,850
BO	BÑ	3 días	\$4,110
BP	BO	2 días	\$2,740
BQ	BP	3 días	\$4,110
BR	BQ	2 días	\$2,740



Firmas de aprobación

Patrocinador del proyecto

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela'.

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexis'.

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estephany'.

*Estephany Muñoz
Hernández*

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo'.

Eduardo Carbajal Mendoza

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorena'.

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No.4 ET.0 Cronograma de Actividades**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM4

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 25 de marzo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del cronograma de actividades del proyecto, incluyendo la secuencia de tareas, tiempos estimados, precedencias y asignación de recursos.	Bajo la dirección del Líder Tecnológico Daniel, se realizó una llamada via discord para revisar la lógica de todas las actividades de cada Etapa. Esto con el fin de definir el tiempo en que se realizó cada actividad y dándole las precedencias de la ejecución. Se acordó que Daniel sería el único responsable de capturar los datos en la tabla de precedencias para evitar errores de duplicidad.	1 día

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto


Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

22. Red CPM

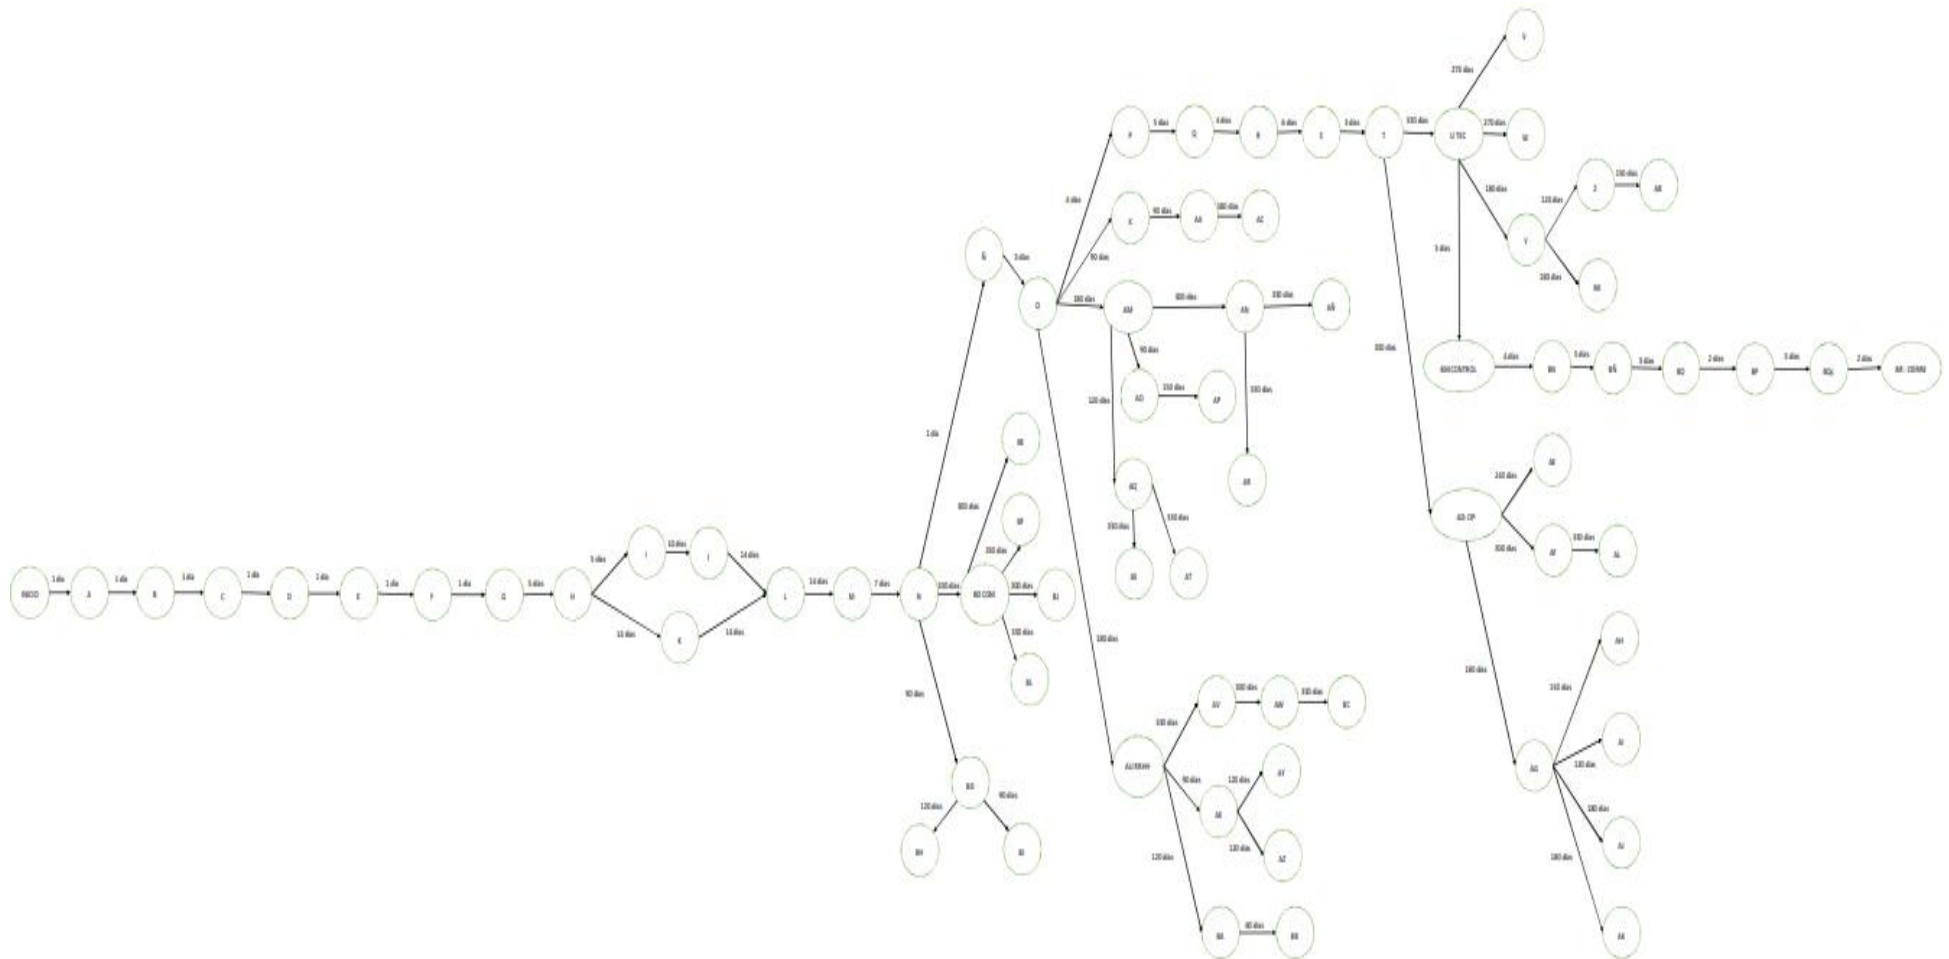



22.1. Tabla de Actividades Críticas

Estas son las actividades que no tienen holgura (HL = 0) y, por tanto, conforman la ruta crítica del proyecto.

Letra	Dependencia	Duración	HT	HL	Estado
A	—	1 día	0	0	Crítica
B	A	1 día	0	0	Crítica
C	B	1 día	0	0	Crítica
D	C	1 día	0	0	Crítica
E	D	1 día	0	0	Crítica
F	E	1 día	0	0	Crítica
G	F	1 día	0	0	Crítica
H	G	5 días	0	0	Crítica
I	H	5 días	0	0	Crítica
J	I	10 días	0	0	Crítica
L	J,K	14 días	0	0	Crítica
M	L	14 días	0	0	Crítica
N	M	7 días	0	0	Crítica
Ñ	N	1 día	0	0	Crítica
O	Ñ	3 días	0	0	Crítica
T	S	3 días	0	0	Crítica
U	T	330 días	0	0	Crítica
Y	U	180 días	0	0	Crítica
Z	Y	120 días	0	0	Crítica
AB	Z	150 días	0	0	Crítica
BD	N	330 días	0	0	Crítica
BJ	BD	300 días	0	0	Crítica
BM	U	3 días	0	0	Crítica
BN	BM	4 días	0	0	Crítica
BÑ	BN	5 días	0	0	Crítica
BO	BÑ	3 días	0	0	Crítica
BP	BO	2 días	0	0	Crítica
BQ	BP	3 días	0	0	Crítica
BR	BQ	2 días	0	0	Crítica

22.2. Tabla de Actividades de Holgura

Estas son las actividades que no pertenecen a la ruta crítica, es decir, poseen holgura (HT > 0).

Letra	Dependencia	Duración	HT	HL	Estado
K	H	2 días	2	0	Holgura
P	O	4 días	3	0	Holgura
Q	P	5 días	3	0	Holgura
R	Q	4 días	3	0	Holgura
S	R	6 días	3	0	Holgura
V	U	270 días	10	10	Holgura
W	U	270 días	10	10	Holgura
X	O	90 días	5	0	Holgura
AA	X	90 días	5	0	Holgura
AC	AA	180 días	5	0	Holgura
AD	T	330 días	8	8	Holgura
AE	AD	240 días	8	0	Holgura
AF	AD	300 días	8	0	Holgura
AG	AD	180 días	8	0	Holgura
AH	AG	150 días	8	0	Holgura
AI	AG	120 días	8	0	Holgura
AJ	AG	180 días	8	0	Holgura
AK	AG	180 días	8	0	Holgura
AL	AF	330 días	8	0	Holgura
AM	O	180 días	6	6	Holgura
AN	AM	300 días	6	0	Holgura
AÑ	AN	330 días	6	0	Holgura
AO	AM	90 días	6	0	Holgura
AP	AO	150 días	6	0	Holgura
AQ	AM	120 días	6	0	Holgura
AR	AN	330 días	6	0	Holgura
AS	AQ	330 días	6	0	Holgura
AT	AQ	330 días	6	0	Holgura
AU	O	180 días	7	7	Holgura
AV	AU	330 días	7	0	Holgura
AW	AV	300 días	7	0	Holgura
AX	AU	90 días	7	0	Holgura
AY	AX	120 días	7	0	Holgura
AZ	AX	120 días	7	0	Holgura



BA	AU	120 días	7	0	Holgura
BB	BA	60 días	7	0	Holgura
BC	AW	330 días	7	0	Holgura
BE	BD	300 días	4	0	Holgura
BF	BD	330 días	4	0	Holgura
BG	N	90 días	4	4	Holgura
BH	BG	120 días	4	0	Holgura
BI	BG	90 días	4	0	Holgura
BK	Y	180 días	3	0	Holgura
BL	BD	330 días	4	0	Holgura

Ruta Crítica: A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → L → M → N → Ñ → O → T → U → Y → Z → AB → BM → BN → BÑ → BO → BP → BQ → BR

Sustituyendo los valores tenemos que:

$1+1+1+1+1+1+1+5+5+10+14+14+7+1+3+3+330+180+120+150+3+4+5+3+2+3+2 = 873 \text{ días}$


Mediante el análisis se reveló que la ruta crítica más larga es de **873 días**, equivalentes a **6,984 horas de trabajo efectivo**. Si se consideran jornadas laborales de 8 horas, esto representa aproximadamente 873 días laborales, es decir, cerca de 2.39 años de ejecución del proyecto.



23. Gráfica de Gantt

DIAGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES (GANTT) - PROYECTO "TESTIFY"

Periodo: Abril 2026 - Septiembre 2027

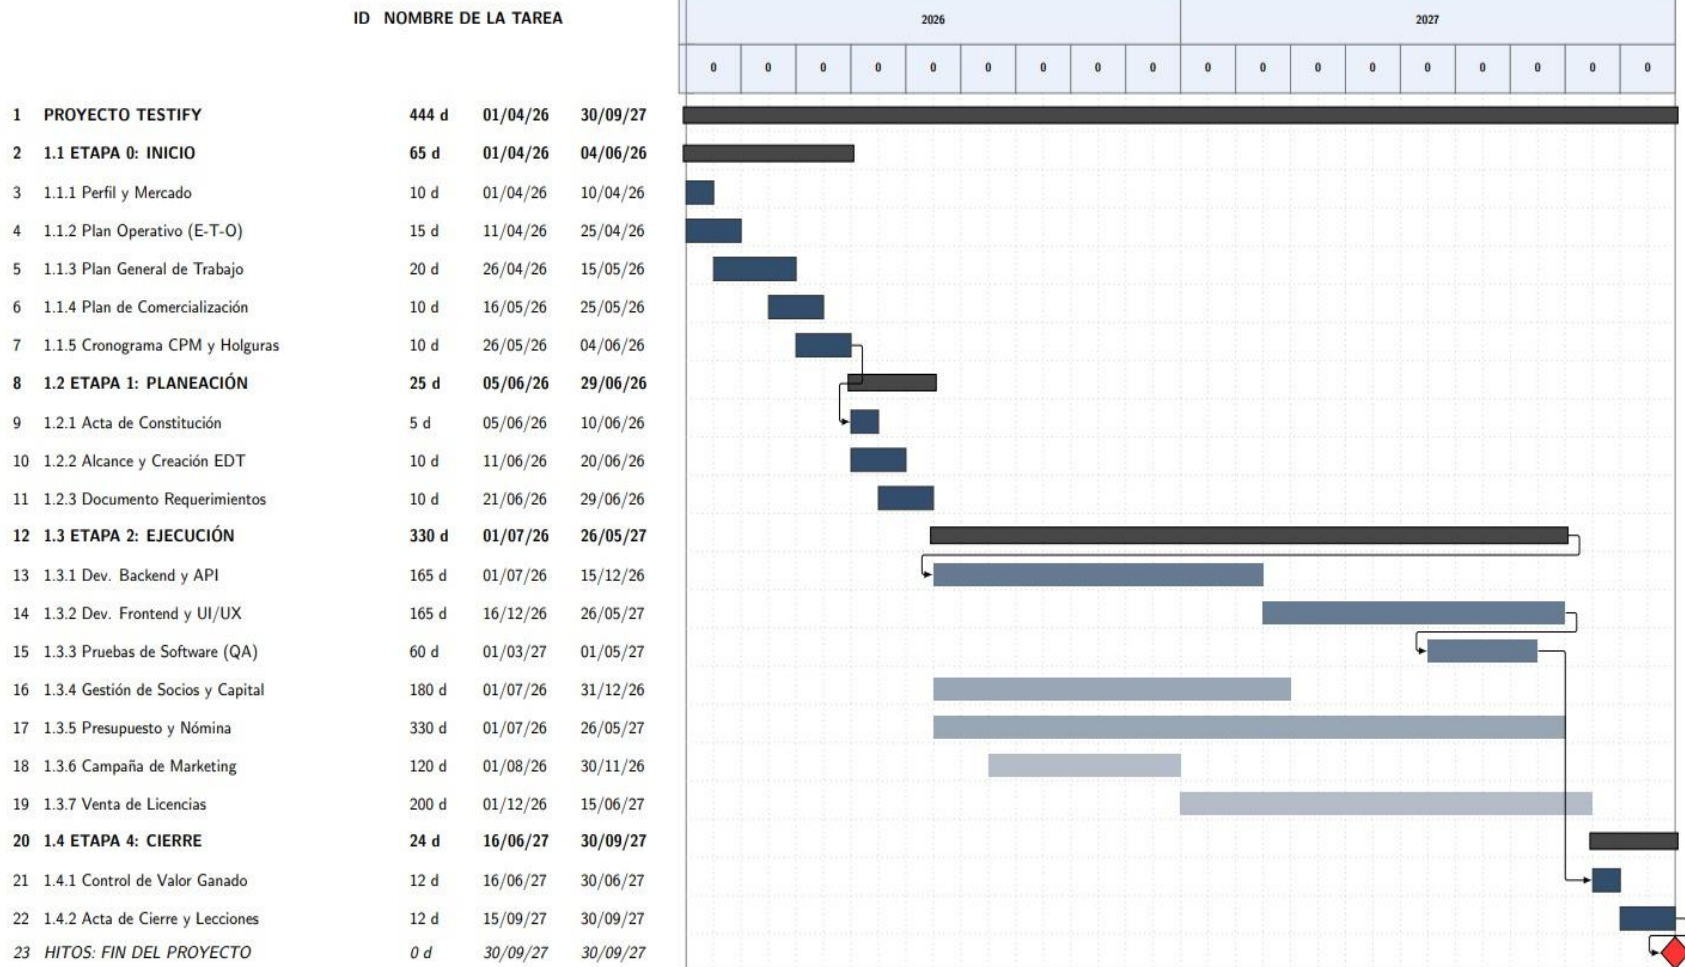



24. Análisis de los presupuestos

Presupuesto práctico		Presupuesto teórico	
Ruta Crítica	Plan de comercialización	\$1,227,500 mxn	
	Plan General de Trabajo	\$13,235,090 mxn	
Tiempo	873 días	Tiempo completo	330 días
Costo total			\$14,462,590 mxn

El presupuesto teórico del proyecto, calculado en \$14,462,590 MXN, considera un escenario ideal con una duración estimada de 330 días. Sin embargo, al analizar la ruta crítica del proyecto, se obtiene un tiempo real de ejecución de 873 días, lo que incrementa significativamente los costos operativos.

Se concluye que existe una disparidad significativa entre la planeación operativa ideal de 330 días y el cálculo matemático de la ruta crítica de 873 días. Financieramente, esto implica que, bajo un presupuesto fijo de \$14,462,590.00, el proyecto debe priorizar estrategias de compresión de tiempos. De lo contrario, la capacidad operativa diaria se ve reducida en un **62%** (pasando de un gasto diario de \$43,826 a \$16,566), lo que pone en riesgo la calidad del desarrollo y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Testify.

ETAPA 1 (PLANEACIÓN)



Etapa 1 (Planeación)

25. Acta de constitución del proyecto

	Plantilla No. 5 ET.1 Acta de constitución del proyecto Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E5 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de marzo del 2026
---	---

Enunciado del Trabajo del Proyecto

El proyecto es una plataforma de automatización impulsada por Inteligencia Artificial que transforma datos técnicos en reportes ejecutivos. Este se desea realizar en un año con el fin de detectar una problemática crítica en las empresas de TI en de la CDMX por la excesiva carga de trabajo manual y la falta de estandarización en la documentación de pruebas de software, esto genera retrasos en las entregas y posibles errores humanos. Es fundamental para la dirección por que representa una oportunidad estratégica de ser líderes en el sector tecnológico con un presupuesto de \$13,236,817 pesos mexicanos.

Caso del Negocio

El proyecto es rentable debido a que el 73.33% de los clientes potenciales encuestados muestran disposición de compra. En la proyección de ventas nos indica que anualmente tenemos una venta de más de 22 millones de pesos el primer año, lo que representa un margen de utilidad significativo frente al costo de desarrollo. Estratégicamente, posiciona a la organización como líder en el uso de IA aplicada a la documentación de QA en el mercado local.

Acuerdos

- 1 perfil del proyecto
- 1 título del proyecto
- 1 objetivo general
- 1 sector económico
- 1 giro empresarial
- 1 reporte de contribución al PIB
- 1 perfil del cliente
- 1 análisis de mercado TI



- 1 estudio de factibilidad
- 1 tabla de proyecciones financieras
- 1 tabla del análisis comparativo de la competencia
- 1 tabla del plan operativo
- 1 tabla del plan general de trabajo
- 3 diagramas de entrada, proceso y salida
- 3 listas de los recursos de entrada, proceso y salida
- 4 tablas de los recursos enlistados de entrada, proceso y salida
- 1 diagrama CPM
- 1 acta de constitución firmada
- 1 matriz de interesados
- 1 documento de alcance del software
- 1 diagrama EDT/WBS
- 1 plan de dirección integral
- 1 set de plantillas para usuarios
- 1 software único de pruebas (Testify)
- 1 módulo de IA para conclusiones
- 5 reportes de avance metodológico
- 1 proyecto de inversión técnica
- 1 prototipo funcional validado
- 1 plano operativo técnico
- 1 servidor PostgreSQL configurado
- 1 interfaz de usuario programada
- 3 módulos de seguridad configurados
- 1 diseño estructural completo
- 1 manual de estándares de proceso
- 1 reporte de integridad de datos
- 1 set de módulos desarrollados
- 1 reporte de validación de IA
- 5 protocolos de mantenimiento
- 1 documento de errores (QA)
- 15 reportes de pruebas unitarias
- 11 reportes de actualización
- 2 convenios de asociación
- 1 presupuesto de innovación
- 1 reporte de retorno de inversión
- 1 plan de adquisición de activos
- 1 tarifario oficial de Testify
- 4 reportes presupuestales
- 1 bitácora de administración
- 11 comprobantes de dispersión
- 11 balances generales



- 5 contratos laborales firmados
- 1 programa de capacitación integral
- 1 sistema de evaluación
- 5 perfiles de puesto validados
- 3 módulos formativos diseñados
- 1 manual de indicadores (KPIs)
- 15 reportes de entrevista
- 5 bitácoras de inducción
- 11 reportes de evaluación mensual
- 6 contratos de licencia firmados
- 1 reporte de posicionamiento
- 1 plan de post venta detallado
- 1 cartera de 20 prospectos
- 1 presentación ejecutiva (Pitch Deck)
- 1 manual de niveles de servicio
- 6 expedientes de contrato cerrados
- 10 bitácoras de demostración
- 6 reportes de satisfacción
- 1 tabla de checklist de verificación
- 1 bitácora de control de cambios
- 1 reporte de seguimiento de hitos
- 1 matriz de resultados finales
- 1 reporte de costos reales vs planeados
- 1 análisis de valor ganado
- 1 acta de cierre del proyecto firmada

Objetivos del Producto

- Automatización de reportes en formatos Word y ODF a partir de archivos CSV.
- Integración de un asistente de contenido basado en IA para resúmenes narrativos.
- Interfaz de usuario intuitiva con dashboards de trazabilidad.
- Compatibilidad con estándares de seguridad AES-256 y PostgreSQL.
- Disponibilidad de la plataforma del 99.5%

Objetivos del Proyecto

- Finalizar el desarrollo y pruebas en un periodo de 12 meses.
- Entregar el sistema funcional a las empresas.
- Entregar documentación técnica y manuales de usuario.



- Entregar certificados de cumplimiento de seguridad y accesibilidad.
- Mantener el costo de desarrollo dentro del presupuesto de 13.2 millones de pesos.
- Lograr la constitución legal y operativa de la empresa encargada del software.

Ámbito de aplicación

Empresas de TI ubicadas en la CDMX.

Actores clave (MERCADO META)

Cliente	<i>Empresas de servicios de software y departamentos de QA en la alcaldía Cuauhtémoc</i>
Patrocinador	<i>(SIGUIENTE CLASE)</i>
Gerente de proyecto	<i>Alexis Daniel Romero Razo</i>
Miembros del equipo de proyecto	<i>Lorena Sarahí Zepeda Carmona Eduardo Carbajal Mendoza Angela Cassandra Martínez Medina Estephany Muñoz Hernández</i>

Hitos del Proyecto

- Tema
- Título
- Objetivo
- Sector
- Giro
- PIB
- Cliente
- Mercado
- Aceptación del mercado
- Proyección de ventas
- Benchmarking
- Plan operativo
- Plan general de trabajo
- Plan de comercialización
- Cronograma de Actividades
- Red CPM
- Acta de constitución del proyecto
- Gestión de interesados
- Gestión del alcance
- EDT
- Gestión de dirección del proyecto



- Plantillas de requisitos
- Diseñar y desarrollar un software único
- Gestionar una innovación de IA
- Gestionar una innovación técnica de IA
- Gestionar el proyecto integral
- Realizar el proyecto de inversión técnica
- Desarrollar el prototipo funcional
- Realizar el plan operativo técnico
- Instalar la infraestructura de red
- Programar la interfaz de usuario
- Configurar los módulos de seguridad
- Diseñar la estructura funcional y técnica del software
- Gestionar la estandarización de procesos de reportes
- Supervisar la integridad de la base de datos y flujo
- Desarrollar los módulos de software
- Validar los algoritmos de IA para el mapeo de datos
- Estructurar los protocolos de mantenimiento y actualización
- Documentar las pruebas de errores y rendimiento
- Ejecutar las pruebas unitarias de los módulos
- Realizar las actualizaciones de seguridad en la BD
- Obtener afiliaciones con socios capitalistas
- Gestionar el presupuesto de innovación
- Realizar la proyección de recuperación financiera
- Determinar el capital para activos y equipo
- Definir el tarifario de licencias anuales
- Obtener el presupuesto trimestral de nómina
- Administrar el fondo de infraestructura física
- Ejecutar el pago mensual de salarios
- Realizar el balance de caja mensual
- Contratar personal especializado
- Capacitar al personal en metodologías y BD
- Establecer el sistema de evaluación del desempeño
- Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas
- Diseñar los talleres formativos de la arquitectura
- Estructurar los KPIs de productividad del equipo
- Realizar las entrevistas y pruebas técnicas
- Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal
- Aplicar las encuestas de desempeño mensuales
- Vender el licenciamiento anual a las empresas de TI
- Posicionar a Testify en el mercado de la CDMX
- Diseñar el plan de post venta y mantenimiento
- Realizar la prospección de clientes



- Desarrollar el pitch deck comercial de Testify
- Definir los niveles de soporte y acuerdos
- Cerrar los contratos legales con los clientes
- Ejecutar las demos técnicas para jefes de área gestionar encuestas de satisfacción y eficiencia
- Cheecklist de verificación
- Control de cambios
- Control de seguimiento
- Plantilla de resultados
- Plantilla de costos
- Plantilla de valor ganado
- Plantilla de acta de cierre

Exclusiones

- No incluye la provisión de hardware físico para los clientes
- No incluye el pago de servicios en la nube por parte de los clientes finales
- No incluye cambios en el sistema

Presupuesto del Proyecto

\$14,462,590,xn

Limitaciones, supuestos, riesgos y dependencias


Limitaciones	• <i>Tiempo de desarrollo estrictamente vinculado al calendario empresarial de 12 meses</i> • <i>El proyecto debe ejecutarse estrictamente con el presupuesto del proyecto que es de \$13,236,817 mxn</i>
Supuestos	• <i>Se contará con acceso ininterrumpido a las API de IA y servicios de AWS</i> • <i>Las empresas de TI encuestadas brindarán facilidades para el periodo de pruebas.</i> • <i>Se cuenta con la participación de los 5 integrantes de cada área</i>
Riesgos y dependencias	• <i>Inestabilidad en la integración de la IA con el formato de archivos CSV durante el desarrollo</i> • <i>Cambios imprevistos en las leyes de protección de datos personales en la CDMX que afecten el almacenamiento en la nube.</i> • <i>No se puede iniciar la comercialización sin el acta constitutiva de la empresa y los registros de marca.</i>

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal Mendoza



Estephany Muñoz
Hernández




Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

	Minuta No.5 ET.1 Acta de Constitución del Proyecto Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM5 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 25 de marzo del 2026
---	--

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto, definiendo el alcance general, objetivos, stakeholders principales, presupuesto estimado y la autorización formal del proyecto Testify.	La integrante Angela Martínez fue responsable de redactar el Acta de Constitución del Proyecto, integrando la información proporcionada por el equipo. Se acordó que el documento incluiría los objetivos, justificación, alcance, entregables principales, presupuesto estimado y roles del equipo. Asimismo, todos los integrantes revisaron el contenido y aprobaron el documento final.	3 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz Hernández



Lorena Sarahí Zepeda Carmona



Angela Cassandra Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza

26. Registro de interesados

		Plantilla No.6 ET.1 Registro de interesados Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E6 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de marzo del 2026						
Interesado	Compromiso					Poder/ Influencia	Interés	Estrategia
	Desconoce	Se resiste	Neutral	Apoya	Líder			
Director tecnológico					X,D	A	A	Gestionar de cerca
Jefe Tecnológico				X,D		B	A	Informar
Gerente tecnológico				X,D		B	B	Monitorear
Directora Operativa				X	D	A	A	Gestionar de cerca
Jefe Operativo				X,D		B	A	Informar
Gerente Operativo				X,D		B	B	Monitorear
Director de Finanzas				X	D	A	A	Gestionar de cerca
Jefe de Finanzas				X,D		B	A	Monitorear
Gerente de Finanzas				X,D		B	B	Informar
Directora de Recursos humanos				X	D	A	A	Gestionar de cerca
Jefe de Recursos humanos				X,D		B	A	Informar
Gerente de Recursos humanos				X,D		B	B	Monitorear
Directora Comercial				X	D	A	A	Gestionar de cerca
Jefe Comercial				X,D		B	A	Informar
Gerente Comercial				X,D		B	B	Monitorear
Socios capitalistas			X	D		A	B	Mantener satisfecho
Clientes Meta	X			D		A	A	Gestionar de cerca

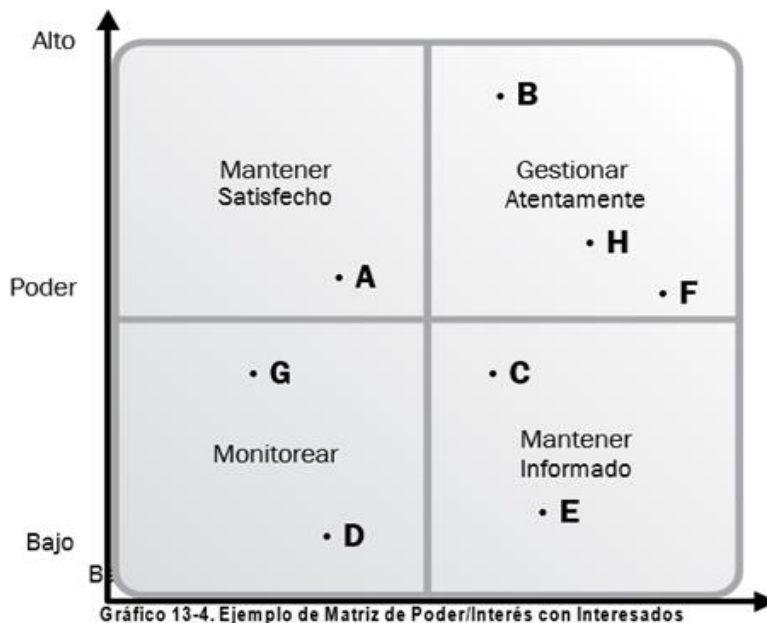


Gráfico 13-4. Ejemplo de Matriz de Poder/Interés con Interesados

Matriz de interesados compromiso / estrategia


Interesado	Compromiso					Poder / Influencia	Interés	Estrategia
	Desconoce	Se resiste	Neutral	Apoya	Líder			
Ejemplo de Interesado 1		X		D		A	B	Mantener satisfecho
X: Actual ; D: deseado ; A: Alto ; B: Bajo Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B)								

Firmas de aprobación

Patrocinador del proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina




Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Eduardo Carbajal Mendoza



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No.6 ET.1 Gestión de Interesados**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM6

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 10 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Identificación, análisis y clasificación de los interesados del proyecto, así como la elaboración de la matriz de interesados para determinar su nivel de influencia, interés y estrategias de gestión.	La integrante Estephany Muñoz fue responsable de desarrollar la plantilla de gestión de interesados, identificando a los actores clave del proyecto (clientes, equipo de desarrollo, inversionistas y usuarios finales). Se acordó clasificar a cada interesado según su nivel de poder. El equipo validó la información y aprobó la matriz.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

27. Gestión del Alcance del Proyecto

	Plantilla No. 7 ET.1 Gestión del Alcance del Proyecto Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E7 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026
---	--

1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en una plataforma web con inteligencia artificial para la generación automatizada de documentación de pruebas de software en empresas de TI. El mercado meta son las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez en la CDMX, con un presupuesto de \$14,462,590 MXN.

ATRIBUTO DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO
Nombre del proyecto	Testify
Acrónimo	TFY
Sector / giro	Tecnologías de la información / servicios
Mercado Meta	6 empresas de TI en la alcaldía Cuauhtémoc
Duración total	12 meses
Presupuesto	\$14,462,590 MXN
Stack Tecnológico	AWS, PostgreSQL, APIs de IA, Python y Frameworks web
Metodología	Scrum

2. Entregables principales del Proyecto

NO.	ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	ÁREA RESPONSABLE
1	Software Testify	Plataforma funcional en la nube	Tecnológico
2	Módulo de IA	Generación automática de reportes	Tecnológico
3	MVP	Prototipos funcional validado	Tecnológico
4	Base de Datos	Sistema PostgreSQL configurado	Tecnológico



5	Manual Técnico	Documentación del Sistema	Operativo
6	Reportes QA	Resultado de pruebas	Operativo
7	Plan Comercial	Estrategia de mercado	Comercial
8	Contratos de venta	Licencias vendidas	Comercial
9	Plan de soporte	Servicio post-venta	Comercial

3. Criterios de Aceptación

ENTREGABLE	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESPONSABLE
Software Testify	Funciona al 100% sin errores críticos	Cliente
Módulo de IA	Genera reportes en un 95% y que sean correctos	QA
MVP	Validado al 100% por usuarios piloto	Cliente
Base de Datos	Almacenamiento al 100%	DevOps
Manual Técnico	Completo al 100% y entendible ante los usuarios	Operativo
UI	Fácil navegación y uso al 95%.	Usuario Final

4. Inclusiones (Lo que si incluye en el proyecto)

ÁREA	TRABAJO INCLUIDO
Tecnológica	• Desarrollo de Software • Plan operativo • Plan general de trabajo • Plan de comercialización • Estudio y estratificación de mercado • El código fuente esta registrado como inautor
Operativa	• Diseño de Software • Documentación de pruebas y validación • Manual técnico
Fianciera	• Gestión de presupuesto • Afiliaciones con patrocinadores • Proyección financiera • Esquema de pagos • Balances generales
Recursos Humanos	• Contratación de personal • Capacitación al personal



	• Diseño de talleres formativos • Encuestas
Comercial	• Ventas del software • Marketing • Posicionamiento en el mercado

5. Exclusiones (lo que no incluye en el proyecto)

EXCLUSIÓN	JUSTIFICACIÓN
Desarrollo de hardware	No es objetivo del proyecto
Soporte limitado	Solo soporte definido por SLA
Implementación fuera de CDMX	Alcance geográfico limitado
Personalización Total del Software	Solo plantillas definidas
Solo en empresas de TI	Solo se venderá el software a empresas de TI por el objetivo del proyecto

6. Restricciones del Proyecto

NO.	RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	IMPACTO
1	Presupuesto	Solo tenemos un límite de presupuesto de \$14,462,590 MXN	Económico	Alto
2	Tiempo	Lo tenemos que realizar en un periodo de 12 meses.	Temporal	Alto
3	Recursos humanos	Tenemos un equipo limitado que se compro y se contrato	Organizacional	Medio
4	Tecnología	Se tiene una dependencia solamente con AWS	Técnica	Alto
5	Mercado	Solo esta enfocado en la CDMX como mercado meta, objetivo y potencial	Comercial	Medio

7. Supuestos del Proyecto

SUPUESTO	DESCRIPCIÓN
Disponibilidad de equipo	Personal contratado a tiempo
Infraestructura	AWS disponible sin fallos
Clientes	Aceptación del 73% del mercado
Tecnología	APIs de IA funcionales
Financiamiento	Recursos disponibles y disponibilidad de financiamiento antes de la Etapa 2.

8. Supuestos del Proyecto

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Solicitud	El cliente solicita un cambio oportuno en el software
2	Evaluación	Se analiza el impacto que puede tener
3	Aprobación	El comité decide el cambio adecuado
4	Implementación	Se ejecuta el cambio a realizar
5	Validación	Se verifica el resultado por el cliente y funcionamiento correcto del mismo
6	Documentación	Se actualiza el proyecto

9. Validación y alcance


ACTIVIDAD DE VALIDACIÓN	DESCRIPCIÓN
Revisión de entregables	Validación con cliente
Pruebas funcionales	QA verifica el funcionamiento del software
Aprobación formal de los líderes	Firma de actas por parte del líder, el patrocinador y los directores para avalar que todo se entregó correctamente
Aprobación formal	Cliente acepta los entregables en tiempo y forma

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto



*Angela Cassandra
Martínez Medina*



*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*



Eduardo Carbajal Mendoza



*Estephany Muñoz
Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No. 7 ET.1 Gestión del Alcance del Proyecto**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM7

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 27 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración de la plantilla de gestión de alcance del proyecto, incluyendo definición de entregables, criterios de aceptación, inclusiones, exclusiones, restricciones, supuestos y control de cambios.	La integrante Cassandra Martínez fue responsable de desarrollar la plantilla de gestión del alcance, tomando como base la información del proyecto Testify y el plan general de trabajo. Se acordó estructurar el documento conforme a los lineamientos de gestión de proyectos, asegurando la correcta delimitación del alcance. El equipo validó que la información fuera coherente con los objetivos, entregables y restricciones previamente definidos.	5 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández


Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

28. EDT

	Plantilla No. 8 ET.1 EDT Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E8 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026
---	---

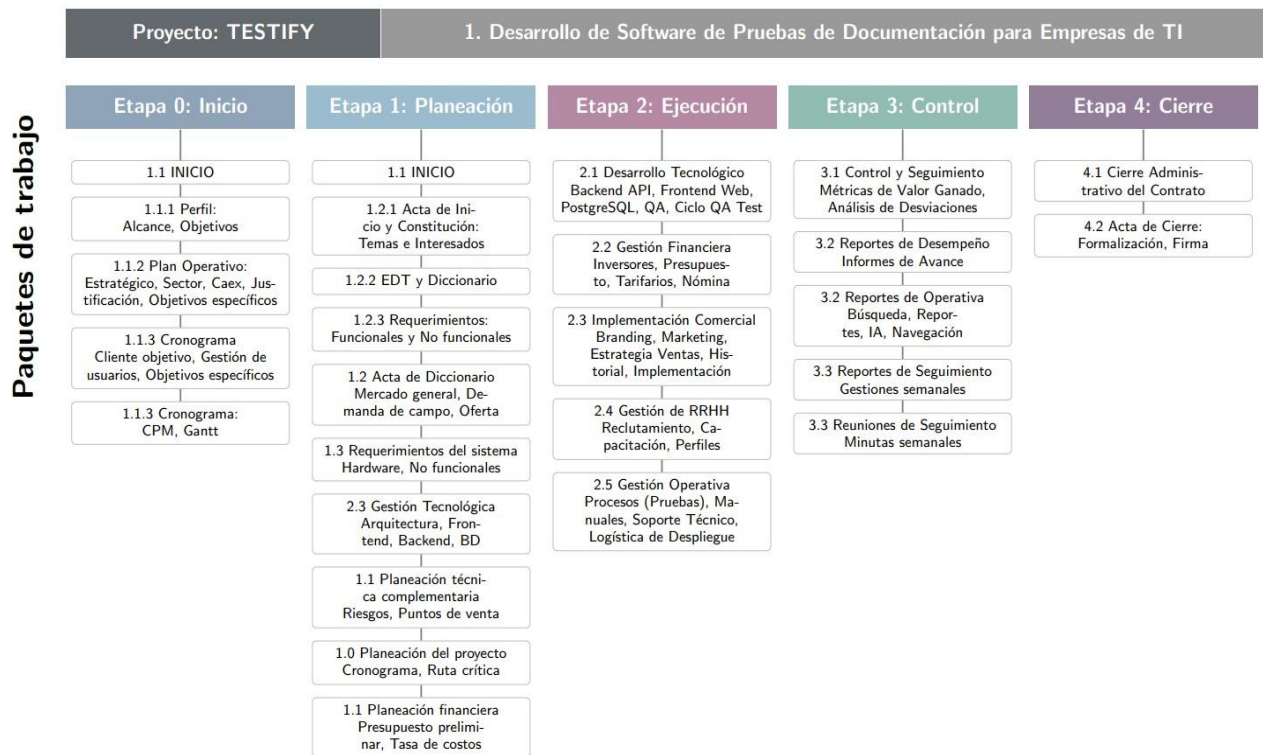

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal Mendoza

Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No. 8 ET.1 EDT**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM8

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 27 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición y descomposición jerárquica del alcance total del proyecto Testify para la creación de la EDT.	Eduardo Carbajal Mendoza realizó de manera individual la sesión técnica para desglosar el proyecto en componentes manejables. Se acordó aplicar la Regla del 100%, validando que los entregables técnicos (IA y base de datos) quedaran correctamente estructurados sin intervención de otros miembros del equipo.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



29. Plan Dirección de Proyectos

	Plantilla No. 9 ET.1 Plan Dirección de Proyectos Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E9 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 25 de abril del 2026
--	---

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha
1.0	Alexis Daniel Romero Razo	Equipo de proyecto		25 de abril de 2026

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Tetify	TFY

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO		ENFOQUE MULTIFASE	
Fase del Proyecto (1er Nivel EDT)	Entregable Principal de la Fase	Consideraciones para la Iniciación	Consideraciones para el Cierre
1. Gestión del Proyecto	✓ Acta de Constitución del Proyecto ✓ Enunciado del Alcance del Proyecto ✓ EDT/WBS ✓ Diccionario EDT ✓ Cronograma ✓ Presupuesto	El inicio depende de la aprobación del acta de constitución del proyecto y la definición de objetivos y alcance	Validación de todos los documentos de planeación del proyecto y autorización para continuar con la ejecución
2. Contratos	✓ Contratos con proveedores tecnológicos como AWS y herramientas de desarrollo ✓ Contrato de posibles clientes	El inicio depende de la identificación de proveedores y acuerdos comerciales necesarios para el	Firma y validación de contratos necesarios para asegurar recursos y continuidad del proyecto

		desarrollo del proyecto	
3. Curso de Gestión de Proyectos	✓ Informes de las sesiones ✓ Asignación de recursos humanos ✓ Asignación de roles y responsabilidades ✓ Estructura organizacional	El inicio depende de la disponibilidad del equipo de trabajo y la definición de roles dentro del proyecto	Confirmación de que todos los recursos están asignados correctamente y preparados para la ejecución
4. Curso de Gestión de Proyectos usando MS Project	✓ Cronograma detallado del proyecto elaborado en MS Project	El inicio depende de la definición de la EDT y actividades del proyecto	Validación del cronograma final y su alineación con los objetivos del proyecto
5. Informes	✓ Informe Final del proyecto y reportes de desempeño	El inicio depende de la recopilación de información durante la ejecución y control del proyecto	Entrega del informe final y aprobación del cliente, permitiendo el cierre formal del proyecto

PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PROCESO	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN	HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS	INPUTS	MODO DE TRABAJO (Mediante)	OUTPUTS
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	Una sola vez, al inicio del proyecto	Plantillas de gestión de proyectos	Idea del proyecto, necesidades del cliente	Reuniones entre el patrocinador y el equipo	Acta de constitución del proyecto
Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto	Una sola vez, al inicio del proyecto	Plantillas, análisis de requisitos	Acta de constitución, requerimientos	Reuniones del equipo de proyecto	Documento de alcance del proyecto
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	Al inicio del proyecto, actualizable	Plantillas, metodologías ágiles (Scrum)	Acta de constitución, alcance preliminar	Reuniones del equipo	Plan de dirección del proyecto
Planificación del Alcance	Inicio del proyecto	Plantillas, análisis de requisitos	Alcance preliminar, plan del proyecto	Trabajo colaborativo	Plan de gestión del alcance
Crear EDT (WBS)	Inicio del proyecto	Técnica de descomposición, diagramas	Alcance del proyecto	Reuniones del equipo	EDT y diccionario EDT
Desarrollo del Cronograma	Inicio del proyecto	MS Project, diagramas de red	EDT, actividades del proyecto	Planeación del equipo	Cronograma del proyecto
Preparación del Presupuesto de Costos	Inicio del proyecto	Estimación de costos, hojas de cálculo	Cronograma, recursos	Análisis financiero	Presupuesto del proyecto
Planificación de la Calidad	Inicio del proyecto	Estándares de calidad, métricas	Plan del proyecto	Definición de estándares	Plan de calidad



Planificación de los Recursos	Inicio del proyecto	Organigramas, descripciones de puesto	Plan del proyecto	Asignación de roles	Roles y responsabilidades
Planificación de las Comunicaciones	Durante todo el proyecto	Herramientas de comunicación, reuniones	Plan del proyecto	Reuniones periódicas	Plan de comunicaciones
Planificación de la Gestión de Riesgos	Durante el proyecto	Análisis de riesgos	Plan del proyecto	Identificación y evaluación de riesgos	Plan de gestión de riesgos
Planificar Compras y Adquisiciones	Durante el proyecto	Análisis make or buy, cotizaciones	Alcance, recursos	Negociación con proveedores	Plan de adquisiciones
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto	Durante todo el proyecto	Metodología Scrum	Plan del proyecto	Sprints y reuniones de seguimiento	Entregables del proyecto
Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto	Durante todo el proyecto	Valor ganado, indicadores (CPI, SPI)	Datos de desempeño	Monitoreo continuo	Reportes de avance
Informar el Rendimiento	Durante la ejecución	Reportes, reuniones	Datos del proyecto	Presentación de avances	Informes de rendimiento



ENFOQUE DE TRABAJO

El proyecto Testify se desarrollará bajo un enfoque estructurado con apoyo de metodologías ágiles (Cascada), permitiendo una ejecución organizada, iterativa y con mejora continua. El equipo de proyecto trabajará de manera colaborativa, asegurando el cumplimiento de los objetivos en términos de alcance, tiempo, costo y calidad.

1. Inicialmente en equipo se establecen objetivos, entregables, restricciones y supuestos para delimitar el proyecto.
2. Se elaboran los documentos clave como plan del proyecto, cronograma, presupuesto y riesgos.
3. Se definen responsabilidades del equipo para cada entregable.
4. El proyecto se desarrolla mediante sprints, generando entregables parciales.
5. Se realizan reuniones periódicas para evaluar avances y tomar acciones correctivas.
6. Se identifican riesgos y se controlan los cambios mediante un proceso formal.
7. Se revisa que cada entregable cumpla con los criterios establecidos.
8. Se entrega el producto final y se realiza el cierre formal.

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE

La gestión de líneas base del proyecto Testify permitirá mantener el control del desempeño en términos de alcance, tiempo y costo. Estas líneas base serán utilizadas como referencia para medir el avance real del proyecto y detectar desviaciones.

El informe de desempeño del proyecto será presentado de forma semanal en reuniones de seguimiento y contendrá la siguiente información:

- **Estado actual del proyecto**

1. Situación del alcance: comparación entre avance real y planificado.
2. Eficiencia del cronograma: SV (Variación del Cronograma) y SPI (Índice de Desempeño del Cronograma).
3. Eficiencia del costo: CV (Variación del Costo) y CPI (Índice de Desempeño del Costo).
4. Cumplimiento de objetivos de calidad.

- **Reporte de progreso**

1. Avance del periodo: porcentaje planificado vs real.
2. Valor ganado del periodo: valor planificado y real.
3. Costos del periodo: costo planificado vs real.



4. Indicadores del cronograma: SV y SPI del periodo.

5. Indicadores de costo: CV y CPI del periodo.

- **Pronósticos:**

1. Pronóstico de costos: EAC, ETC y VAC.

2. Pronóstico de tiempo: fecha planificada vs estimada de finalización.

- **Otros:**

1. Problemas y pendientes del proyecto.

2. Acciones correctivas.

3. Curva S del proyecto.

REVISIÓN DE GESTIÓN

TIPO DE REVISIÓN	CONTENIDO	EXTENSIÓN O ALCANCE	OPORTUNIDAD
Reuniones de coordinación del equipo	Revisión de acuerdos previos y avances	Participa todo el equipo, se asignan nuevas tareas	Semanal (lunes)
Reunión de seguimiento del proyecto	Informe de desempeño (alcance, tiempo, costo)	Evaluación del avance general del proyecto	Semanal
Reuniones extraordinarias	Análisis de problemas o riesgos específicos	Solo equipo involucrado en la situación	Cuando se requiera
Reuniones con el cliente	Presentación de avances y validación	Revisión de entregables y retroalimentación	Según solicitud
Comunicaciones informales	Intercambio de información rápida	Facilita coordinación diaria	En cualquier momento

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PLAN	ADJUNTO (SÍ/NO)
1. Plan de Gestión del Alcance	Sí
2. Plan de Gestión de Requisitos	Sí
3. Plan de Gestión del Cronograma	Sí
4. Plan de Gestión de Costos	Sí
5. Plan de Gestión de la Calidad	No



6. Plan de Gestión de los Recursos	Sí
7. Plan de Gestión de las Comunicaciones	No
8. Plan de Gestión de las Adquisiciones	No
9. Plan de Gestión de los Riesgos	No
10. Plan de Involucramiento de los Interesados	Sí
11. Plan de Gestión de Cambios	No
12. Plan de Gestión de la Configuración	No
13. Línea Base del Alcance	Sí
14. Línea Base del Cronograma	No
15. Línea Base de Costo	Sí
16. Línea Base para la Medición del Desempeño	No
17. Descripción del Ciclo de Vida del Proyecto	Sí
18. Enfoque de Desarrollo	Sí

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

Eduardo Carbajal Mendoza

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No. 9 ET.1 Plan Dirección de Proyectos**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM9

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 27 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto, incluyendo ciclo de vida, procesos de gestión, enfoque de trabajo, gestión de líneas base, revisiones de gestión y planes adjuntos.	El líder de proyecto Daniel Romero fue responsable de desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. Se acordó estructurar el documento conforme a los lineamientos de gestión de proyectos, integrando todos los componentes necesarios todas las etapas correctas. El equipo validó que el contenido estuviera alineado con los objetivos, alcance, cronograma y presupuesto establecidos.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



30. Gestión de Requerimientos

	Plantilla No. 10 ET.1 Gestión de Requerimientos Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E10 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026
---	---

1. Información general del proyecto

CAMPO	INFORMACIÓN
Nombre del proyecto:	Diseño y desarrollo de un software único de pruebas de documentación para las empresas de TI en la CDMX.
Responsable del proyecto:	Alexis Daniel Romero Razo.
Fecha de inicio:	3/Febrero/2026
Versión del documento:	V1.0.
Descripción general:	Sistema basado en Inteligencia Artificial diseñado para optimizar los flujos de trabajo de documentación de pruebas en empresas de tecnología. El software automatiza la creación de reportes ejecutivos y técnicos, transformando datos de pruebas (CSV) en documentos narrativos (Word/PDF), aumentando la eficiencia operativa y reduciendo errores manuales.



2. Tabla de Requerimientos

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PRIORIDAD	RESPONSABLE	ESTADO
RQ-01	Registro y Autenticación	Permitir el acceso mediante credenciales seguras.	Funcional	Alta	Daniel	Terminado
RQ-02	Gestión de Perfiles	Roles de administradores, testers y desarrolladores.	Funcional	Media	Estephany	En proceso
RQ-03	Panel de Control	Interfaz centralizada para visualizar resultados.	Funcional	Alta	Estephany	En proceso
RQ-04	Generación con IA	Automatización de reportes desde archivos CSV.	Funcional	Alta	Daniel	En proceso
RQ-05	Clasificación de Errores	Categorización de hallazgos por severidad.	Funcional	Media	Estephany	Pendiente
RQ-06	Exportación de Reportes	Generación de archivos en Word y PDF.	Funcional	Alta	Estephany	Pendiente
RQ-07	Integración de Herramientas	Conexión con GitHub y Jira Enterprise.	Funcional	Media	Daniel	Terminado
RQ-08	Base de Datos Central	Persistencia de datos en servidor PostgreSQL.	Funcional	Alta	Estephany	Terminado
RQ-09	Actualización Real-Time	Sincronización inmediata del panel de control.	Funcional	Media	Estephany	En proceso
RQ-10	Historial de Versiones	Acceso a reportes y	Funcional	Media	Estephany	Pendiente

		versiones anteriores.				
RQ-11	Edición Colaborativa	Consulta y edición simultánea por el equipo.	Funcional	Alta	Estephany	Pendiente
RQ-12	Notificaciones Críticas	Alertas automáticas sobre fallas o terminación.	Funcional	Media	Estephany	En proceso
RQ-13	Disponibilidad (Uptime)	Garantizar el 99.5% de tiempo de actividad.	No Funcional	Alta	Daniel	En proceso
RQ-14	Compatibilidad Web	Soporte para Chrome, Edge, Firefox y Safari.	No Funcional	Media	Estephany	En proceso
RQ-15	Tiempo de Respuesta	Máximo de 3 segundos por acción.	No Funcional	Media	Estephany	En proceso
RQ-16	Seguridad Cloud	Autenticación multifactor y encriptación.	No Funcional	Alta	Daniel	En proceso
RQ-17	Escalabilidad	Ajuste automático de recursos según demanda.	No Funcional	Alta	Daniel	Pendiente
RQ-18	Accesibilidad	Cumplimiento con pautas WCAG 2.1.	No Funcional	Bajo	Estephany	Pendiente
RQ-19	Cifrado de Información	Protocolos HTTPS/TLS y AES-256.	No Funcional	Alta	Daniel	Terminado
RQ-20	Logs de Auditoría	Registro inalterable de acciones críticas.	No Funcional	Media	Estephany	Pendiente
RQ-21	Portabilidad Cloud	Flexibilidad entre AWS, Azure y GCP.	No Funcional	Baja	Daniel	Pendiente
RQ-22	Metodología Scrum	Entregas funcionales cada 15 días.	No Funcional	Media	Daniel	En proceso



RQ-23	Respaldo de Datos	Backups automáticos diarios en la nube.	No Funcional	Alta	Daniel	Terminado
RQ-24	Gobierno de TI	Alineación con normas ISO/IEC 27001.	No Funcional	Media	Daniel	En proceso

3. Definición de Campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN
ID:	Código único del requerimiento
Nombre:	Título breve del requerimiento
Descripción:	Explicación clara del requerimiento
Tipo:	Funcional / No funcional
Prioridad:	Alta / Media / Baja
Responsable:	Encargado del requerimiento
Estado:	Pendiente / En proceso / Terminado

4. Control de Cambios

Fecha	ID Req.	Cambio realizado	Impacto (Tiempo/Costo)	Aprobado por
13/04/2026	RQ-03	Ajuste en el algoritmo de extracción de texto de la IA.	Tiempo: +2 días de desarrollo. Costo: Sin impacto.	Daniel Romero
18/04/2026	RQ-04	Rediseño de la interfaz del Panel de Control para móviles.	Tiempo: +3 días. Costo: \$12,450 MXN (pago de horas extra al equipo operativo).	Estephany Muñoz

22/04/2026	RQ-08	Cambio de servidor de base de datos local a instancia AWS RDS.	Tiempo: -1 día. Costo: \$4,500 MXN mensuales adicionales de consumo cloud.	Daniel Romero
25/04/2026	RQ-01	Implementación de validación de correo por token.	Tiempo: +1 día. Costo: Sin impacto.	Estephany Muñoz

5. Observaciones

- **Priorización de la Ruta Crítica:** Se ha dado prioridad absoluta a los requerimientos **RQ-03 (IA)** y **RQ-08** (Base de Datos), ya que cualquier retraso en estos módulos compromete el cronograma de 12 meses planeado para el desarrollo.
- **Ajustes de Infraestructura:** La migración a **AWS RDS** (Control de Cambio V1.2) asegura el cumplimiento del requerimiento no funcional de disponibilidad del **99.5%**, aunque represente un incremento operativo mensual de **\$4,500 MXN**.
- **Gestión de Talento Operativo:** La carga de trabajo detectada en el rediseño de la interfaz móvil sugiere que el equipo operativo deberá optimizar los sprints de **Scrum** para no exceder el presupuesto de horas hombre previsto.
- **Seguridad y Cumplimiento:** Con la implementación del cifrado **AES-256** y la validación por token, el proyecto se alinea preventivamente con las normas ISO/IEC 27001 antes de pasar a la fase de pruebas con clientes piloto.

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

	Minuta No. 10 ET.1 Gestión de Requerimientos Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM10 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 27 de abril del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición y arquitectura para guardar la información en la nube	Daniel y Estephany acordaron migrar la base de datos de un entorno local a una instancia de AWS RDS para asegurar la disponibilidad del 99.5%.	2 días
Revisión de Algoritmos de IA	Daniel presentó el ajuste en el motor de mapeo para evitar errores de lectura en archivos CSV con formatos variables. Estephany estuvo de acuerdo con el mapeo por lo cual se aplicara.	3 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza

ETAPA 2 (EJECUCIÓN)



Etapa 2 (Ejecución)

31. Programa Idea del negocio

	Plantilla No.11 Programa 1 ET.0 Idea del Negocio Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E11 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026
---	--

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Tema	3 días	Laptop	\$2,760	Tema definido	Tecnológico
Título	2 días	Laptop	\$1,840	Título oficial	Tecnológico
Sector	2 días	INEGI	\$1,840	Sector definido	Tecnológico
Cliente	2 días	CRM	\$1,840	Perfil del cliente	Comercial
PIB	2 días	Excel	\$1,840	Impacto PIB	Tecnológico
Las actividades nuevas					
Investigación de deficiencias en procesos de QA.	1 día	Internet	\$920	Reporte técnico	Daniel Romero
<i>Análisis de tiempos en documentación manual.</i>	1 día	Laptop	\$920	Tabla comparativa	Daniel Romero
Selección de la automatización con IA como eje.	1 día	Laptop	\$920	Documento Tema	Daniel Romero
Lluvia de ideas para el nombre del software.	1 día	Oficina	\$920	Lista de nombres	Daniel Romero
Validación de disponibilidad de marca Testify.	1 día	Internet	\$920	Título aprobado	Daniel Romero



Identificación del giro de servicios de TI.	1 día	DENUE	\$920	Ficha de giro	Daniel Romero
Determinación del stack para desarrollo web.	1 día	Laptop	\$920	Reporte de sector	Daniel Romero
Mapeo de agencias de software en la CDMX.	1 día	Google Maps	\$920	Base de datos	Sarahi Zepeda
Estratificación por alcaldías	1 día	Laptop	\$920	Perfil del cliente	Sarahi Zepeda
Consulta de datos macroeconómicos de TI.	1 día	Internet	\$920	Datos PIB sector	Daniel Romero
Cálculo de la contribución del proyecto al PIB.	1 día	Laptop	\$920	Reporte de PIB	Daniel Romero
TOTAL	11 días		\$10,120		

Firmas de aprobación □

Patrocinador del Proyecto

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

Eduardo Carbajal Mendoza

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No.11 Programa 1 ET.0 Idea del negocio**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM11

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 30 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación y cierre de las actividades de cimentación para la idea de negocio "Testify".	El equipo directivo se reunió vía remota para validar que las actividades de investigación (actividades nuevas) cumplieron con el rigor del método en cascada. Se acordó que la investigación de problemáticas de QA en la CDMX fue la base sólida que permitió definir el Tema , y que sin el análisis de tiempos manuales no se habría podido justificar el Título y enfoque del software. Asimismo, Sarahí Zepeda confirmó que la estratificación geográfica fue necesaria antes de formalizar al Cliente meta. Finalmente, se aprobó el reporte del PIB tras cruzar los datos del INEGI con la rentabilidad esperada, dando por concluida esta fase secuencial para dar paso al Programa de Mercado.	11 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

32. Programa Mercado

		Plantilla No.12 Programa 2 ET.0 Mercado Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E12 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026			
Actividad	Tiempo	Recursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Mercado objetivo	2 días	Laptop, viáticos, internet.	\$1,840	1 análisis de mercado objetivo	Tecnológico
Mercado meta	2 días	Laptop, viáticos, internet.	\$1,840	1 análisis de mercado meta	Tecnológico
Mercado potencial	1 día	Laptop, viáticos, internet.	\$920	1 análisis de mercado potencial	Tecnológico
Benchmarking	2 días	Laptop, viáticos, internet.	\$1,840	1 análisis comparativo de competencia	Tecnológico
Las actividades realizadas					
Investigar el mercado objetivo en la CDMX.	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	Reporte de datos iniciales	Tecnológico
Buscar empresas de TI candidatas en la región.	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	Directorio de empresas objetivo	Tecnológico
Investigar las características del mercado meta.	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	Perfil de cliente ideal	Tecnológico

Filtrar y seleccionar las 41 empresas de TI.	1 día	Laptop, Base de datos, Viáticos	\$920	Lista final de mercado meta	Tecnológico
Investigación y proyección de demanda del mercado potencial.	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	Tabla de estimación potencial	Tecnológico
Investigar herramientas competidoras en el mercado.	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	Reporte de competidores	Tecnológico
Armar la matriz comparativa de ventajas técnicas.	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	Matriz de benchmarking final	Tecnológico
TOTAL	7 días		\$6,440		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina


Eduardo Carbajal Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

	Minuta No.12 Programa 2 ET.0 Mercado Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM12 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición de mercado objetivo, meta, potencial y benchmarking para Testify.	El líder del proyecto Daniel acordó enfocar los esfuerzos en identificar las necesidades de estas organizaciones respecto a la optimización de sus flujos de documentación de pruebas, con la finalidad de asegurar que las proyecciones de mercado potencial y el benchmarking competitivo sirvan como una base sólida para el despliegue del proyecto.	7 días

Firmas

 	 	
Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto	Estephany Muñoz Hernández	Lorena Sarahí Zepeda Carmona
 	 	
Angela Cassandra Martínez Medina	Eduardo Carbajal Mendoza	

33. Programa Planes

	Plantilla No.13 Programa 3 ET.0 Planes Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E13 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026
---	--

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Plan Operativo	14 días	Laptop Viaticos	\$12,880	1 Tabla de plan operativo (45 Estrategias (E-T-O))	Operativo RH Tecnológico Fianzas Comercial
Plan general de trabajo	14 días	Laptop Viaticos	\$12,880	1 Documento de plan general de trabajo	Tecnologico
Plan de comercialización	7 días	Laptop Viaticos	\$6,440	3 Diagramas, 1 de entrada, 1 de proceso y 1 de salida, 3 listas de recursos y 3 tablas de costos	Comercial
Cronograma CPM	1 día	Laptop Viaticos	\$920	1 Diagrama de ruta critica	Tecnologico
Las actividades nuevas					
Reunión de alineación de estrategias (E-T-O)	6 días	Laptop Viaticos	\$5,520	1 Documento de Word compartido	Operativo RH Tecnológico Fianzas Comercial
Integración colaborativa de tiempos y costos por etapa	6 días	Laptop Viaticos	\$5,520	1 Borrador del plan general	Tecnologico
Identificación de recursos	6 días	Laptop Viaticos	\$5,520	3 Listas de recursos preliminares	Operativo



(Entrada/Proceso/Salida)					
Elaboración de tablas de costos comerciales	6 días	Laptop Viaticos	\$5,520	3 Tablas de costos preliminares	Finanzas
Revisión lógica de secuencia y precedencias (Vía Discord)	6 días	Laptop Viaticos, Internet	\$5,520	1 Lista de precedencias lógicas	Tecnologico
Edición y validación conjunta de los entregables	6 días	Laptop Viaticos	\$5,520	4 Planes validados y avalados	Tecnologico
TOTAL	36 días		\$33,120		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

Eduardo Carbajal Mendoza

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No.13 Programa 3 ET.0 Planes**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM13

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 30 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición y costeo de las actividades nuevas para el Programa de Planes.	El integrante Eduardo Carbajal Mendoza fue el responsable de identificar, estructurar y presupuestar las actividades nuevas (tareas extra) que el equipo llevó a cabo para poder concretar el Plan Operativo, el Plan General de Trabajo, el Plan de Comercialización y el Cronograma. Se acordó documentar el trabajo "tras bambalinas" (reuniones de alineación, revisión de lógicas y consolidación de costos) y calcular su valor utilizando la tarifa estándar de \$920 MXN por día, asegurando así la exactitud y el cuadro perfecto del presupuesto en la Etapa 0.	36 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

34. Programa Planeaciones

	Plantilla No.14 Programa 4 ET.1 Planeaciones Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E14 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 30 de abril del 2026
---	--

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Acta constitución	3 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$4,110	1 acta de constitución firmada	Tecnológico
Gestión de interesados	4 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$5,480	1 matriz de interesados	Tecnológico
Gestión del alcance	5 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$6,850	1 plantilla del alcance del proyecto	Tecnológico
EDT	4 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$5,480	1 diagrama EDT	Tecnológico
Plan Dirección de Proyectos	6 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$8,220	1 Plan de dirección	Tecnológico
Gestión de requerimientos	3 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$4,110	1 plantilla de gestión de requerimientos	Tecnológico
Nuevas Actividades					
Definir los objetivos del proyecto y del producto	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 lista con los objetivos	Tecnológico
Identificar los actores clave	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla con los actores clave	Tecnológico

Definir los hitos del proyecto	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 lista con los hitos del proyecto	Tecnológico
Identificar las limitaciones, supuestos, riesgos y dependencias del proyecto	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 lista con los supuestos, limitaciones, riesgos y dependencias del proyecto	Tecnológico
Identificar el análisis de viabilidad financiera y técnica	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 análisis de viabilidad financiera y técnica	Tecnológico
Identificación de los stakeholders	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla con los stakeholders identificados	Tecnológico
Clasificación del poder y su interés	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla con la clasificación del poder y su interés	Tecnológico
Elaboración de matriz de poder de interés con interesados	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 matriz de poder de interés con interesados	Tecnológico
Matriz de interesados con el compromiso y la estrategia	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 matriz de interesados con el compromiso estrategia	Tecnológico
Realizar la tabla de criterios de aceptación	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de criterios de aceptación	Tecnológico
Realizar la tabla de inclusiones	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de inclusiones	Tecnológico
Realizar la tabla de exclusiones	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de exclusiones	Tecnológico



Control de cambios del alcance	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 control de cambios del alcance	Tecnológico
Identificación de fases del proyecto	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 lista de identificación de fases del proyecto	Tecnológico
Realizar diagrama EDT	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 diagrama EDT	Tecnológico
Realizar la tabla de ciclo de vida del proyecto y enfoque multifase	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla del ciclo de vida del proyecto	Tecnológico
Realizar la tabla de procesos de dirección de proyectos	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de procesos de dirección de proyectos	Tecnológico
Realizar la lista del enfoque de trabajo	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 lista del enfoque de	Tecnológico
Realizar la lista de gestión de líneas base	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 lista de gestión de líneas base	Tecnológico
Realizar la tabla de revisión de gestión	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de revisión de gestión	Tecnológico
Realizar la tabla de dirección de proyectos	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de dirección de proyectos	Tecnológico
Realizar la tabla de requerimientos del producto	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$1,370	1 tabla de requerimientos del producto	Tecnológico
Realizar la tabla del control de cambios	1 día	Laptop Oficina Servicios	\$1,370	1 tabla de control de cambios	Tecnológico



		Viáticos			
Realizar la tabla de observaciones	2 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$2,740	1 tabla de observaciones	Tecnológico
TOTAL	25 días		\$34,250		

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No. 14 Programa 4 ET.1 Planeaciones**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM14

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 30 de abril del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del programa de planeaciones donde se describen las actividades que se realizaron para hacer esas plantillas	Cassandra Martínez fue responsable de desarrollar el programa de planeaciones, desglosando cada una de las actividades correspondientes al Acta de Constitución, gestión de interesados, gestión del alcance, EDT, Plan de Dirección del Proyecto y gestión de requerimientos, definiendo para cada una su tiempo, recursos, costos, entregables y responsables, asegurando su correcta estructuración conforme a los lineamientos del proyecto.	25 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



35. Programas del Área Tecnológica

	Plantilla No.15 Programa 5 ET.2 Área tecnológica Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E15 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026
--	---

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Diseñar y desarrollar un software único	330 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos APIs de la IA	\$452,100	1 Software único de pruebas (Testify)	Tecnológico
Gestionar una innovación técnica de IA	270 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$369,900	1 Módulo de IA para conclusiones	Tecnológico
Gestionar el proyecto integral	90 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$369,900	5 Reportes de avance metodológico	Tecnológico
Las actividades nuevas					
Definición de arquitectura del software	45 días	Herramientas de diseño Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$92,000	1 diseño arquitectónico	Tecnológico
Planeación del desarrollo del sistema	35 días	Software de gestión Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$82,000	1 plan de desarrollo	Tecnológico
Investigación de tecnologías de IA	40 días	Documentación técnica Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$95,000	1 Análisis de tecnologías IA	Tecnológico

Selección de herramientas de IA	25 días	APIs Comparativas Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$70,000	5 Herramientas seleccionadas	Tecnológico
Integración de IA al proyecto	70 días	Entorno de desarrollo Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$165,000	1 Modelo integrado	Tecnológico
Coordinación del proyecto tecnológico	60 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$140,000	7 Reportes de avance	Tecnológico
Validación de objetivos técnicos	20 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Documentación	\$58,000	1 Aprobación técnica	Tecnológico
Definición de arquitectura del software	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Herramientas de diseño	\$120,000	1 Diseño arquitectónico	Tecnológico
TOTAL	330 días		\$822,000		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto



*Angela Cassandra
Martínez Medina*




*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*



*Eduardo Carbajal
Mendoza*



*Estephany Muñoz
Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

	Minuta No.15 Programa 5 ET.2 Área tecnológica Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM15 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del programa estratégico del área tecnológica enfocado en el diseño, desarrollo del software y gestión de la innovación con IA.	El líder de proyecto Daniel Romero del área tecnológica desarrolló el programa estratégico del área tecnológica donde se definió y estructuró el diseño y desarrollo del software Testify, se gestionó la integración de una innovación técnica basada en inteligencia artificial para el procesamiento de datos, y se coordinó la gestión integral del proyecto tecnológico, asegurando la correcta alineación entre los objetivos, recursos y entregables del sistema.	330 días

Firmas

 	 	
Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto	Estephany Muñoz Hernández	Lorena Sarahí Zepeda Carmona
 	 	
Angela Cassandra Martínez Medina	Eduardo Carbajal Mendoza	


Plantilla No.16 Programa 6 ET.2 Área tecnológica
Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E16

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 3 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Realizar el proyecto de inversión técnica	90 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Cotizaciones	\$123,300	1 Proyecto de inversión técnica	Tecnológico
Desarrollar el prototipo funcional (MVP)	180 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Cotizaciones	\$246,600	1 Prototipo funcional validado	Tecnológico
Realizar el plano operativo técnico	120 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Entorno de desarrollo	\$164,400	1 Plano operativo técnico	Tecnológico
Las actividades nuevas					
Análisis de inversión técnica	30 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$52,000	1 Estudio de inversión	Tecnológico
Evaluación de costos tecnológicos	25 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Cotizaciones	\$45,000	1 Análisis de costos	Tecnológico
Diseño del prototipo (MVP)	45 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Herramientas de desarrollo	\$78,000	1 Diseño MVP	Tecnológico

Desarrollo del prototipo funcional	80 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$125,000	1 MVP funcional	Tecnológico
Pruebas básicas del prototipo	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$52,300	1 Reporte de pruebas	Tecnológico
Diseño del plano operativo técnico	30 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$45,000	1 Plano técnico	Tecnológico
Documentación de la arquitectura	25 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Documentación	\$42,000	1 Documento técnico	Tecnológico
Validación del sistema operativo	40 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Pruebas	\$95,000	1 Sistema validado	Tecnológico
TOTAL	310 días		\$534,300		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto



*Angela Cassandra
Martínez Medina*



*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*



*Estephany Muñoz
Hernández*



*Eduardo Carbajal
Mendoza*




*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

	Minuta No.16 Programa 6 ET.2 Área tecnológica Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM16 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 3 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del programa operativo del área tecnológica para la planeación técnica, desarrollo del prototipo y estructuración del sistema.	El líder de proyecto Daniel Romero del área tecnológica desarrolló el programa operativo del área tecnológica en el cual se realizó el análisis del proyecto de inversión técnica, se diseñó y desarrolló el prototipo funcional (MVP) del sistema Testify, y se elaboró el plano operativo técnico que define la arquitectura, componentes y funcionamiento del sistema.	310 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza


Plantilla No.17 Programa 7 ET.2 Área tecnológica
Nivel táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E17

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 3 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Instalar la infraestructura de red	90 días	Laptop Oficina Servicios Viático	\$123,300	1 Servidor PostgreSQL configurado	Tecnológico
Programar la interfaz de usuario (UI)	150 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Frameworks	\$205,500	1 Interfaz de usuario programada	Tecnológico
Configurar los módulos de seguridad	180 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos PostgreSQL	\$246,600	3 Módulos de seguridad configurados	Tecnológico
Las actividades nuevas					
Instalación de infraestructura de red	40 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$72,000	1 Red instalada	Tecnológico
Configuración de servidores	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Cotizaciones	\$65,000	4 Servidores configurados	Tecnológico
Programación de la interfaz de usuario	85 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$128,000	1 UI desarrollada	Tecnológico
Pruebas de interfaz de usuario	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$52,000	1 Reporte de pruebas UI	Tecnológico



Configuración de módulos de seguridad	45 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$78,000	1 Sistema seguro	Tecnológico
Implementación de autenticación	30 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$48,000	1 Sistema de login	Tecnológico
Validación de seguridad del sistema	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$57,400	1 Reporte de seguridad	Tecnológico
Ajustes finales del sistema	40 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$75,000	1 Sistema optimizado	Tecnológico
TOTAL	345 días		\$575,400		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



**Minuta No.17 Programa 7 ET.2 Área tecnológica
Nivel táctico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM17

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 3 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del programa táctico del área tecnológica enfocado en la implementación técnica del sistema.	El líder de proyecto Daniel Romero del área tecnológica desarrolló el programa táctico del área tecnológica mediante la instalación de la infraestructura de red necesaria, la programación de la interfaz de usuario del sistema, y la configuración de los módulos de seguridad para garantizar la protección de la información y el correcto funcionamiento del software.	345 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

36. Programas del Área Operativa

		Plantilla No.18 Programa 8 ET.2 Área Operativa Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E18 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026			
Actividad	Tiempo	Recursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Fabricar un diseño de la estructura funcional del software	330 días	Laptop, Licencia de AWS (Architect).	\$150,000	Diseño funcional completo	Operativo
Gestionar una estandarización de procesos para reportes	240 días	Laptop, Microsoft Office 365, Guías de estándares ISO/IEC	\$110,000	Manual de procesos y estándares	Operativo
Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos	300 días	PostgreSQL Admin Tool, Laptop, Consola de administración AWS RDS	\$110,000	Reporte de integridad técnica	Operativo
Las actividades realizadas					
Modelado de arquitectura de software en AWS.	180 días	Laptop, Licencia de AWS	\$81,818	Diagramas de arquitectura	Operativo
Desarrollo modular de componentes de IA.	150 días	Laptop, Entorno de desarrollo	\$68,182	Módulos funcionales base	Operativo



Mapeo de procesos internos para reportes.	120 días	Laptop, Microsoft Office 365	\$55,000	Diagramas de flujo de reportes	Operativo
Redacción de manual bajo normas ISO/IEC.	120 días	Laptop, Guías ISO/IEC	\$55,000	Manual de estándares final	Operativo
Reingeniería integral del esquema de tablas de la BD.	150 días	PostgreSQL Admin Tool, Laptop	\$55,000	Nuevo esquema optimizado	Operativo
Migración estructurada de flujos de datos.	150 días	Consola de administración AWS RDS	\$55,000	Script de migración exitosa	Operativo
TOTAL	330 días		\$370,000		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No.18 Programa 8 ET.2 Área operativa****Nivel estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM18

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo de la estructura funcional, estandarización y supervisión técnica de Testify.	La responsable del área Operativa, Estephany Muñoz Hernández, aprobó la sustitución de la actividad de supervisión de base de datos por una reingeniería de tablas y migración de datos debido a problemas imprevistos en la arquitectura original.	330 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.19 Programa 9 ET.2 Área Operativa

Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E19

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Ejecutar la validación y carga de información del software	280 días	Servidor AWS, Laptop, Suite de pruebas, Conexión dedicada.	\$140,000	Reporte de carga exitosa	Operativo
Realizar el mantenimiento y depuración técnica del sistema	300 días	Depuradores (Debuggers), PostgreSQL, Logs de sistema.	\$110,000	Bitácora de mantenimiento	Operativo
Implementar pruebas de regresión y actualizaciones de seguridad	250 días	Herramientas de testing (Selenium), Parches de seguridad.	\$110,000	Reporte de seguridad	Operativo
Las actividades nuevas					
Carga masiva de archivos CSV de prueba en AWS.	140 días	Servidor AWS, Laptop	\$70,000	Log de carga masiva	Operativo
Validación automatizada	140 días	Suite de pruebas, Conexión	\$70,000	Reporte de datos validados	Operativo



de mapeo de datos.					
Depuración profunda de código fuente del sistema.	150 días	Depuradores, Logs de sistema	\$55,000	Código depurado	Operativo
Optimización del motor de IA para procesamiento.	150 días	PostgreSQL, Logs de sistema	\$55,000	Motor de IA optimizado	Operativo
Mitigación emergente de vulnerabilidades en producción.	125 días	Firewalls, Analizador de logs	\$55,000	Reporte de riesgos mitigados	Operativo
Aplicación de parches críticos de seguridad.	125 días	Parches de seguridad, Laptop	\$55,000	Sistema parchado y seguro	Operativo
TOTAL	300 días		\$360,000		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No.19 Programa 9 ET.2 Área operativa

Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM19


Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Ejecución de validación, carga de datos y mantenimiento técnico de Testify.	La Directora Operativa, Estephany Muñoz Hernández, evaluó la ejecución de las actividades en el nivel operativo. Se aprobó la sustitución de la actividad de pruebas de regresión por una mitigación emergente de vulnerabilidades debido a incidencias de seguridad detectadas en el entorno.	300 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz Hernández



Lorena Sarahí Zepeda Carmona



Angela Cassandra Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.20 Programa 10 ET.2 Área Operativa

Nivel táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E20

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 3 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Establecer la infraestructura y arquitectura del software	330 días	Servidores AWS, Laptop, Herramientas de red, Firewall.	\$150,000	Infraestructura lista	Operativo
Configurar los parámetros y protocolos de generación de reportes	240 días	Laptop, Consola de IA, Diccionarios de datos, Office.	\$105,000	Protocolos técnicos	Operativo
Validar la seguridad y el flujo de datos entre módulos	300 días	AWS IAM, Herramientas de cifrado, Logs, Laptop.	\$105,000	Reporte de seguridad	Operativo
Las actividades realizadas					
Despliegue de instancias EC2 y entornos en AWS.	165 días	Servidores AWS, Laptop	\$75,000	Entorno en la nube activo	Operativo
Configuración de políticas de	165 días	Herramientas de red, Firewall.	\$75,000	Red perimetral configurada	Operativo



red y Firewalls de seguridad.					
Reconfiguración técnica de APIs de comunicación externas.	120 días	Laptop, Endpoints de conexión	\$52,500	APIs externas vinculadas	Operativo
Integración de pasarelas de datos con la consola de IA.	120 días	Consola de IA, Diccionarios	\$52,500	Pasarela de datos validada	Operativo
Auditoría técnica de flujos internos de datos.	150 días	AWS IAM, Analizador de logs	\$52,500	Diagnóstico de flujos de datos	Operativo
Contención y blindaje de fugas de información entre módulos.	150 días	Herramientas de cifrado, Laptop	\$52,500	Módulos blindados y seguros	Operativo
TOTAL	330 días		\$360,000		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández



Angela Cassandra
Martínez Medina



Eduardo Carbajal
Mendoza



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



**Minuta No.20 Programa 10 ET.2 Área operativa
Nivel táctico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM20

Presupuesto: 0.88%

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 3 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Configuración de infraestructura, protocolos y validación técnica de seguridad.	La Directora Operativa, Estephany Muñoz Hernández, a aprobó modificaciones en el alcance ejecutado de la fase táctica operativa. Se validó la sustitución de la configuración de parámetros por una reconfiguración de pasarelas de comunicación externas. De igual manera, se aprobó la sustitución de la validación general de seguridad por una auditoría y contención de fugas en flujos debido a un riesgo técnico que comprometía la ruta crítica de mantenimiento del sistema.	330 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz Hernández

Lorena Sarahí Zepeda Carmona

Angela Cassandra Martínez Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

37. Programas del Área Financiera

	Plantilla No.21 Programa 11 ET.2 Área Financiera Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E21 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 4 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Obtener afiliaciones con socios capitalistas	180 días	Laptop Viáticos	\$246,600	2 Convenios de asociación	Finanzas
Gestionar el presupuesto de innovación (IA)	180 días	Laptop, Software financiero, Servicios	\$411,000	1 presupuesto de innovación	Finanzas
Realizar la proyección de recuperación financiera	330 días	Laptop, Excel avanzado, Servicios	\$452,100	1 reporte de retorno de inversión	Finanzas
Las actividades nuevas					
Búsqueda y análisis de perfiles de inversores (Due Diligence)	70 días	Laptop Internet Servicios	\$210,000	1 base de datos de inversores	Finanzas
Preparación de term sheets (Borradores de convenio)	55 días	Laptop Asesoría legal Servicios	\$165,000	2 borradores de acuerdos	Finanzas
Análisis de costos de consumo de APIs de IA para presupuesto	65 días	Laptop Calculadora Cotizaciones	\$180,000	1 reporte de costos API	Finanzas



Modelado de escenarios financieros (Optimista, Realista, Pesimista)	85 días	Laptop Excel avanzado	\$285,000	1 Matriz de escenarios en Excel	Finanzas
Presentación de proyecciones a la dirección	70 días	Laptop Sala de juntas Viaticos	\$269,700	1 Presentación ejecutiva	Finanzas
TOTAL	330 días		\$1,109,700		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 21 Programa 11 ET.2 Área Financiera
Nivel estratégico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM21

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición de las actividades nuevas para el programa estratégico financiero.	El director de Finanzas, Eduardo Carbajal Mendoza, estructuró y costeo las tareas pre-operativas a nivel estratégico. Se acordó que, para lograr la afiliación con socios y proyectar la recuperación, era indispensable añadir el análisis de perfiles inversores, preparación de borradores legales y el modelado de escenarios financieros. Estas actividades fueron valuadas usando la tarifa estándar del área (\$1,370 MXN diarios), asegurando la viabilidad económica del presupuesto de innovación y la asociación de capital.	330 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.22 Programa 12 ET.2 Área Financiera
Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E22

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Determinar el capital para activos y equipo	90 días	Laptop, Cotizaciones, Oficina, Servicios	\$123,300	1 Plan de adquisición de activos	Finanzas
Definir el tarifario de licencias anuales	150 días	Laptop, Análisis de costos, Servicios	\$205,500	1 Tarifario oficial de Testify	Finanzas
Obtener el presupuesto trimestral de nómina	120 días	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$164,400	4 Reportes presupuestales	Finanzas
Las actividades nuevas					
Cotización comparativa de hardware y servidores en la nube (AWS)	60 días	Laptop Internet Telefono	\$4,110	1 Cuadro comparativo de precios	Finanzas
Análisis de margen de utilidad para fijar precios de licencias	75 días	Laptop Excel Estudio de mercado	\$2,740	1 Reporte de márgenes	Finanzas
Cálculo de impuestos, aportaciones y retenciones para la nómina	80 días	Laptop Software contable Servicios	\$4,110	1 Tabulador de retenciones	Finanzas
Elaboración de la estructura	65 días	Laptop Oficina Servicios	\$2,740	1 Estructura de costos	Finanzas



de costos fijos y variables					
TOTAL	280 días		\$506,900		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

Eduardo Carbajal Mendoza

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



**Minuta No. 22 Programa 12 ET.2 Área Financiera
Nivel operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM22

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Estructuración de tareas operativas y costeo de recursos internos.	Bajo la dirección de Eduardo Carbajal Mendoza, se definieron las actividades complementarias necesarias para la operación financiera del proyecto Testify. Se acordó que para fijar correctamente el tarifario y la nómina, el área de finanzas ejecutaría cotizaciones comparativas en la nube, cálculo de impuestos/retenciones y la separación de costos fijos y variables. Todo fue tabulado y aprobado para mantener la coherencia financiera en la Etapa 2.	280 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.23 Programa 13 ET.2 Área Financiera
Nivel táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E23

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Administrar el fondo de infraestructura física	330 días	Laptop, Servicios, Cuenta bancaria	\$452,100	1 Bitácora de administración	Finanzas
Ejecutar el pago mensual de salarios	330 días	Laptop, Token bancario, Servicios	\$452,100	11 Comprobantes de dispersión	Finanzas
Realizar el balance de caja mensual	330 días	Laptop, Software contable, Servicios	\$452,100	11 Balances mensuales	Finanzas
Las actividades nuevas					
Apertura y configuración de cuentas empresariales y token	65 días	Trámites legales, Banco, Viáticos	\$320,000	1 Cuenta activa con acceso	Finanzas
Conciliación bancaria quincenal	80 días	Laptop, Portal bancario, Servicios	\$285,000	1 Archivo de conciliaciones	Finanzas
Dispersión y comprobación de viáticos del equipo	95 días	Laptop, Facturas/Tickets, Excel	\$351,300	1 Reporte de gastos y viáticos	Finanzas
Generación de reportes de flujo de efectivo (Cash Flow)	90 días	Laptop, Software financiero	\$400,000	1 Documento de flujo de efectivo	Finanzas
TOTAL	330 días		\$1,356,300		

Firmas de aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Angela Cassandra
Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



**Minuta No. 23 Programa 13 ET.2 Área Financiera
Nivel tactico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM23

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 4 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Planificación de actividades diarias y control de flujo de caja.	Eduardo Carbajal Mendoza organizó las labores tácticas de seguimiento monetario continuo. Se estableció que, para poder pagar nóminas y administrar el fondo, se requerían actividades previas y recurrentes como la apertura de cuentas bancarias empresariales, conciliaciones bancarias quincenales, y un control estricto del flujo de efectivo y viáticos. Se validó el presupuesto de estas labores utilizando la métrica de \$1,370 MXN por día para su integración en los balances mensuales.	330 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza

38. Programas del Área de Recursos Humanos

	Plantilla No.24 Programa 14 ET.2 Área de RH Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E24 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026
---	--

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Contratar personal especializado	180 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$246,600	5 Contratos laborales firmados	RH
Cpacitar al personal en metodologías y bases de datos	330 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Material didáctico	\$452,100	1 Programa de capacitación integral	RH
Establecer el sistema de evaluación del desempeño	300 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Formatos	\$411,000	1 Sistema de evaluación	RH
Las actividades nuevas					
Análisis de necesidades de personal	55 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$180,000	1 documentación de requerimientos	RH
Definición de perfiles de contratación	50 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Plantillas	\$165,000	5 perfiles definidos	RH
Publicación de vacantes	40 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Plataformas digitales	\$120,000	10 vacantes publicadas	RH



Selección preliminar de candidatos	75 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos CVs	\$210,000	1 lista de candidatos	RH
Diseño del sistema de evaluación	55 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Formatos	\$190,000	1 sisteam de evaluación	RH
Validación del sistema	55 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$244,700	1 sistema aprobado	RH
TOTAL	330 días		\$1,109,700		

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*


*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

	Minuta No. 24 Programa 14 ET.2 Área de RH Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM24 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del programa estratégico de Recursos Humanos enfocado en la contratación, capacitación y evaluación del personal.	La jefa del área de RH Cassandra Martínez llevó a cabo el programa estratégico de Recursos Humanos donde se definieron las necesidades de personal, se establecieron los perfiles de contratación, se realizó el proceso de reclutamiento, y se diseñaron e implementaron estrategias de capacitación en metodologías y bases de datos, así como la creación y validación del sistema de evaluación del desempeño del equipo del proyecto.	330 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza


Plantilla No.25 Programa 15 ET.2 Área de RH
Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E25

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Definir los perfiles de puesto y copetencias técnicas	90 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$123,300	5 Perfiles de puesto validados	RH
Diseñar talleres formativos de la arquitectura	120 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Material didáctico Guías técnicas	\$164,400	3 Módulos formativos diseñados	RH
Estructurar los KPIs de productividad del equipo	120 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$164,400	1 Manual de indicadores (KPIs)	RH
Las actividades nuevas					
Identificación de puestos	15 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Documento	\$48,000	1 lista de puestos	RH
Definición de competencias técnicas	18 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Plantillas	\$55,000	1 matriz de competencias	RH
Elaboración de perfiles de puesto	20 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Documento	\$62,000	5 perfiles documentados	RH

Diseño de talleres formativos	16 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Guías	\$54,000	1 taller diseñado	RH
Desarrollo de contenido formativo	22 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Documento	\$78,000	10 materiales diseñados	RH
Programación de capacitación	10 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$35,000	1 cronograma	RH
Definición de KPIs	11 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$56,000	20 KPIs definidos	RH
Documentación de KPIs	10 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Formatos	\$64,100	1 manual de KPIs	RH
TOTAL	120 días		\$452,100		

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Eduardo Carbajal
Mendoza



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 25 Programa 15 ET.2 Área de RH
Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM25

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del programa operativo de Recursos Humanos para la definición de puestos, capacitación técnica y medición del desempeño.	La jefa del área de RH Cassandra Martínez desarrolló el programa operativo de Recursos Humanos en el que se identificaron los puestos necesarios, se definieron las competencias técnicas requeridas, se elaboraron los perfiles de puesto, se diseñaron y estructuraron los talleres formativos de la arquitectura del sistema, y se establecieron y documentaron los indicadores clave de desempeño (KPIs) para medir la productividad del equipo.	120 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza


Plantilla No.26 Programa 16 ET.2 Área de RH
Nivel táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E26

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Realizar entrevistas y pruebas técnicas	120 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$164,400	15 Reportes de entrevista	RH
Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal	60 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$82,200	5 Bitácoras de inducción	RH
Aplicar las encuestas de desempeño	330 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Formularios	\$452,100	11 Reportes de evaluación mensual	RH
Las actividades nuevas					
Diseño de entrevistas	30 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Guías	\$72,000	1 formato de entrevista	RH
Aplicación de entrevistas	55 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos CVs	\$128,000	20 reportes de entrevista	RH
Aplicación de pruebas técnicas	45 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$92,000	20 resultados de pruebas	RH
Selección Final	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Evaluaciones	\$70,000	5 listas de seleccionados	RH

Diseño de inducción	30 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Manuales	\$68,000	20 programas de inducción	RH
Ejecución de inducción	60 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Material didáctico	\$116,000	1 personal inducido	RH
Diseño de encuestas	35 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Formularios	\$58,000	20 encuestas diseñadas	RH
Aplicación de encuestas	40 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos Formularios digitales	\$94,700	20 resultados de desempeño	RH
TOTAL	330 días		\$698,700		

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



*Angela Cassandra
Martínez Medina*



*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*



*Estephany Muñoz
Hernández*



*Eduardo Carbajal
Mendoza*



*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No 26 Prográma 16 ET.2 Área de RH
Nivel táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM26

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del programa táctico de Recursos Humanos enfocado en la selección, inducción y evaluación del personal.	La jefa del área de RH Cassandra Martínez desarrolló el programa táctico de Recursos Humanos mediante la realización de entrevistas y pruebas técnicas a los candidatos, la selección del personal adecuado, la implementación del proceso de inducción técnica, y la aplicación de encuestas de desempeño para evaluar el rendimiento del equipo durante el desarrollo del proyecto.	330 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

39. Programas del Área Comercial

	Plantilla No.27 Programa 17 ET.2 Área de Comercial Nivel estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E27 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: del 2026
---	---

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Vender licenciamiento anual	3 días	Laptop	\$2,760	Modelo de ventas	Sarahi Zepeda
Posicionar Testify en la CDMX	2 días	Internet	\$1,840	Estrategia SEO/B2B	Sarahi Zepeda
Las actividades nuevas					
Definición de proyecciones de venta año 1 al 3.	1 día	Laptop	\$920	Tabla de ventas	Sarahi Zepeda
Establecimiento del porcentaje de aceptación (73.33%).	1 día	Encuestas	\$920	Reporte de aceptación	Sarahi Zepeda
Cálculo del porcentaje de incremento (40%).	1 día	Excel	\$920	Aceptación de crecimiento	Sarahi Zepeda
Segmentación de alcaldías meta (Cuauhtémoc)	1 día	INEGI	\$920	Mapa de mercado	Sarahi Zepeda
Selección de canales de difusión para el sector TI.	1 día	Laptop	\$920	Plan de medios	Sarahi Zepeda
TOTAL	5 día		\$4,600		



Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Angela Cassandra
Martínez Medina



Eduardo Carbajal
Mendoza



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 27 Programa 17 ET.2 Área Comercial
Nivel estratégico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM27

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición de metas y posicionamiento estratégico.	Se acordó que la venta de las 6 licencias es el objetivo rector. Sarahí Zepeda validó que los porcentajes de aceptación e incremento son los insumos necesarios para que el nivel táctico diseñe el Pitch Deck con datos reales y metas alcanzables.	5 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.28 Programa 18 ET.2 Área Comercial
Nivel táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E28

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Realizar prospección de clientes	2 días	CRM	\$1,840	Cartera de 20 prospectos	Sarahí Zepeda
Desarrollar pitch deck comercial	2 días	Software	\$1,840	Presentación ejecutiva	Sarahí Zepeda
Definir niveles de soporte (SLA)	2 días	Servicios	\$1,840	Manual de niveles	Sarahí Zepeda
Las actividades nuevas					
Extracción de base de datos de agencias de TI	1 día	DENUE	\$920	Listado de prospectos	Sarahí Zepeda
Filtrado de directores de TI en alcaldías meta.	1 día	LinkedIn	\$920	Directorio comercial	Sarahí Zepeda
Diseño de infografías del motor de mapeo con IA.	1 día	Laptop	\$920	Gráficos técnicos	Sarahí Zepeda
Redacción de la propuesta de ahorro de tiempo.	1 día	Laptop	\$920	Argumento de venta	Sarahí Zepeda
Establecimiento de tiempos de respuesta por ticket. (Nueva)	1 día	Laptop	\$920	Tabla de tiempos	Sarahí Zepeda
Clasificación de severidad de errores de reporte.	1 día	Laptop	\$920	Matriz de incidentes	Sarahí Zepeda

TOTAL	6 días		\$5,520		
-------	--------	--	---------	--	--

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



**Minuta No. 28 Programa 18 ET.2 Área Comercial
Nivel táctico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM28

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Estandarización de herramientas tácticas de abordaje.	La jefa comercial Sarahi Zepeda finalizó el Pitch Deck integrando la cartera de 20 prospectos. Se acordó que el manual de SLA será el diferenciador de confianza ante los clientes, permitiendo que la fase operativa inicie las demostraciones con un respaldo técnico sólido.	6 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.29 Programa 19 ET.2 Área Comercial
Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E29

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Cerrar contratos legales	2 días	Papeleria	\$1,840	6 Expedientes cerrados	Sarahi Zepeda
Ejecutar demos técnicas	2 días	Prototipo	\$1,840	10 Bitácoras de demo	Sarahi Zepeda
Las actividades nuevas					
Revisión jurídica de cláusulas de licenciamiento.	1 día	Viáticos	\$920	Contrato base	Sarahi Zepeda
Firma y validación de acuerdos de confidencialidad.	1 día	Oficina	\$920	NDA firmado	Sarahi Zepeda
Configuración de entornos piloto para usuarios.	1 día	Laptop	\$920	Set de pruebas	Sarahi Zepeda
Presentación funcional de carga de CSV con IA.	1 día	Servicios	\$920	Reporte de demo	Sarahi Zepeda
TOTAL	4 días		\$3,680		

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



**Minuta No. 29 Programa 19 ET.2 Área Comercial
Nivel operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM29

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Cierre de ciclo operativo y validación de contratos.	Se dio por cumplida la fase operativa tras la ejecución de las demos y la firma de los 6 contratos. El equipo validó que las encuestas de satisfacción confirman la eficiencia del software, asegurando el cumplimiento de los hitos comerciales de la Etapa 2.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza


Plantilla No.30 Programa 20 ET.3 Control y Verificación

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E30

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: del 2026

Actividad	Tiempo	Rercursos	Costo MXN	Entregable	Responsable
Checklisy de verificación.	3 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$4,110	21 Cheklist de verificación	Tecnológico
Control de cambios.	4 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$5,480	1 bitácora de control de cambios por cada actividad crítica	Tecnológico
Control de seguimiento.	5 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$6,850	1 bitácora de control de seguimiento por cada actividad de holgura	Tecnológico
Las actividades nuevas					
Elaboración de la tabla de checklist de cada programa.	5 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$6,850	21 checklist de todos los programas	Tecnológico
Firmar todos los checklist de cada programa.	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$920	40 hojas firmadas	Tecnológico
Revisión de entregables finales del proyecto.	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$920	1 revisión del proyecto	Tecnológico
Verificación y cumplimiento de objetivos, tiempos y costos establecidos	2 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$2,840	21 verificaciones de cumplimiento	Tecnológico

Elaboración de bitácoras de actividades que no se cumplieron de actividades de holgura y críticas	2 días	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$2,840	40 bitácoras	Tecnológico
Monitoreo de cumplimiento de entregables por área.	1 día	Laptop Oficina Servicios Viáticos	\$2,070	1 monitoreo de cumplimiento por área	Tecnológico
TOTAL	12 días		\$16,440		

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta de de control y verificación No. 30

Programa de cierre No 31

Minuta de cierre No 31

ETAPA 3 (VERIFICACIÓN Y CONTROL)



Etapa 3 (Verificación y Control)

40. Cheklist de verificación Etapa 0 (Inicio) Actividad Crítica Programa Idea del Negocio

	Plantilla No. 32 Cheklist de verificación ET.0 Actividad Crítica X Programa Idea del Negocio Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E32 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
---	---

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Tema	Investigación y documentación formal de las deficiencias críticas detectadas en los procesos de QA manuales de la CDMX.	No
Titulo	Sesiones de lluvia de ideas para la marca, seguidas de la validación formal de disponibilidad legal del nombre "Testify".	No
Sector y Giro	Identificación y registro ante el DENUE del giro de servicios de software e	Sí

	integración de tecnologías de la información.	
Cliente	• Mapeo detallado de agencias tecnológicas en CDMX y estructuración georreferenciada en la alcaldía Cuauhtémoc.	Sí
PIB	• Consulta de datos macroeconómicos sectoriales de TI y cálculo matemático de la contribución directa de la plataforma al PIB.	Sí
Eje Tecnológico	• Análisis cuantitativo de tiempos y selección justificada de la Inteligencia Artificial básica y avanzada para el mapeo automático.	No

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal
Mendoza



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 32 Checklist de verificación ET.0
Actividad Crítica X Programa Idea del Negocio
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM32
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación técnica de cumplimiento crítico en Idea del Negocio.	Eduardo Carbajal y Alexis Daniel el equipo directivo evaluó el desglose de las tareas ejecutadas y determinó que se cumplió formalmente con la línea base crítica planificada, por lo que se aprueba continuar con el proyecto sin requerir planes de seguimiento adicionales.	5 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 33 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Tema
Programa Idea del Negocio

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E33

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Tema	100%	Complementar la investigación de las deficiencias detectadas en los procesos de QA mediante fuentes actualizadas y validar la problemática con empresas del sector TI. Elaborar la versión final del documento de justificación del proyecto.	3 días	\$4,110 mxn	Área Tecnológica

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

	Minuta No. 33 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Tema Programa Idea del Negocio Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM33 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 21 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Seguimiento a la definición del tema del proyecto Testify.	El líder de proyecto Daniel Romero coordinó la revisión de la investigación relacionada con las deficiencias en los procesos de QA manuales. Se acordó complementar la documentación con información actualizada del sector TI y fortalecer la justificación del problema que dará origen al proyecto. Asimismo, el equipo validó la pertinencia del tema y aprobó las correcciones finales del documento.	5 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 34 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Título
Programa Idea del Negocio**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E34

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Título	100%	Realizar una validación final de identidad de marca, disponibilidad legal y congruencia del nombre con los objetivos del proyecto. Actualizar la documentación oficial con el nombre aprobado.	2 días	\$2,740 mxn	Área Tecnológica

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No. 34 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Título
Programa Idea del Negocio
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM34
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Seguimiento a la validación del título del proyecto Testify.	El líder de proyecto Daniel Romero dirigió la revisión del nombre comercial del proyecto y verificó su alineación con la propuesta de valor. Se acordó realizar una validación final de disponibilidad y registrar oficialmente el nombre "Testify" en toda la documentación del proyecto. Finalmente, los integrantes aprobaron el título definitivo para su utilización en los entregables posteriores.	2 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 35 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Eje Tecnológico

Programa Idea del Negocio

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E35

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Eje tecnológico	100%	Profundizar el análisis de tecnologías de Inteligencia Artificial, evaluar alternativas de implementación y documentar la justificación técnica de la solución seleccionada.	5 días	\$4,850 mxn	Área Tecnológica

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 35 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Título
Programa Idea del Negocio
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM35
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Seguimiento al análisis del eje tecnológico del proyecto Testify.	El líder de proyecto Daniel Romero coordinó la evaluación de las tecnologías de Inteligencia Artificial propuestas para la automatización de procesos. Se acordó ampliar el análisis comparativo de herramientas, documentar los criterios de selección tecnológica y validar la viabilidad de integración con la arquitectura del sistema.	5 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



41. Checklist de verificación Etapa 0 (Inicio) Actividades críticas y de holgura Programa Mercado

	Plantilla No. 36 Checklist de verificación ET.0 Actividad Crítica X Programa Mercado Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E36 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
---	---

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Mercado Objetivo	- Investigar el mercado objetivo en la CDMX. - Buscar empresas de TI candidatas en la región.	Sí
Mercado Meta	- Investigar las características del mercado meta. - Filtrar y seleccionar las 41 empresas de TI	Sí

Firmas de Aprobación



Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Angela Cassandra
Martínez Medina



Eduardo Carbajal
Mendoza



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 36 Checklist de verificación ET.0

Actividad Crítica X Programa Mercado

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM36

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación técnica de cumplimiento crítico en Mercado.	Alexis Daniel y Estephany El equipo directivo evaluó el desglose de las tareas ejecutadas y determinó que se cumplió formalmente con la línea base crítica planificada, por lo que se aprueba continuar con el proyecto sin requerir planes de seguimiento adicionales.	4 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza

**Plantilla No. 37 Checklist de verificación ET.0****Actividad Holgura X Programa Mercado**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E37

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Mercado Potencial	Investigación y proyección de demanda del mercado potencial	Sí
Benchmarking	- Investigar herramientas competidoras - Armar la matriz comparativa de ventajas	Sí

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No. 37 Checklist de verificación ET.0

Actividad Holgura X Programa Mercado

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM37

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Cierre y archivo de entregables de holgura en Mercado.	El líder del proyecto Daniel supervisó la entrega de los resultados correspondientes a mercado potencial y benchmarking. Al comprobarse que coinciden con las metas de la planeación operativa, se acordó dar por cerrada la verificación con estatus aprobatorio.	3 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



42. Checklist de verificación Etapa 0 (Inicio) Actividad Crítica Programa Planes

	Plantilla No. 38 Checklist de verificación ET.0 Actividad Crítica X Programa Planes Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E38 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
---	--

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Plan Operativo	Reunión de alineación de estrategias (E-T-O).	No
Plan General de Trabajo	Integración colaborativa de tiempos y costos por etapa.	No
Plan de Comercialización	- Identificación de recursos (Entrada/Proceso/Salida). - Elaboración de tablas de costos comerciales. - Edición y validación.	No
Cronograma	- Revisión lógica de secuencia y precedencias (Vía Discord). - Edición y validación conjunta de los entregables.	No

Firmas de Aprobación

 _____ <i>Patrocinador del Proyecto</i>	 _____ <i>Alexis Daniel Romero Razo</i> <i>Gerente de proyecto</i>	 _____ <i>Estephany Muñoz</i> <i>Hernández</i>
 _____ <i>Angela Cassandra</i> <i>Martínez Medina</i>	 _____ <i>Eduardo Carbajal</i> <i>Mendoza</i>	 _____ <i>Lorena Sarahí Zepeda</i> <i>Carmona</i>



Minuta No. 38 Checklist de verificación ET.0
Actividad Crítica X Programa Planes
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1EM38
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Ejecución de los planes operativos, generales de trabajo, comercialización y cronograma.	El líder Daniel Romero validó el cumplimiento de las actividades críticas y se identificó la necesidad de reprogramar la edición y validación conjunta del cronograma.	3 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 39 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Plan Operativo

Programa de Planes

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E39

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Plan operativo	100%	Realizar reuniones adicionales de alineación con las áreas involucradas para validar estrategias, recursos y entregables pendientes. Actualizar el documento operativo con los acuerdos finales y obtener la aprobación del equipo de trabajo.	10 días	\$1,500 mxn	Área Tecnológica

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 39 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Plan Operativo

Programa de Planes

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM39

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Seguimiento al Plan Operativo del proyecto Testify.	El líder Daniel Romero coordinó una reunión de revisión para analizar los pendientes del Plan Operativo. Se acordó actualizar las estrategias operativas, validar los recursos asignados y completar los entregables faltantes para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	5 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 40 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Plan General de Trabajo

Programa de Planes

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E40

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Plan General de Trabajo	100%	Revisar nuevamente los tiempos, costos y entregables de cada etapa para asegurar su consistencia. Integrar observaciones del equipo y emitir la versión final aprobada.	4 días	\$5,480 mxn	Área Tecnológica

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 40 P.C Seguimiento ET.0 Actividad. Plan General de Trabajo
Programa de Planes
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1EM40
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Seguimiento al Plan General de Trabajo del proyecto Testify.	El líder Daniel Romero coordinó la revisión integral de tiempos, costos y entregables de cada etapa del proyecto. Se acordó corregir inconsistencias detectadas en la planificación, actualizar las actividades pendientes y validar nuevamente el documento con todas las áreas involucradas.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 41 P.C Seguimiento Actividad. Plan de Comercialización
Programa de Planes
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E41
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026


Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Plan de Comercialización	100%	Complementar la estrategia comercial con ajustes en costos, recursos y acciones de promoción. Validar el plan con el área comercial y actualizar las proyecciones de mercado.	7 días	\$7,500 mxn	Área Comercial

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal
Mendoza



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 41 P.C Seguimiento Actividad. Plan de Comercialización

Programa de Planes

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM41

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Seguimiento al Plan de Comercialización del proyecto Testify.	La directiva comercial Sarahí Zepeda lideró la revisión de las estrategias comerciales y de posicionamiento de Testify. Se acordó actualizar los recursos de entrada, proceso y salida, ajustar las proyecciones de mercado y fortalecer las acciones de promoción para alcanzar los objetivos comerciales establecidos.	7 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 42 P.C Seguimiento Actividad. Cronograma
Programa de Planes**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E42

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Cronograma	100%	Revisión de errores lógicos y re-secuenciación de tareas	10 días	\$1,500 mxn	Área Tecnológica

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No. 42 P.C Seguimiento Actividad. Cronograma Programa de Planes

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM42

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
elaboración y optimización del cronograma de actividades, centrada en la definición de la ruta crítica del proyecto.	La integrante Cassandra Martínez priorizó el cumplimiento de las fechas establecidas en la ruta crítica para evitar desviaciones, igual realizó revisiones periódicas del avance real frente al cronograma para detectar y corregir retrasos oportunamente. El líder Daniel Romero mantuvo la congruencia de los tiempos definidos con los recursos presupuestados asignados a la etapa.	10 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



43. Checklist de verificación Etapa 1 (Planeación) Actividades Críticas y de Holgura Programa Planeaciones

	Plantilla No. 43 Checklist de verificación ET.0 Actividad Crítica X Programa Planeaciones Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E43 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
---	--

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Acta de Constitución	Definición de objetivos del producto, hitos base, exclusiones y matriz de riesgos preliminar.	Sí
Gestión de Requerimientos	Construcción integral de tablas de requerimientos funcionales y no funcionales (RQ-01 a RQ-24).	Sí

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 43 Checklist de verificación ET.0

Actividad Crítica X Programa Planeaciones

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM43

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación técnica de cumplimiento crítico en Planeaciones.	Eduardo Carbajal y Alexis Daniel Se auditaron el Acta de Constitución y los Requerimientos del sistema. El comité determinó que cumplen al 100% con los estándares de aceptación técnica, liberando este bloque crítico de la planeación.	6 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza

**Plantilla No. 44 Checklist de verificación ET.0****Actividad Holgura X Programa Planeaciones**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E44

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Gestión de Interesados	Clasificación matricial de niveles de poder/interés y mapeo corporativo de directivos.	Sí
Gestión del Alcance	Estructuración formal de la matriz de criterios de aceptación y exclusiones técnicas.	No
Plan de Dirección	Generación de líneas base de costos, cronograma y ciclos de revisión multifase.	No
Diagrama EDT	Desarrollo exclusivo a cargo de Eduardo Carbajal del WBS integral bajo la regla del 100%.	No

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal
Mendoza



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 44 Checklist de verificación ET.0
Actividad Holgura X Programa Planeaciones
 Título del Proyecto: Testify
 ID: ES0DC4EM44
 Presupuesto: 381,812.37mxn
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
 Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Evaluación de las actividades de Holgura y resolución de desviaciones.	Eduardo Carbajal y Estephany Muñoz se detectó que el Diagrama EDT presenta un estatus de incumplimiento. Al ser un programa con holgura en la red CPM, se dictamina que no afecta la fecha final del proyecto. Se rechaza el cierre estándar y se ordena la apertura de la Plantilla de Control de Cambios.	3 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 45 Control de cambios ET.1

Actividad. Gestión del alcance Programa

Planeaciones

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E45

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción Acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Gestión del Alcance	Actualizar la matriz de criterios de aceptación y exclusión, incorporando ajustes derivados de nuevos requerimientos funcionales identificados durante la ejecución del proyecto.	4 días	\$5,500 mxn	Área de RH

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No. No. 45 Control de cambios ET.1****Actividad. Gestión del Alcance Programa Planeaciones**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM45

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización de la Gestión del Alcance del proyecto Testify.	La líder de RH Cassandra Martínez revisó la matriz de criterios de aceptación y exclusión del proyecto. Se acordó incorporar nuevos requerimientos funcionales identificados durante la ejecución, actualizar el documento de alcance y validar los cambios con los responsables de cada área para evitar desviaciones futuras..	3 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza


Plantilla No. 46 Control de cambios ET.1
Actividad. Plan de dirección Programa Planeaciones

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E46

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
	Acción			
Plan de Dirección	Revisar y actualizar las líneas base de costos, cronograma y mecanismos de control para alinearlos con los cambios aprobados durante la ejecución del proyecto.	5 días	\$7,500 mxn	Área de RH

Firmas de Aprobación
Patrocinador del Proyecto
Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. No. 46 Control de cambios ET.1
Actividad. Plan de dirección Programa Planeaciones
 Título del Proyecto: Testify
 ID: ES0DC4EM46
 Presupuesto: 381,812.37mxn
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
 Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización del Plan de Dirección del proyecto Testify..	La líder de RH Cassandra Martínez coordinó la revisión de las líneas base de costos, cronograma y procesos de control. Se acordó actualizar los documentos de dirección para reflejar los cambios aprobados durante la ejecución y garantizar la correcta administración del proyecto Testify.	5 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina






Eduardo Carbajal Mendoza

	Plantilla No. 47 Control de cambios ET.1 Actividad. Diagrama EDT Programa Planeaciones Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E47 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Plan de acción Acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Diagrama EDT	Reprogramar el calendario técnico para finalizar la descomposición jerárquica del WBS a nivel 4 enfocada en la arquitectura de IA y absorber los 3 días utilizando la holgura del programa.	3 días	\$0.00mxn	Área Tecnológica

Firmas de Aprobación

 Patrocinador del Proyecto	 Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto	 Estephany Muñoz Hernández
 Angela Cassandra Martínez Medina	 Eduardo Carbajal Mendoza	 Lorena Sarahí Zepeda Carmona



Minuta No. 47 Control de cambios ET.1

Actividad. Diagrama EDT Programa Planeaciones

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM47

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Cierre y autorización del Control de Cambios del Diagrama EDT.	Eduardo Carbajal y Alexis Daniel como el comité directivo evaluó el impacto técnico de la descomposición jerárquica a nivel 4 para la arquitectura de IA. Al comprobarse que la desviación financiera es nula (\$0.00 mxn) y que el tiempo se absorbe por completo mediante la holgura del programa sin afectar la ruta crítica general, se aprueba formalmente la modificación de la línea base operativa y se da por cerrada la incidencia.	3 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



44. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica - Nivel Estratégico

	Plantilla No. 48 Checklist de verificación ET.2 Actividad Crítica X Programa Area Tecnologica Nivel Estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E48 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
--	--

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Diseño y Desarrollo de Software	Definición y especificación completa de la arquitectura lógica del software y planeación detallada de los sprints del sistema de desarrollo.	Sí

Firmas de Aprobación

 Patrocinador del Proyecto	 Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto	 Estephany Muñoz Hernández
 Angela Cassandra Martínez Medina	 Eduardo Carbajal Mendoza	 Lorena Sarahí Zepeda Carmona



Minuta No. 48 Checklist de verificación ET.2
Actividad Crítica X Programa Area Tecnologica Nivel
Estratégico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM48

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación técnica del core arquitectónico crítico.	Eduardo Carbajal y Alexis Daniel el equipo directivo evaluó los diagramas de arquitectura lógica del software y determinó que se cumple formalmente con las especificaciones del diseño de sistemas establecidas.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 49 Checklist de verificación ET.2
Actividad Holgura X Programa Área Tecnológica Nivel
Estratégico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E49

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Gestión de Innovación de IA	Investigación exhaustiva de tecnologías de procesamiento de lenguaje natural y selección final de herramientas y APIs de IA.	No
Gestión del Proyecto Integral	Ejecución e integración técnica del modelo de IA dentro del entorno global del proyecto y validación formal de los objetivos del sistema.	No
Gobernanza Tecnológica	Coordinación de los equipos técnicos, revisión de dependencias y generación periódica de los 7 reportes de avance arquitectónico.	Sí

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal
Mendoza



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No. 49 Checklist de verificación ET.2****Actividad Holgura X Programa Área Tecnológica Nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM49

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación de tareas de integración y holgura en Tecnología Estratégica.	Eduardo Carbajal y Estephany Muñoz se auditaron satisfactoriamente el aprovisionamiento de las APIs de IA y los reportes de gobernanza.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

**Plantilla No. 50 Control de cambios ET.2****Actividad. Gestión de Innovación de IA Programa Área Tecnológica Nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E50

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
	Acción			
Gestión de Innovación de IA	Actualizar la estrategia de innovación incorporando nuevas herramientas de Inteligencia Artificial para optimizar el análisis y generación automática de documentación dentro de la plataforma.	6 días	\$7,600 mxn	Área Tecnológica

Firmas de Aprobación
Patrocinador del Proyecto
Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto
Estephany Muñoz
Hernández
Angela Cassandra
Martínez Medina
Eduardo Carbajal
Mendoza
Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 50 Control de cambios ET.2
Actividad. Gestión de Innovación de IA Programa Área Tecnológica Nivel Estratégico
 Título del Proyecto: Testify
 ID: ES0DC4EM50
 Presupuesto: 381,812.37mxn
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
 Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización de la Gestión de Innovación de Inteligencia Artificial.	El líder Daniel Romero realizó la revisión de las tecnologías de Inteligencia Artificial consideradas para el proyecto Testify. Se acordó incorporar nuevas herramientas y metodologías de innovación que permitan mejorar la automatización de procesos, incrementar la precisión de los resultados y fortalecer las capacidades tecnológicas de la plataforma.	6 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 51 Control de cambios ET.2
Actividad. Gestión del Proyecto Integral Programa
Área Tecnológica Nivel Estratégico
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E51
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
	Acción			
Gestión del Proyecto Integral	Actualizar la coordinación de actividades técnicas, operativas y administrativas mediante la integración de nuevos mecanismos de control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	5 días	\$5,600 mxn	Área Tecnológica

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No. 51 Control de cambios ET.2****Actividad. Gestión del Proyecto Integral Programa
Área Tecnológica Nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM51

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización de la Gestión del Proyecto Integral.	El líder Daniel Romero coordinó la revisión de los procesos de gestión integral del proyecto Testify. Se acordó actualizar los mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas involucradas, reforzar las actividades de seguimiento y documentar los cambios aprobados para asegurar una correcta ejecución del proyecto.	5 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



45. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica - Nivel Operativo

	Plantilla No. 52 Checklist de verificación ET.2 Actividad Crítica X Programa Área Tecnológica Nivel Operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E52 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
--	--

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Desarrollo del Prototipo MVP	Diseño visual, estructuración modular y programación exitosa del MVP para la carga estable de datos masivos en archivos CSV.	No
Plano Operativo Técnico	Diseño técnico formal del plano operativo de servidores, documentación de la arquitectura y despliegue del set de pruebas básicas.	Sí
Validación de Entorno	Ejecución de pruebas del sistema operativo base y emisión de	Sí

	la aprobación técnica formal del prototipo para la etapa piloto.	
--	--	--

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Eduardo Carbajal
Mendoza



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 52 Checklist de verificación ET.2
Actividad Crítica X Programa Área Tecnológica Nivel Operativo
 Título del Proyecto: Testify
 ID: ES0DC4EM52
 Presupuesto: 381,812.37mxn
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
 Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación técnica de cumplimiento crítico en Tecnología Operativa.	Eduardo Carbajal y Alexis Daniel se verificaron satisfactoriamente los entornos del MVP y el plano operativo. El sistema procesa correctamente las cargas masivas sin problemas de latencia, liberando la ruta crítica sin incidencias.	5 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 53 P.C Seguimiento ET.2 Actividad.
Desarrollar el prototipo funcional (MVP)
Programa Área Tecnológica Nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E53
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Desarrollar el prototipo funcional (MVP)	100%	Corregir errores detectados durante las pruebas funcionales e integrar completamente los módulos de IA pendientes.	15 días	\$20,500 mxn	Área Tecnológica

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No. 53 P.C Seguimiento ET.2 Actividad. Desarrollar el prototipo funcional (MVP)

Programa Área Tecnológica Nivel Operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM53

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del prototipo funcional (MVP) de Testify.	El líder Daniel Romero coordinó la revisión de las funcionalidades desarrolladas en el MVP. Se acordó corregir incidencias detectadas durante las pruebas funcionales y completar la integración de los módulos de Inteligencia Artificial pendientes. Asimismo, el equipo validó los cambios realizados y autorizó la actualización del prototipo para continuar con la fase de pruebas.	15 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 54 Checklist de verificación ET.2
Actividad Holgura X Programa Área Tecnológica Nivel Operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E54

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Proyecto de Inversión Técnica	Elaboración del análisis de inversión técnica inicial aparejado con la evaluación detallada de cotizaciones y costos tecnológicos cloud.	Sí

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Eduardo Carbajal
Mendoza

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No. 54 Checklist de verificación ET.2****Actividad Holgura X Programa Área Tecnológica - Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM54

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación de actividades de Holgura Financiera-Técnica.	Eduardo Carbajal y Estephany Muñoz el equipo directivo evaluó las cotizaciones de servidores e infraestructura cloud, concluyendo que los rangos se encuentran alineados al presupuesto y se aprueba su integración.	2 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



46. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica – Nivel Táctico

	Plantilla No. 55 Checklist de verificación ET.2 Actividad Crítica X Programa Área Tecnológica - Nivel Táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E55 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
--	--

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Programación de la Interfaz de Usuario (UI)	Construcción responsiva de las vistas del sistema, maquetación de los dashboards de control de QA y programación de componentes de navegación dinámica.	Sí
Módulos de Seguridad	Configuración de certificados de seguridad SSL/TLS, encriptación de credenciales de usuario y establecimiento de políticas de acceso por roles (RBAC).	No

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal
Mendoza



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 55 Checklist de verificación ET.2
Actividad Crítica X Programa Área Tecnológica Nivel
Tactico
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM55
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación técnica frontend de la UI crítica.	Alexis Daniel el comité técnico evaluó el despliegue de las pantallas y componentes visuales del frontend, dictaminando que la latencia de renderizado y la usabilidad UX cumplen al 100% con los estándares de aceptación en la ruta crítica.	5 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 56 P.C Seguimiento ET.2 Actividad.
Configuración de los módulos de seguridad
Programa Área Tecnológica Nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E56
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Configurar los módulos de seguridad	100%	Ajustar protocolos de autenticación, cifrado y validación de accesos para cumplir con los requisitos de seguridad.	12 días	\$16,440 mxn	Área Tecnológica

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No. 56 P.C Seguimiento ET.2 Actividad.
Configuración de los módulos de seguridad
Programa Área Tecnológica Nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1EM56
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Configuración de los módulos de seguridad del sistema.	El líder Daniel Romero revisó los mecanismos de seguridad implementados. Se acordó reforzar los procesos de autenticación, cifrado de información y control de accesos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos para la plataforma Testify.	12 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 57 P.C Seguimiento ET.2 Actividad.
Desarrollar el prototipo funcional (MVP)
Programa Área Tecnológica Nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E57
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Desarrollar el prototipo funcional (MVP)	100%	Corregir errores detectados durante las pruebas funcionales e integrar completamente los módulos de IA pendientes.	15 días	\$20,500 mxn	Área Tecnológica

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No. 57 P.C Seguimiento ET.2 Actividad. Desarrollar el prototipo funcional (MVP)

Programa Área Tecnológica Nivel Operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM57

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo del prototipo funcional (MVP) de Testify.	El líder Daniel Romero coordinó la revisión de las funcionalidades desarrolladas en el MVP. Se acordó corregir incidencias detectadas durante las pruebas funcionales y completar la integración de los módulos de Inteligencia Artificial pendientes. Asimismo, el equipo validó los cambios realizados y autorizó la actualización del prototipo para continuar con la fase de pruebas.	15 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 58 Checklist de verificación ET.2
Actividad Holgura X Programa Área Tecnológica Nivel Operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E58

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Instalación de Infraestructura de Red y Servidores PostgreSQL	Despliegue de instancias de bases de datos PostgreSQL (local y cloud), estructuración fina de esquemas lógicos y optimización de índices de consulta.	Sí

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No. 58 Checklist de verificación ET.2****Actividad Holgura X Programa Área Tecnológica Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM58

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación de infraestructura de red, bases de datos y seguridad.	Eduardo Carbajal y el líder Daniel Romero audito las conexiones concurrentes a las tablas de PostgreSQL y las llaves de cifrado perimetral. Todo cumple con las métricas de estabilidad técnica sin afectar la holgura asignada.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



47. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Operativa - Nivel Estratégico

	Plantilla No. 59 Cheklist de verificación ET.2 Actividad de Holgura X Programa Área Operativa Nivel Estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E59 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
--	--

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Fabricar un diseño de la estructura funcional del software.	- Modelado de arquitectura de software en AWS. - Desarrollo modular de componentes de IA.	Sí
Gestionar una estandarización de procesos para reportes.	- Mapeo de procesos internos para reportes. - Desarrollo modular de componentes de IA.	Sí
Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos.	- Reingeniería integral del esquema de tablas de la BD. - Migración estructurada de flujos de datos.	No



Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexis Daniel Romero Razo'.

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estephany Muñoz Hernández'.

Estephany Muñoz
Hernández

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela Cassandra Martínez Medina'.

Angela Cassandra
Martínez Medina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Carbajal Mendoza'.

Eduardo Carbajal
Mendoza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorena Sarahí Zepeda Carmona'.

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No. 59 Checklist de verificación ET.2****Actividad de Holgura X Programa Área Operativa Nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM59

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Evaluación de desviaciones en tareas de holgura.	La directora operativa Estephany detectó que las tareas de base de datos no coincidieron con la planeación original. Al confirmarse que la actividad modificada posee margen de holgura, el equipo acordó autorizar la apertura inmediata de un Plan de Control de Cambios para regularizar el alcance.	330 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

**Plantilla No. 60 Control de cambios ET. 2****Actividad. Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos****Área operativa nivel estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E60

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción Acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos.	Sustituir la supervisión pasiva por una reingeniería completa de tablas de PostgreSQL y una migración de flujos optimizada, corrigiendo los errores de integración estructural sin alterar el presupuesto asignado.	300 días	\$110,000 mxn	Área Operativa



Minuta 60 Control de cambios ET. 2

Actividad. Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos

Área operativa nivel estratégico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM60

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Aprobación técnica de modificación de alcance.	El Director de Finanzas Eduardo y la Directora Operativa Estephanny autorizaron formalmente el cambio de alcance técnico para la base de datos. Se acordó que la reingeniería y migración ejecutadas quedan respaldadas bajo este plan al no poner en riesgo la fecha de entrega final del proyecto.	300 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



48. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Operativa - Nivel Operativo

	Plantilla No. 61 Cheklist de verificación ET.2 Actividad crítica X Programa Área Operativa Nivel Operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E61 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
---	---

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Realizar el mantenimiento y depuración técnica del sistema.	• Depuración profunda de código fuente. • Optimización del motor de IA para procesamiento.	No

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 61 Checklist de verificación ET.2
Actividad crítica X Programa Área Operativa Nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM61
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Activación de protocolo de seguimiento por desviación crítica.	La directora operativa Estephany y el líder del proyecto Daniel l verificar que las tareas de mantenimiento cambiaron de enfoque técnico y impactan directamente la ruta crítica, el equipo acordó instruir la apertura inmediata de una Plantilla de Control y Seguimiento.	300 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 62 Control y seguimiento ET. 2 Actividad.
Realizar el mantenimiento y depuración técnica del sistema

Área operativa nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E62

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Realizar el mantenimiento y depuración técnica del sistema.	100%	Ejecutar una depuración profunda en el código fuente principal y optimizar los scripts del motor de IA de Testify para resolver problemas de rendimiento, manteniendo el monitoreo diario sobre la ruta crítica..	300 días	\$110,000 mxn	Área Operativo



Minuta No. 62 Control y seguimiento ET. 2 Actividad.
Realizar el mantenimiento y depuración técnica del sistema

Área Operativa Nivel Operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM62

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Aprobación de acciones de seguimiento en ruta crítica.	La directora operativa Estephany aprobó las acciones técnicas de depuración y optimización de la IA. Se acordó mantener revisiones diarias de avance para asegurar que este cambio de actividades no genere un retraso en las fases subsecuentes.	300 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 64 Checklist de verificación ET.2
Actividad de Holgura X Programa Área Operativa Nivel Operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E64

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Ejecutar la validación y carga de información del software.	• Carga masiva de archivos CSV de prueba en AWS. • Validación automatizada de mapeo de datos.	Sí
Implementar pruebas de regresión y actualizaciones de seguridad.	• Mitigación emergente de vulnerabilidades. • Aplicación de parches críticos de seguridad.	No

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 64 Checklist de verificación ET.2
Actividad de Holgura X Programa Área Operativa Nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM64
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Derivación de cambio de alcance en actividades de holgura.	La directora operativa Estephany validó el cumplimiento de las tareas de carga. Respecto al cambio en las pruebas de regresión por parches de seguridad, se acordó autorizar un Plan de Control de Cambios al no comprometerse la fecha final.	280 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz Hernández



Lorena Sarahí Zepeda Carmona



Angela Cassandra Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



**Plantilla No. 65 Control de cambios ET. 2 Actividad.
Implementar pruebas de regresión y actualizaciones de seguridad**

Área operativa nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E65

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Implementar pruebas de regresión y actualizaciones de seguridad.	Reemplazar el plan de pruebas de regresión convencional por una intervención de mitigación emergente de vulnerabilidades y despliegue de parches de seguridad para blindar el entorno de producción	520 días	\$110,000 mxn	Área Operativa



Minuta No. 65 Control de cambios ET. 2 Actividad.
Implementar pruebas de regresión y actualizaciones de seguridad
Área operativa nivel operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM65
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Formalización de cambio de alcance por seguridad.	El Director de Finanzas Eduardo, el líder del proyecto Daniel y la directora operativa Estephany avalaron la sustitución de la actividad de testing por la aplicación de parches de emergencia, ratificando que el presupuesto asignado absorbe completamente el cambio sin alteraciones.	250 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz Hernández



Lorena Sarahí Zepeda Carmona



Angela Cassandra Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



49. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad Programa Área Operativa – Nivel Táctico

	Plantilla No. 66 Checklist de verificación ET.2 Actividad crítica X Programa Área Operativa Nivel Táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E66 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
---	--

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Validar la seguridad y el flujo de datos entre módulos.	- Auditoría técnica de flujos internos de datos. - Contención y blindaje de fugas de información.	No

Firmas de Aprobación

 <i>Patrocinador del Proyecto</i>	 <i>Alexis Daniel Romero Razo</i> <i>Gerente de proyecto</i>	 <i>Estephany Muñoz</i> <i>Hernández</i>
 <i>Angela Cassandra Martínez</i> <i>Medina</i>	 <i>Eduardo Carbajal</i> <i>Mendoza</i>	 <i>Lorena Sarahí</i> <i>Zepeda Carmona</i>



Minuta No. 66 Checklist de verificación ET.2
Actividad crítica X Programa Área Operativa Nivel Táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM66

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Apertura de seguimiento en ruta crítica técnica.	La directora operativa Estephany, al identificarse que la validación mutó a un proceso de auditoría y contención que impacta directamente el flujo principal, se acordó por unanimidad aplicar el protocolo de Control y Seguimiento inmediato.	300 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 67 Control y seguimiento ET. 2 Actividad.
Validar la seguridad y el flujo de datos entre módulos Área operativa nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E67

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Validar la seguridad y el flujo de datos entre módulos.	100%	Ejecutar un diagnóstico completo de auditoría en los flujos internos y aplicar un blindaje hermético contra fugas de información en la comunicación intermodular para proteger el núcleo crítico del software.	300 días	\$105,000 mxn	Área Operativo

**Minuta No.67 Control y seguimiento ET. 2 Actividad.****Validar la seguridad y el flujo de datos entre módulos****Área operativa nivel operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM67

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Supervisión de acciones correctivas tácticas.	La directora operativa Estephany ratificó las tareas de contención de flujos y ordenó un monitoreo continuo del desempeño del módulo para mitigar cualquier riesgo de cuello de botella que retrase las fases posteriores.	300 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 68 Checklist de verificación ET.2
Actividad de holgura X Programa Área Operativa Nivel Táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E68

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Establecer la infraestructura y arquitectura del software.	• Despliegue de instancias EC2 y entornos en AWS. • Configuración de políticas de red y Firewalls.	Sí
Configurar los parámetros y protocolos de generación de reportes.	• econfiguración técnica de APIs de comunicación externas. • Integración de pasarelas de datos con consola de IA.	No

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

	Minuta No. 68 Checklist de verificación ET.2 Actividad de holgura X Programa Área Operativa Nivel Táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM68 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 21 de mayo del 2026
---	--

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación y redirección de tareas de holgura.	La directora operativa Estephany, aprobó el cumplimiento del bloque de infraestructura. Sobre la desviación en la configuración de parámetros de reportes, se autorizó procesarla mediante un Plan de Control de Cambios al comprobarse su margen de holgura.	330 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz Hernández



Lorena Sarahí Zepeda Carmona



Angela Cassandra Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 69 Control de cambios ET. 2
Actividad. Configurar los parámetros y protocolos de generación de reportes
Área operativa nivel operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E69
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción Acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Configurar los parámetros y protocolos de generación de reportes	Modificar el alcance de la actividad original para concentrar los esfuerzos en la reconfiguración avanzada de endpoints de APIs externas y la estabilización de pasarelas de comunicación de datos.	240 días	\$105,000 mxn	Área Operativa



Minuta No. 69 Control de cambios ET. 2
Actividad. Configurar los parámetros y protocolos de generación de reportes
Área operativa nivel operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM69
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Aprobación de cambio en protocolos de integración.	La directora operativa Estephany el área de Finanzas Eduardo autorizaron el rediseño del alcance hacia la reconfiguración de APIs, validando que los recursos asignados cubren los requerimientos sin alterar el presupuesto base.	240 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



50. Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Financiera - Nivel Estratégico

	Plantilla No. 70 Cheklist de verificación ET.2 Actividad de holgura X Programa Área Financiera Nivel Estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E70 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
--	---

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Obtener afiliaciones con socios capitalistas	Celebración de mesas de negociación y firmas de contratos de inversión con fondos corporativos.	Sí
Gestionar el presupuesto de innovación (IA)	Supervisión y dispersión de fondos específicos para la adquisición de tokens y licenciamiento de APIs de Inteligencia Artificial.	Sí
Realizar la proyección de recuperación financiera	Simulación de corridas financieras preliminares para	Sí



	estimar el punto de equilibrio económico del software.	
--	--	--

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No. 70 Checklist de verificación ET.2
Actividad de holgura X Programa Área Financiera Nivel Estratégico
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM28
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Evaluación de indicadores financieros estratégicos del Programa 11.	Eduardo Carbajal se validaron las afiliaciones de capital y el presupuesto de IA. No obstante, la proyección de recuperación requiere ajustes inflacionarios imprevistos para la CDMX. Al ser una actividad con holgura en la red CPM, se rechaza el cierre ordinario y se	4 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz Hernández



Lorena Sarahí Cepeda Carmona



Angela Cassandra Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



51. Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades de holgura Programa Área Financiera - Nivel Operativo

	Plantilla No. 71 Cheklist de verificación ET.2 Actividad de holgura X Programa Área Financiera Nivel Operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E71 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
--	---

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Determinar el capital para activos y equipo	Asignación pormenorizada del capital circulante para herramientas de desarrollo locales y servidores de prueba.	No
Definir el tarifario de licencias anuales	Modelado matemático definitivo del costo por licencia B2B anual adaptado a las agencias de TI en la CDMX.	No
Obtener el presupuesto trimestral de nómina	Estructuración de las previsiones presupuestarias estacionales para garantizar la permanencia del	No



	equipo de ingeniería.	
--	--------------------------	--

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

	Minuta No. 71 Checklist de verificación ET.2 Actividad de holgura X Programa Área Financiera Nivel Operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM271 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 2 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Monitoreo de balances contables y cierre operativo del Programa 13.	Eduardo Carbajal y Alexis Daniel el comité auditó las proyecciones de capital para activos, tarifarios de licencias y el presupuesto trimestral consolidado. Al constatarese un cumplimiento absoluto del 100%, se aprueba el cierre formal ordinario de este programa.	5 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz Hernández



Lorena Sarahí Cepeda Carmona



Angela Cassandra Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 72 Control de cambios ET.2
Actividad. Determinar el capital para activos y equipo
Programa Área Financiera Nivel Operativo
 Título del Proyecto: Testify
 ID: ES0DC1E72
 Presupuesto: \$127,270.79 mxn
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
 Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción Acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Determinar el capital para activos y equipo	Actualizar las cotizaciones de hardware, licencias y equipo tecnológico para ajustar el presupuesto de inversión a las condiciones actuales del mercado.	4 días	\$5,600 mxn	Área Financiera

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No. 72 Control de cambios ET.2****Actividad. Determinar el capital para activos y equipo
Programa Área Financiera Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM72

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización del capital destinado a activos y equipo.	El directivo Eduardo Carbajal del área financiera realizó la revisión de las cotizaciones de equipos tecnológicos y activos necesarios para el proyecto Testify. Se acordó actualizar los montos de inversión considerando variaciones en precios de mercado y ajustar el presupuesto financiero para garantizar la adquisición de los recursos requeridos.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 73 Control de cambios ET.2

Actividad. Definir el tarifario de licencias anuales

Programa Área Financiera Nivel Operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E73

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
	Acción			
Definir el tarifario de licencias anuales	Revisar los costos operativos, de infraestructura y soporte para actualizar las tarifas de licenciamiento ofrecidas a los clientes.	3 días	\$3,100 mxn	Área Financiera

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No. 73 Control de cambios ET.2****Actividad. Definir el tarifario de licencias anuales****Programa Área Financiera Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM73

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización del tarifario de licencias anuales de Testify.	El directivo Eduardo Carbajal del área financiera coordinó la revisión de la estructura de precios del producto. Se acordó ajustar las tarifas de licenciamiento considerando los costos operativos, el valor agregado de las funcionalidades de Inteligencia Artificial y las condiciones actuales del mercado para mantener la competitividad de la plataforma.	3 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 74 Control de cambios ET.2
Actividad. Obtener el presupuesto trimestral de nómina
Programa Área Financiera Nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E74
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción Acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Obtener el presupuesto trimestral de nómina	Recalcular los costos salariales considerando nuevas contrataciones, ajustes de personal y actualizaciones de prestaciones laborales.	5 días	\$5,700 mxn	Área Financiera

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. No. 74 Control de cambios ET.2
Actividad. Obtener el presupuesto trimestral de nómina
Programa Área Financiera Nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM74
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización del presupuesto trimestral de nómina.	El directivo Eduardo Carbajal del área financiera y la de RH Cassandra Martínez revisaron los costos asociados al personal participante en el proyecto Testify. Se acordó recalcular el presupuesto trimestral de nómina considerando cambios en la estructura organizacional, nuevas incorporaciones y ajustes salariales necesarios para la correcta ejecución del proyecto.	5 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



52. Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividad Programa Área Financiera – Nivel Táctico

	Plantilla No. 75 Cheklist de verificación ET.2 Actividad de holgura X Programa Área Financiera Nivel Táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E75 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
--	---

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Administrar el fondo de infraestructura física	Cotización de insumos físicos y equipos de cómputo ergonómicos para el personal de ingeniería.	Sí
Ejecutar el pago mensual de salarios	Emisión de timbrados fiscales y transferencias bancarias de sueldos para desarrolladores y QA.	Sí
Realizar el balance de caja mensual	Conciliación mensual de flujo de efectivo frente a los entregables administrativos	Sí


	validados del periodo.	
--	------------------------	--

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



*Angela Cassandra
Martínez Medina*



*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*



*Eduardo Carbajal
Mendoza*



*Estephany Muñoz
Hernández*



*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No. 75 Checklist de verificación ET.2
Actividad de holgura X Programa Área Financiera Nivel Táctico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM75

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 2 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Verificación táctica de flujos y tabuladores del Programa 12.	Eduardo Carbajal y Cassandra Martínez los salarios y balances de caja operan correctamente. Sin embargo, el fondo de infraestructura física falló debido a la necesidad de sustituir al proveedor de hardware. Dado el margen de holgura, se instruye el despliegue del Control de Cambios.	3 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Cepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



53. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área de Recursos Humanos - Nivel Estratégico

	Plantilla No. 76 Cheklist de verificación ET.2 Actividad de Holgura X Programa Área de RH Nivel Estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E76 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
--	--

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Contratar Personal especializado	• Análisis de necesidades de personal. • Definición de perfiles de contratación.	Sí
Capacitar al personal en metodologías y bases de datos	• Diseño de material didáctico. • Programación de sesiones de capacitación.	No
Establecer el sistema de evaluación de desempeño	• Diseño y validación del sistema de evaluación. • Elaboración de manual de indicadores (KPIs).	No



Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela', written over a horizontal line.

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexis', written over a horizontal line.

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo', written over a horizontal line.

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estephany', written over a horizontal line.

*Estephany Muñoz
Hernández*


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorena', written over a horizontal line.

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

	Minuta No. 76 Checklist de verificación ET.2 Actividad de Holgura X Programa Área de RH Nivel Estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM76 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 21 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del programa de Recursos Humanos nivel estratégico enfocado en las actividades de holgura que no cumplen con los objetivos establecidos.	La líder de RH Cassandra Martínez, coordinó la revisión de las actividades estratégicas que presentaban retrasos y falta de cumplimiento. Se acordó reestructurar las actividades de capacitación, evaluación de desempeño, talleres formativos y aplicación de KPIs mediante nuevos planes de acción, tiempos adicionales y ajustes presupuestales. Finalmente, el equipo aprobó la integración de la tabla correctiva dentro del programa estratégico de Recursos Humanos.	5 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz Hernández



Lorena Sarahí Zepeda Carmona



Angela Cassandra Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 77 Control de Cambios ET. 2
Actividad. Capacitar al personal en metodologías y bases de datos
Área de Recursos humanos Nivel Estratégico
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E77
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Capacitar al personal en metodologías y bases de datos	Reprogramar capacitaciones técnicas en sesiones híbridas y dividir los módulos en fases semanales para asegurar la asistencia y comprensión del personal.	60 días	\$41,100 mxn	Área de RH

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal
Mendoza



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No. 77 Control de Cambios ET. 2****Actividad. Capacitar al personal en metodologías y bases de datos****Área de Recursos humanos Nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM77

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Desarrollo nuevamente del programa de capacitación técnica para el personal en metodologías ágiles y administración de bases de datos del proyecto Testify.	La líder de RH Cassandra Martínez, coordinó nuevamente la organización de los temas de capacitación relacionados con metodologías ágiles, gestión de bases de datos PostgreSQL y uso de herramientas tecnológicas del proyecto. Se acordó dividir la capacitación en módulos semanales para facilitar el aprendizaje progresivo del equipo. Finalmente, el equipo aprobó la implementación del programa integral de formación para fortalecer las competencias técnicas del personal.	50 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.78 Control de Cambios ET. 2
Actividad. Capacitar al personal en metodologías y bases de datos

Área de Recursos humanos nivel Estratégico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E78

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Establecer el sistema de evaluación del desempeño	Implementar un sistema digital automatizado de seguimiento de KPIs y realizar pruebas piloto antes de su aplicación general.	30 días	\$30,000 mxn	Área de RH

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No. 79 Control de Cambios ET. 2****Actividad. Capacitar al personal en metodologías y bases de datos****Área de Recursos humanos nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM79

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Corregir el sistema de evaluación del desempeño y definición de indicadores de productividad para el equipo del proyecto Testify.	La líder de RH Cassandra Martínez corrigió la creación de la estructura del sistema de evaluación del desempeño, definiendo criterios de medición basados en productividad, cumplimiento de actividades y desempeño técnico. Se acordó implementar formatos digitales de seguimiento. Además, Sarahí Zepeda colaboró en la organización de los indicadores KPI y Alexis Daniel Romero Razo revisó y aprobó los lineamientos generales del sistema de evaluación.	30 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



54. Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área Recursos Humanos - Nivel Operativo

	Plantilla No. 80 Cheklist de verificación ET.2 Actividad de Holgura X Programa Área de RH Nivel Operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E80 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
---	--

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas.	- Identificación de puestos. - Definición de competencias técnicas. - Elaboración de perfiles de puesto.	No
Diseñar talleres formativos de la arquitectura.	- Diseño de talleres formativos. - Desarrollo de contenido formativo. - Programación de capacitación.	No
Estructurar los KPIs de productividad del equipo.	- Definición de KPIs. - Documentación de KPIs.	Sí

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal
Mendoza



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

**Minuta No. 80 Checklist de verificación ET.2****Actividad de Holgura X Programa Área de RH Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM80

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del Checklist de Verificación de las actividades de holgura correspondientes al Área de Recursos Humanos Nivel Operativo.	La líder de RH Cassandra Martínez coordinó la revisión de las actividades operativas relacionadas con la definición de perfiles de puesto, competencias técnicas, talleres formativos y estructuración de KPIs del equipo. Se acordó validar que cada actividad contara con evidencia documental y cumplimiento operativo dentro del proyecto. Finalmente, el equipo aprobó el checklist de verificación como evidencia de cumplimiento de las actividades de holgura del área de RH operativo.	6 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.81 Control de Cambios ET. 2
Actividad. Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas

Área de Recursos humanos nivel Operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E81

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas	Actualizar los perfiles de puesto incorporando nuevas habilidades técnicas relacionadas con Inteligencia Artificial, servicios en la nube y seguridad informática requeridas durante la ejecución del proyecto.	4 días	\$10,000 mxn	Área de RH

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No. 81 Control de Cambios ET. 2****Actividad. Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas****Área de Recursos humanos nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM81

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización de perfiles de puesto y competencias técnicas.	La líder de RH Cassandra Martínez realizó la revisión de los perfiles de puesto definidos para el proyecto Testify. Se acordó actualizar las competencias técnicas requeridas para cada puesto, incorporando conocimientos relacionados con Inteligencia Artificial, bases de datos, servicios cloud y seguridad informática, con el fin de asegurar que el personal cuente con las capacidades necesarias para el desarrollo del proyecto.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.82 Control de Cambios ET. 2
Actividad. Diseñar talleres formativos de la arquitectura
Área de Recursos humanos nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E82
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Diseñar talleres formativos de la arquitectura	Actualizar el contenido de los talleres incorporando nuevos procedimientos, herramientas tecnológicas y mejores prácticas identificadas durante el desarrollo del proyecto.	5 días	\$10,500 mxn	Área de RH

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Eduardo Carbajal
Mendoza

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No.82 Control de Cambios ET. 2
Actividad. Diseñar talleres formativos de la arquitectura
Área de Recursos humanos nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM82
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización de los talleres formativos de la arquitectura tecnológica.	La líder de RH Cassandra Martínez coordinó la revisión del contenido de capacitación diseñado para el personal del proyecto Testify. Se acordó actualizar los talleres incorporando nuevas herramientas tecnológicas, procedimientos operativos y mejores prácticas relacionadas con la arquitectura del sistema, con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos del equipo de trabajo.	5 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz Hernández



Lorena Sarahí Zepeda Carmona



Angela Cassandra Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



55. Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área Recursos Humanos – Nivel Táctico

	Plantilla No. 83 Cheklist de verificación ET.2 Actividad de Holgura X Programa Área de RH Nivel Táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E83 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
---	--

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Realizar entrevistas y pruebas técnicas	• Diseño de entrevistas. • Aplicación de entrevistas. • Aplicación de pruebas técnicas. • Selección Final.	Sí
Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal	• Diseño de inducción. • Ejecución de inducción.	No
Aplicar las encuestas de desempeño	• Diseño de encuestas. • Aplicación de encuestas.	No

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal
Mendoza



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 83 Checklist de verificación ET.2
Actividad de Holgura X Programa Área de RH Nivel Táctico
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1EM83
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del Checklist de Verificación de las actividades de holgura correspondientes al Área de Recursos Humanos Nivel Táctico.	La líder de RH Cassandra Martínez coordinó la validación de las actividades tácticas relacionadas con entrevistas, pruebas técnicas, inducción y evaluación del desempeño del personal. Se acordó verificar que los procesos de reclutamiento y capacitación cumplieran con los perfiles técnicos requeridos para el proyecto Testify. Finalmente, el equipo aprobó el checklist de verificación como evidencia del cumplimiento de las actividades tácticas del área de RH.	6 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.84 Control de Cambios ET. 2
Actividad Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal
Área de Recursos humanos nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E84
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal	Actualizar el programa de inducción incorporando nuevos procedimientos, herramientas tecnológicas y lineamientos operativos implementados durante el desarrollo del proyecto.	4 días	\$10,000 mxn	Área de RH

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Eduardo Carbajal
Mendoza

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No.84 Control de Cambios ET. 2

Actividad Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal

Área de Recursos humanos nivel Operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM84

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización del proceso de inducción técnica al nuevo personal.	La líder de RH Cassandra Martínez coordinó la revisión del programa de inducción técnica para el personal de nuevo ingreso. Se acordó actualizar los contenidos de capacitación incorporando nuevas herramientas tecnológicas, procedimientos operativos y lineamientos del proyecto Testify para garantizar una integración más eficiente del personal al equipo de trabajo.	4 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No.85 Control de Cambios ET. 2
Actividad. Aplicar las encuestas de desempeño
Área de Recursos humanos nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E85
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de acción	Tiempo	Costo Nuevo	Responsable
Aplicar las encuestas de desempeño	Migrar el proceso de evaluación a una plataforma digital que permita automatizar la recopilación, procesamiento y análisis de resultados del desempeño del personal.	3 días	\$12,500 mxn	Área de RH

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No.85 Control de Cambios ET. 2
Actividad. Aplicar las encuestas de desempeño
Área de Recursos humanos nivel Operativo
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM82
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización del proceso de aplicación de encuestas de desempeño.	La líder de RH Cassandra Martínez realizó la revisión del método utilizado para evaluar el desempeño del personal. Se acordó implementar herramientas digitales para automatizar la aplicación de encuestas, mejorar la recopilación de información y facilitar la generación de reportes de desempeño dentro del proyecto Testify.	3 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

56. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Comercial - Nivel Estratégico

	Plantilla No. 86 Checklist de verificación ET.2 Actividad Crítica X Programa Área Comercial Nivel Estratégico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E86 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
---	--

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Modelo de Venta	Definición analítica de los niveles de suscripción corporativa B2B (SaaS), establecimiento de tarifas comerciales y diseño de las cláusulas de renovación anual.	Sí

Firmas de Aprobación

 Patrocinador del Proyecto	 Alexis Daniel Romero Razo Gerente de proyecto	 Estephany Muñoz Hernández
 Angela Cassandra Martínez Medina	 Eduardo Carbajal Mendoza	 Lorena Sarahí Zepeda Carmona



Minuta No. 86 Checklist de verificación ET.2
Actividad Crítica Programa Área Comercial Nivel
Estratégico
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM86
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación técnica del modelo de licenciamiento comercial crítico.	Lorena Zepeda y Alexis Daniel el comité de comercialización evaluó la viabilidad financiera del modelo de licenciamiento anual y las cláusulas asociadas, determinando que cumple al 100% con los objetivos de monetización del producto en la ruta crítica.	4 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 87 P.C Seguimiento ET.2
Actividad. Modelo de Venta
Programa Área Comercial Nivel Estratégico
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E87
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Modelo de Venta	100%	Actualizar la estrategia de comercialización incorporando nuevos canales de venta, ajustar el proceso de captación de clientes potenciales y validar nuevamente las proyecciones de ventas para asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales del proyecto.	7 días	\$12,330 mxn	Área Comercial

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No. 87 P.C Seguimiento ET.2****Actividad. Modelo de Venta****Programa Área Comercial Nivel Estratégico**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM87

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Seguimiento al Modelo de Venta de Testify	La directiva Comercial, Sarahí Zepeda coordinó la revisión del modelo de venta definido para la comercialización de la plataforma Testify. Se acordó actualizar la estrategia comercial incorporando nuevos canales de captación de clientes y fortalecer el proceso de prospección empresarial. Asimismo, el equipo validó los cambios propuestos para asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales establecidos en el proyecto.	7 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 88 Checklist de verificación ET.0
Actividad Holgura X Programa Área Comercial Nivel
Estratégico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E88

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Estrategia Publicitaria	Diseño integral del plan de contenidos digitales y estructuración de las pautas publicitarias enfocadas en el nicho de QA y desarrollo de software en CDMX.	Sí
Posicionamiento de Marca	Redacción formal de la propuesta única de venta de Testify y validación del mensaje comercial clave frente a empresas del sector tecnológico.	Sí

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 88 Checklist de verificación ET.0
Actividad Holgura X Programa Área Comercial Nivel
Estratégico

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM88

Presupuesto: 381,812.37mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación de tareas de marketing y posicionamiento de marca.	Lorena Zepeda y Estephany Muñoz Se auditaron satisfactoriamente las matrices de la campaña publicitaria y los entregables de posicionamiento de mercado. El avance está alineado y se aprueba su integración sin desviaciones de tiempo.	3 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



50. Checklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Comercial - Nivel Operativo

	Plantilla No. 89 Checklist de verificación ET.2 Actividad Crítica X Programa Area Comercial Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E89 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
--	--

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Cierre de Contratos	Redacción y estructuración final de los contratos de servicio comercial, validación técnica de plazos de entrega y firma oficial con las empresas del sector TI.	Sí

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

	Minuta No. 89 Checklist de verificación ET.2 Actividad Crítica X Programa Area Comercial Nivel operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC4EM89 Presupuesto: 381,812.37mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 21 de mayo del 2026
---	---

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación formal del cierre y firma de contratos comerciales.	Lorena Zepeda y Alexis Daniel se revisó la documentación y los contratos comerciales debidamente firmados por las empresas del piloto de TI, concluyendo que el blindaje legal y los plazos operativos cumplen con las métricas de la ruta crítica.	5 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Angela Cassandra Martínez
Medina



Eduardo Carbajal Mendoza

**Plantilla No. 90 P.C Seguimiento ET.2****Actividad. Cierre de Contratos****Programa Área Comercial Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E87

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	% Avance	Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Cierre de Contratos	100%	Dar seguimiento a las negociaciones pendientes con clientes potenciales, actualizar los términos contractuales conforme a los requerimientos identificados y formalizar los acuerdos comerciales.	8 días	\$13,700 mxn	Área Comercial

Firmas de Aprobación
*Patrocinador del Proyecto**Angela Cassandra
Martínez Medina*
*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*
*Eduardo Carbajal
Mendoza*
*Estephany Muñoz
Hernández*
*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No. 90 P.C Seguimiento ET.2****Actividad. Cierre de Contratos****Programa Área Comercial Nivel Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM90

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Seguimiento al cierre de contratos comerciales del proyecto Testify	La directiva Comercial, Sarahí Zepeda realizó la revisión de los contratos pendientes con empresas interesadas en la plataforma Testify. Se acordó continuar con las negociaciones abiertas, actualizar las cláusulas contractuales de acuerdo con las observaciones recibidas por los clientes y formalizar los convenios comerciales necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos de comercialización del proyecto.	8 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 91 Checklist de verificación ET.0
Actividad Holgura X Programa Area Comercial Nivel operativo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E91

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Acuerdos NDA	Elaboración de convenios de confidencialidad (NDA) bilaterales y formalización de firmas para la protección del código base de Testify.	Sí
Entornos Piloto y Demos	Despliegue de los entornos piloto de prueba controlados y ejecución de sesiones guiadas en vivo ante tomadores de decisiones de QA.	Sí

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto



Angela Cassandra
Martínez Medina



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Eduardo Carbajal
Mendoza



Estephany Muñoz
Hernández



Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 91 Checklist de verificación ET.0
Actividad Holgura X Programa Area Comercial Nivel operativo
 Título del Proyecto: Testify
 ID: ES0DC4EM91
 Presupuesto: 381,812.37mxn
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
 Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación de entornos demostrativos y convenios de confidencialidad.	Lorena Zepeda y Estephany Muñoz se evaluaron las minutas de las demostraciones comerciales y el estatus de las firmas de los NDA corporativos. Los resultados son aprobados por el comité directivo sin objeciones.	4 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz Hernández



Lorena Sarahí Zepeda Carmona



Angela Cassandra Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



51. Cheklist de vericación Etapa 2 (Ejecución) Actividades de holgura Programa Área Comercial – Nivel Táctico

	Plantilla No. 92 Cheklist de verificación ET.2 Actividad Holgura X Programa Area Comercial Nivel táctico Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E92 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
---	---

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Prospección en LinkedIn	Mapeo fino de perfiles clave de QA Leads y directores de ingeniería de software en LinkedIn junto con el envío de mensajes comerciales B2B.	Sí
Manuales SLA	Redacción de las cláusulas técnicas del SLA que regulan la disponibilidad del sistema, tiempos de soporte y penalizaciones aplicables al cliente.	No
Pitch Deck	Estructuración visual y narrativa del Pitch Deck	No



	oficial de Testify, validando el modelo financiero de ahorro en tiempos de QA manual.	
--	--	--

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Angela Cassandra
Martínez Medina

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Eduardo Carbajal
Mendoza

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 92 Checklist de verificación ET.2
Actividad Holgura X Programa Area Comercial Nivel tactico
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM70
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 21 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación de entregables tácticos de prospección y ventas.	Lorena Zepeda y Estephany Muñoz el equipo revisó las campañas de LinkedIn, el documento formal de SLA corporativo y el Pitch Deck definitivo. Al ser actividades con holgura, se valida su cumplimiento total y excelente calidad sin impacto en el cronograma global.	5 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 93 Control de cambios Actividad. Desarrollar el Pitch Deck comercial de Testify
Programa Área Comercial Nivel Táctico
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E93
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Desarrollar el Pitch Deck comercial	Actualizar la propuesta comercial y rediseñar la presentación ejecutiva con nuevos indicadores financieros.	4 días	\$5,500 mxn	Área Comercial

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 93 Control de cambios Actividad. Desarrollar el Pitch Deck comercial de Testify
Programa Área Comercial Nivel Táctico
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1EM93
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización del Pitch Deck comercial de Testify.	La líder del área comercial Sarahí Zepeda realizó la revisión de la propuesta comercial y financiera del proyecto. Se acordó actualizar la presentación ejecutiva incorporando nuevos indicadores financieros, beneficios competitivos y proyecciones de crecimiento para futuras presentaciones ante clientes e inversionistas.	4 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



Plantilla No. 94 Control de cambios Actividad. Desarrollar
Definir los niveles de soporte y acuerdos (SLA)
Programa Área Comercial Nivel Táctico
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1E94
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Plan de Acción	Tiempo	Costo	Responsable
Definir los niveles de soporte y acuerdos (SLA)	Ajustar tiempos de respuesta y escalamiento conforme a los requerimientos de los clientes piloto.	3 días	\$4,500 mxn	Área Comercial

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 94 Control de cambios Actividad. Desarrollar el Pitch Deck comercial de Testify
Programa Área Comercial Nivel Táctico
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC1EM94
Presupuesto: \$127,270.79 mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 20 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Actualización de los niveles de soporte y acuerdos de servicio (SLA).	Lorena Sarahí Zepeda Carmona coordinó la revisión de los tiempos de respuesta comprometidos con los clientes. Se acordó modificar los niveles de servicio, procedimientos de escalamiento y mecanismos de atención para alinearlos con los requerimientos identificados durante las pruebas piloto del proyecto.	3 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



52. Checklist de verificación Etapa 3 (Control y Verificación) Actividad Crítica Programa Control y Verificación

	Plantilla No. 95 Checklist de verificación ET.3 Actividad Crítica X Programa de Control y Verificación Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E95 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 24 de mayo del 2026
---	---

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Checklist de Verificación	• Elaboración de la tabla de checklist de cada programa. • Firmar todos los checklist de cada programa. • Revisión de entregables finales del proyecto. • Verificación de cumplimiento de objetivos, tiempos y costos establecidos.	Sí
Control de Cambios	• Elaboración de bitácoras de actividades que no se cumplieron de actividades críticas. • Actualización del cronograma y actividades afectadas. • Autorización de ajustes en costos y tiempos.	Sí
Control de Seguimiento	• Elaboración de bitácoras de	Sí

	actividades que no se cumplieron de actividades de holgura. • Supervisión del avance de actividades críticas y de holgura. • Monitoreo de cumplimiento de entregables por área.	
--	---	--

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

*Estephany Muñoz
Hernández*

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Eduardo Carbajal
Mendoza*


*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*



Minuta No. 95 Checklist de verificación ET.3
Actividad Crítica X Programa de Control y Verificación
 Título del Proyecto: Testify
 ID: ES0DC4EM95
 Presupuesto: 381,812.37mxn
 Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
 Fecha: 24 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Verificación del Checklist de Verificación por cada programa, Control de Cambios por cada actividad crítica y Control de Seguimiento por cada actividad de holgura.	La líder de RH Cassandra Martínez, coordinó la revisión de las actividades finales correspondientes a la etapa de Control y Verificación del proyecto. Se acordó validar el cumplimiento de entregables técnicos, administrativos y operativos mediante un checklist de verificación. Asimismo, Eduardo Carbajal realizó la actualización de la bitácora de cambios efectuados durante el desarrollo del proyecto, mientras que el líder Daniel Romero apoyó en la supervisión de avances y elaboración de reportes de seguimiento.	30 días

Firmas



Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto



Estephany Muñoz Hernández



Lorena Sarahí Zepeda Carmona



Angela Cassandra Martínez Medina



Eduardo Carbajal Mendoza



53. Cheklist de vericación Etapa 4 (Cierre) Actividad Programa Control y Verificación

	Plantilla No. 96 Cheklist de verificación ET.4 Actividad Holgura X Programa Control y verificación Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E72 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 20 de mayo del 2026
---	---

Actividad planeada	Actividad realizada	Cumple Sí/No
Plantilla de resultados.	Plantilla de resultados.	Sí
Plantilla de costos.	Plantilla de costos.	Sí
Plantilla de valor ganado.	Plantilla de valor ganado.	Sí
Plantilla de acta de cierre.	Plantilla de acta de cierre	Sí

Firmas de Aprobación

Patrocinador del Proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Angela Cassandra
Martínez Medina

Eduardo Carbajal
Mendoza

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona



Minuta No. 96 Checklist de verificación ET.4
Actividad Holgura X Programa Control y verificación
Título del Proyecto: Testify
ID: ES0DC4EM96
Presupuesto: 381,812.37mxn
Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
Fecha: 24 de mayo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Validación y aprobación de documentación de cierre.	El equipo directivo evaluó los entregables de cierre y determinó que las plantillas de resultados, costos, valor ganado y el acta de cierre se cumplieron al 100% conforme a la planeación. Al registrar un estado de cumplimiento total, se aprueba archivar la documentación formal de Testify sin requerir planes de cambio.	19 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

ETAPA 4

CIERRE



Introducción de la etapa 4

Propósito de la etapa

La presente Etapa 4 representa la culminación integral y el cierre formal de todas las actividades operativas, comerciales y de desarrollo que dieron vida a la plataforma Testify. Alineado de manera estricta con los lineamientos globales para la culminación de proyectos establecidos en el PMBOK 7ª Edición, este bloque final tiene como prioridad consolidar el balance técnico e institucional del software.


Plantilla No. Control de costos ET.4

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E

Presupuesto:

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 25 de junio del 2026

Etap del Proyecto	Costo Planea do	Costo de Ejecució n	Costo de Implementa ción	Costo Total del Proyect o	Desviaci ón (Total - Planead o)	Estado Presupue stal
E0 — Inicio	\$65,320 MXN	\$43,240 MXN	\$364,000 MXN	\$407,240 MXN	+\$341,92 0 MXN	En Sobrecost o
E1 — Planeaci ón	\$34,250 MXN	\$34,250 MXN	\$0 MXN	\$34,250 MXN	\$0 MXN	Exitoso
E2 — Ejecució n	\$9,864, 000 MXN	\$11,570, 000 MXN	\$682,000 MXN	\$12,252, 000 MXN	+\$2,388, 000 MXN	En Sobrecost o
E3 — Control y Verificac ión	\$16,440 MXN	\$16,440 MXN	\$181,500 MXN	\$197,940 MXN	+\$181,50 0 MXN	En Sobrecost o
E4 — Cierre	\$12,330 MXN	\$12,330 MXN	\$0 MXN	\$12,330 MXN	\$0 MXN	Exitoso
TOTAL	\$9,992, 340 MXN	\$11,676, 260 MXN	\$1,227,500 MXN	\$12,903, 760 MXN	+\$2,911, 420 MXN	Sobrecost o General: +29.1%

Análisis de la desviación presupuestal

Costo Planeado (**PGT**): \$9,992,340 MXN.

Costo Real: \$12,903,760 MXN.

Desviación Neta Acumulada: +\$2,911,420 MXN, lo que representa un incremento del +29.13% sobre la planeación inicial del PGT.



El comportamiento financiero del proyecto muestra que la variación económica responde a decisiones estratégicas distribuidas en tres momentos clave del ciclo de vida de la plataforma:

- **Etapas 0:** Se registró un impacto de +\$341,920 MXN derivado de la maduración y robustecimiento de la estrategia comercial inicial.
- **Etapas 2:** Representa el mayor volumen de desviación con +\$2,388,000 MXN, originado por la descomposición de tareas técnicas modulares y la integración especializada de servicios de Inteligencia Artificial dedicados a la automatización de la documentación, lo que elevó los requerimientos de desarrollo técnico frente a la estimación global previa.
- **Etapas 3:** Generó un desfase de +\$181,500 MXN derivado del despliegue logístico para el monitoreo post-lanzamiento y el soporte técnico temprano brindado a los entornos de las agencias piloto.

Sustentabilidad y Viabilidad del Proyecto: A pesar de la variación del +29.13% observada al comparar el costo real frente a la línea base del Plan General de Trabajo, la salud financiera de Testify está plenamente respaldada. El costo real consolidado de \$12,903,760 MXN se mantuvo firmemente por debajo del Presupuesto de Proyecto global de \$14,462,590 MXN que fue autorizado formalmente en el Acta de Constitución. Esta contención técnica generó un margen a favor de **\$1,558,830 MXN** en eficiencias presupuestales no ejercidas, demostrando que la administración de recursos absorbió los cambios de alcance operacionales sin comprometer el techo financiero del negocio ni requerir aportaciones adicionales del patrocinador.

	Minuta No. Control de costos ET.4
	Título del Proyecto: Testify
	ID: ES0DC4EM
	Presupuesto:
	Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn
	Fecha: 25 de junio del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Análisis unificado y validación financiera de las desviaciones presupuestales de Testify.	El Director de Finanzas, Eduardo Carbajal, presentó el balance general de costos reales frente a las líneas base. Se acordó aprobar el registro del sobre-costo general y el análisis de la	1 día



	desviación presupuestal, ratificando que el costo final se mantiene por debajo del límite máximo del proyecto, lo que valida la salud financiera de Testify.	
--	--	--

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza
